

Verkehrsknoten – ÖPNV Terminal¹ 2016 - 2019

Bautenstand/Bauablauf

Ausschuss Bau und Verkehr 16.10.2019

04 22 00 00
Tage Stunden Minuten Sekunden

Noch

bis zur Eröffnung des Verkehrsknotens.


21.10.2019 – 15:00 Uhr
Bahnhofsvorplatz

Rahmenprogramm von 14:00 - 17:00 Uhr

Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Bauphase 4.1 (Haltestelle) ■

3

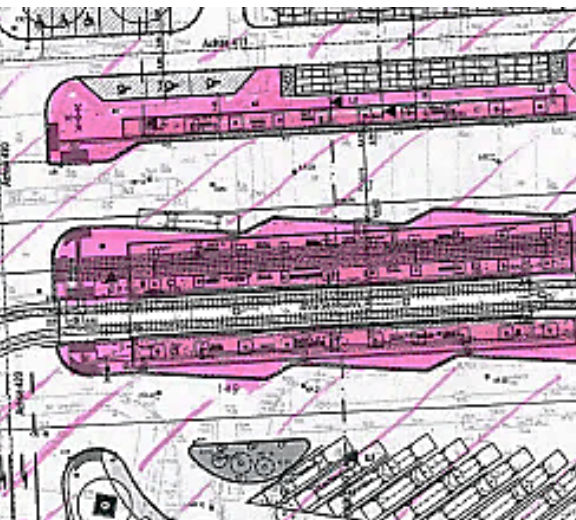


Fertiggestellt

Arbeiten abgeschlossen

offen

Beschriftung


10/2019



Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Bauphase 4.2 (Vorplatz Süd) ■


4

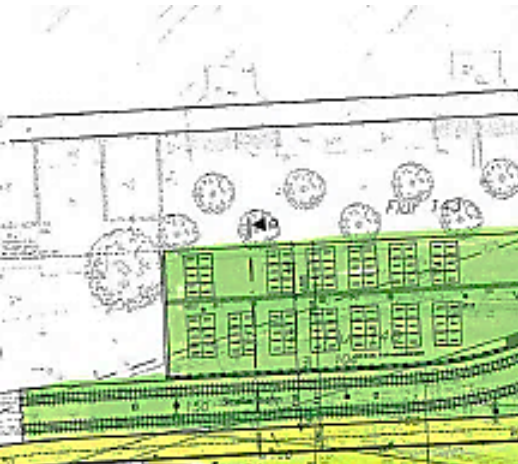

Fertiggestellt

Arbeiten abgeschlossen


Abnahme und Inbetriebnahme erfolgt 13.09.2019



Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Vetschauer Str. & Bahnhofsstraße

5

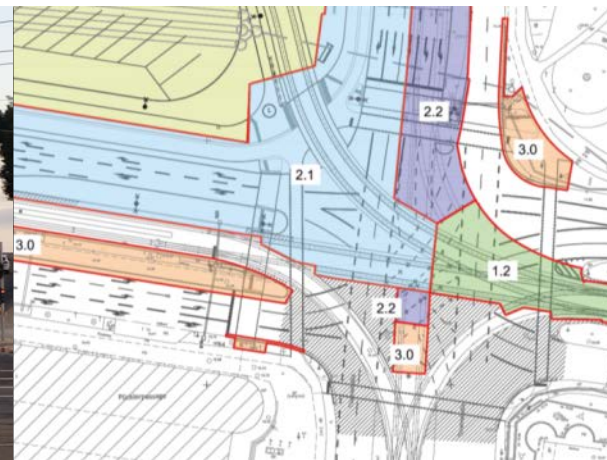

Fertiggestellt

Arbeiten abgeschlossen


Inbetriebnahme Lichtsignalanlage
und Verkehrsfreigabe erfolgt

18.09.2019

Offen

Rückbau provisorische Haltestellen
Vetschauer Str.

ab 22.10.2019






Fertiggestellt

Bügefahrt am 16.08.2019 erfolgt

Abnahme Technische Aufsichtsbehörde 24.09.2019 erfolgt

offen:

- Einweisungsfahrten mit Bus-, Straßenbahn- und Fahrpersonal ab 19.09.19




Bauphase	Soll-Termin		Ist-Termin	
	Anfang	Ende	Anfang	Ende
Bauvorbereitung	01.09.16	29.09.16	01.09.16	23.09.16
Bauphase 1.1.	30.09.16	18.08.17	24.09.16	01.07.17
Bauphase 1.2. (mit Decken- sanierung Knotenpunkt (KP) 03* Ostseite)	21.08.17	01.11.17	02.07.17	16.09.17
Bauphase 2.1.	01.11.17	20.09.18	17.09.17	18.12.18
Bauphase 2.2.	20.09.18	18.12.18	entfällt	in 2.1. enthalten
Bauphase 3 (Ausbau KP 03 Süd/West)	02.09.18	18.12.18	02.09.18	13.01.19
Bauphase 4 (Restarbeiten)	07.01.19	14.08.19	13.01.19	18.10.19


KP 03* = Kreuzung Stadtring / Thiemstraße / Vetschauer Str. / Bahnhofstraße

Nördliches Bahnumfeld

BA	Status
1.BA	Abgeschlossen
2.BA	Bewilligung FM 08/2019 erfolgt Ausschreibung IV. Quartal 2019 Baubeginn I/II. Quartal 2020
3.BA	Aktuell Vorplanung
4.BA	Planungen noch nicht begonnen Einordnung FM StuA erfolgt Interessenbekundung „Förderung innovativer Projekte zur Verbesserung des Radverkehrs“ abgegeben
5.BA	Planungen noch nicht begonnen Einordnung FM StuA erfolgt

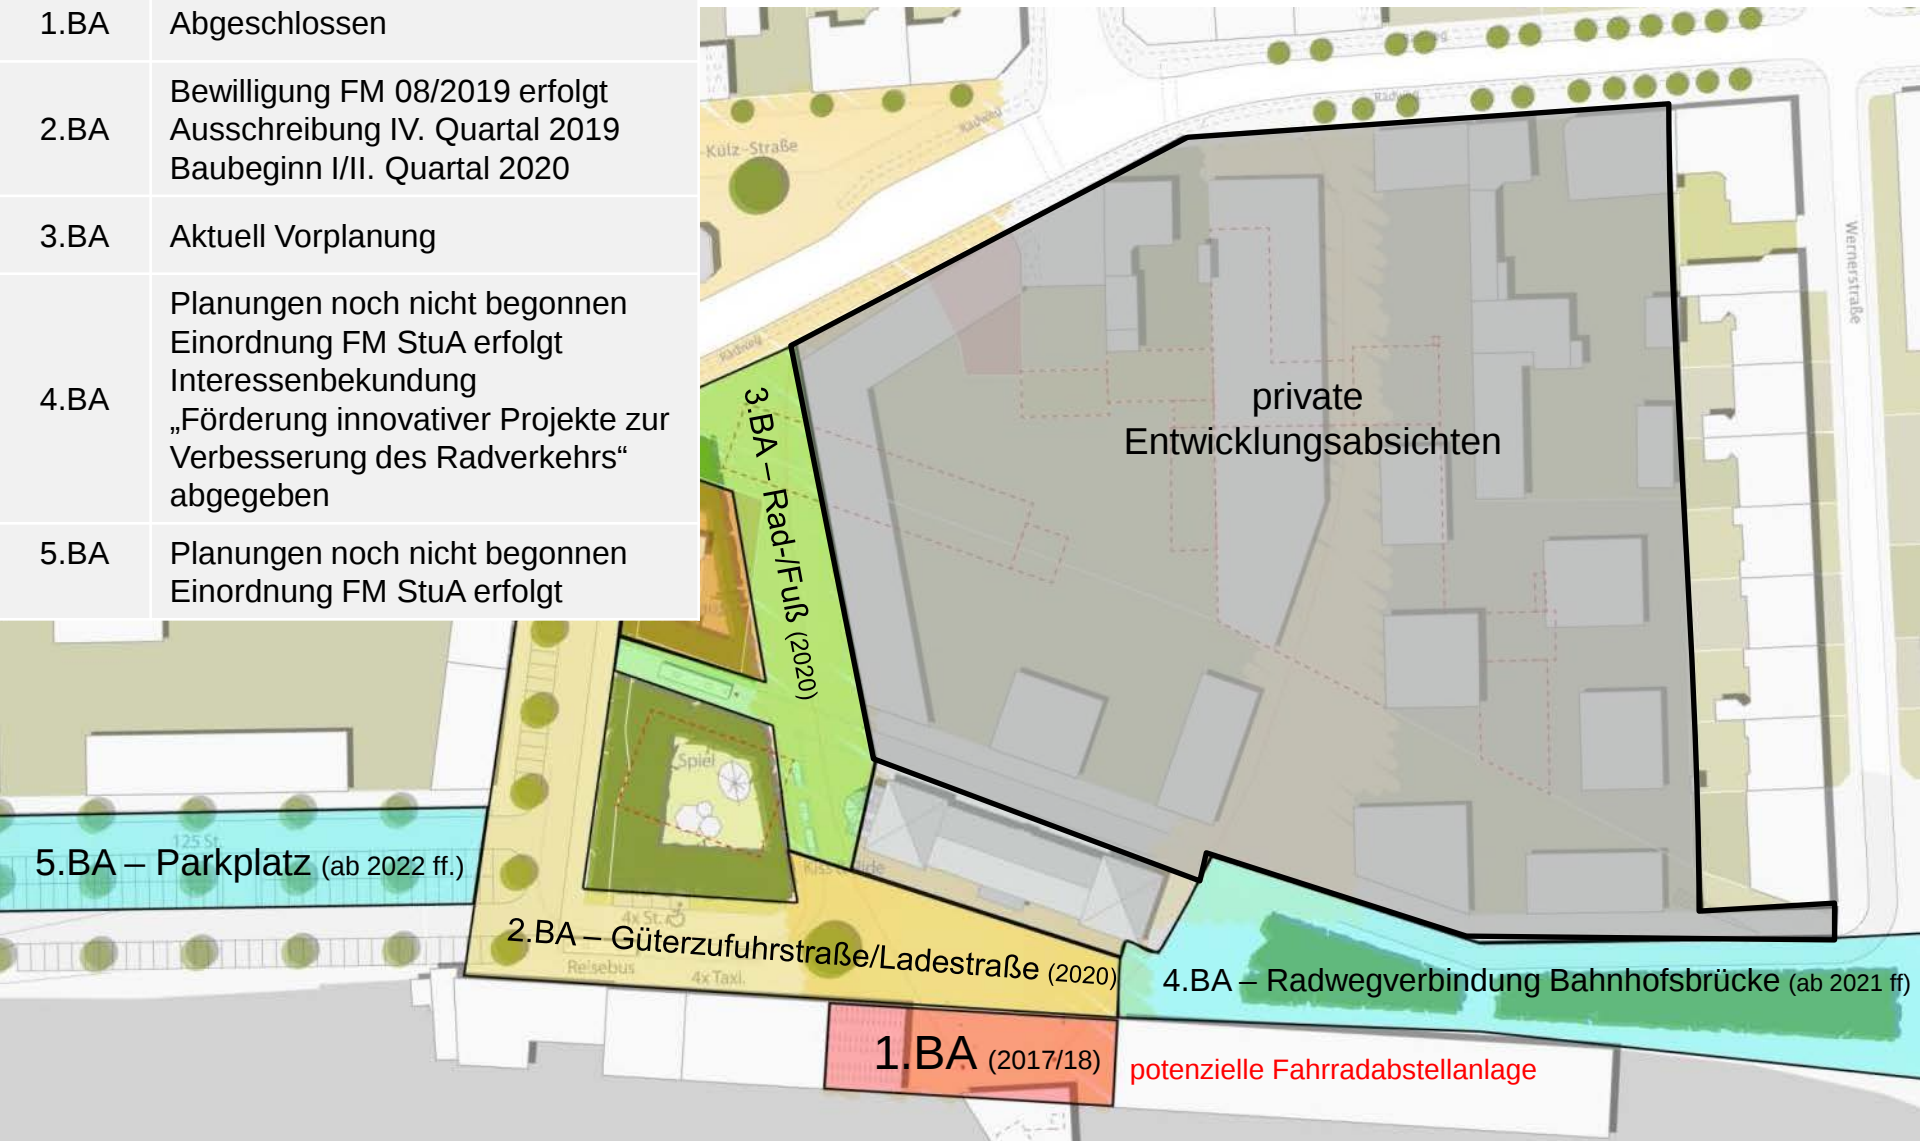

Übersicht - 2.BA Güterzufuhrstraße/Ladestraße – Anbindung Personentunnel

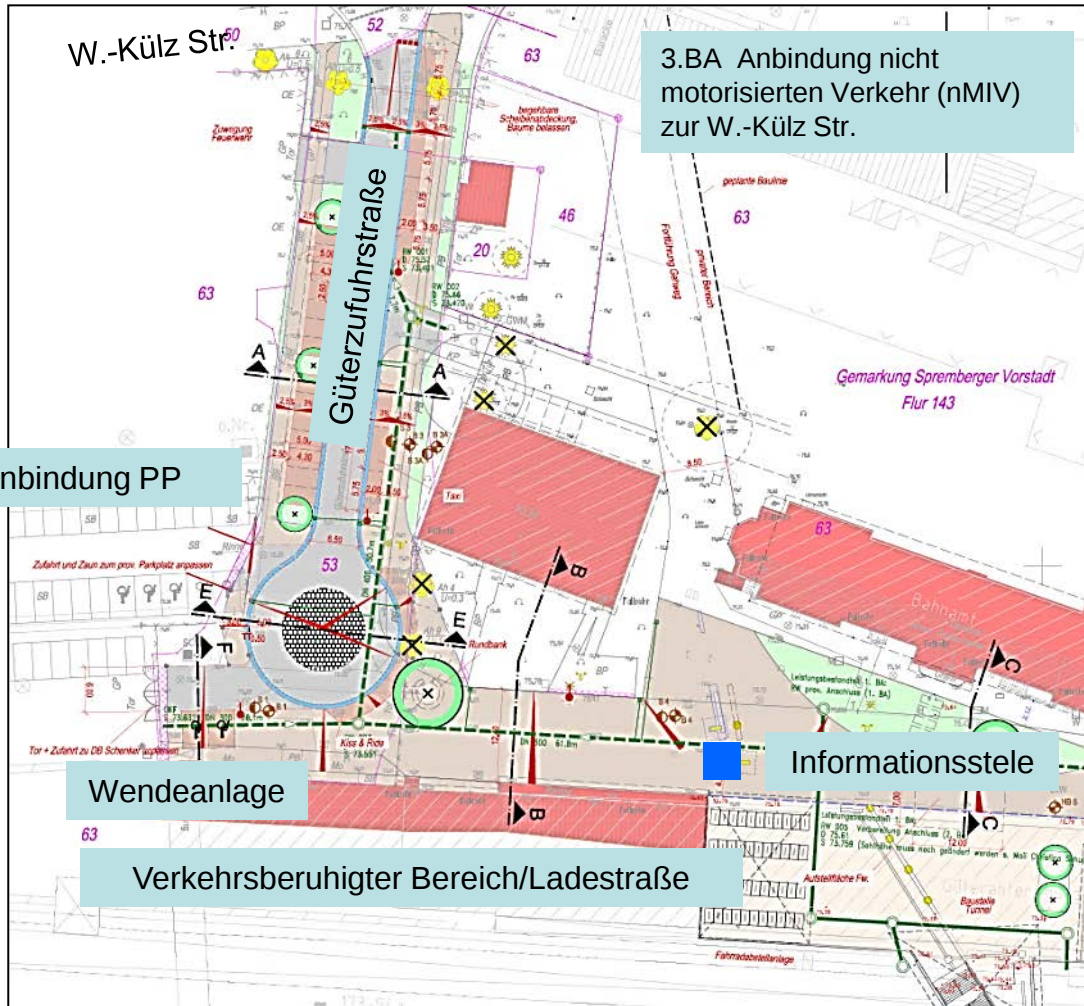

Zugang Personentunnel

Planungsstand 2.BA


(Güterzufuhrstraße und Ladestraße)

- Fördermittelantrag Stadt-Umland-Wettbewerb (SUW) Ende 07/2019 bewilligt
- Submission 10/2019 – Angebote derzeit Auswertung
- Baubeginn im I./II.Quartal 2020
 - 3 Bauphasen:
 - Güterzufuhrstraße Ost
 - Güterzufuhrstraße West
 - Ladestraße

Übersicht - 2.BA Güterzufuhrstraße/Ladestraße – Anbindung Personentunnel

Wiederverwendung Großpflaster
Güterzufuhrstraße

- Stellplätze Güterzufuhrstraße
- Kiss&Ride
- Mitte Kreisverkehr

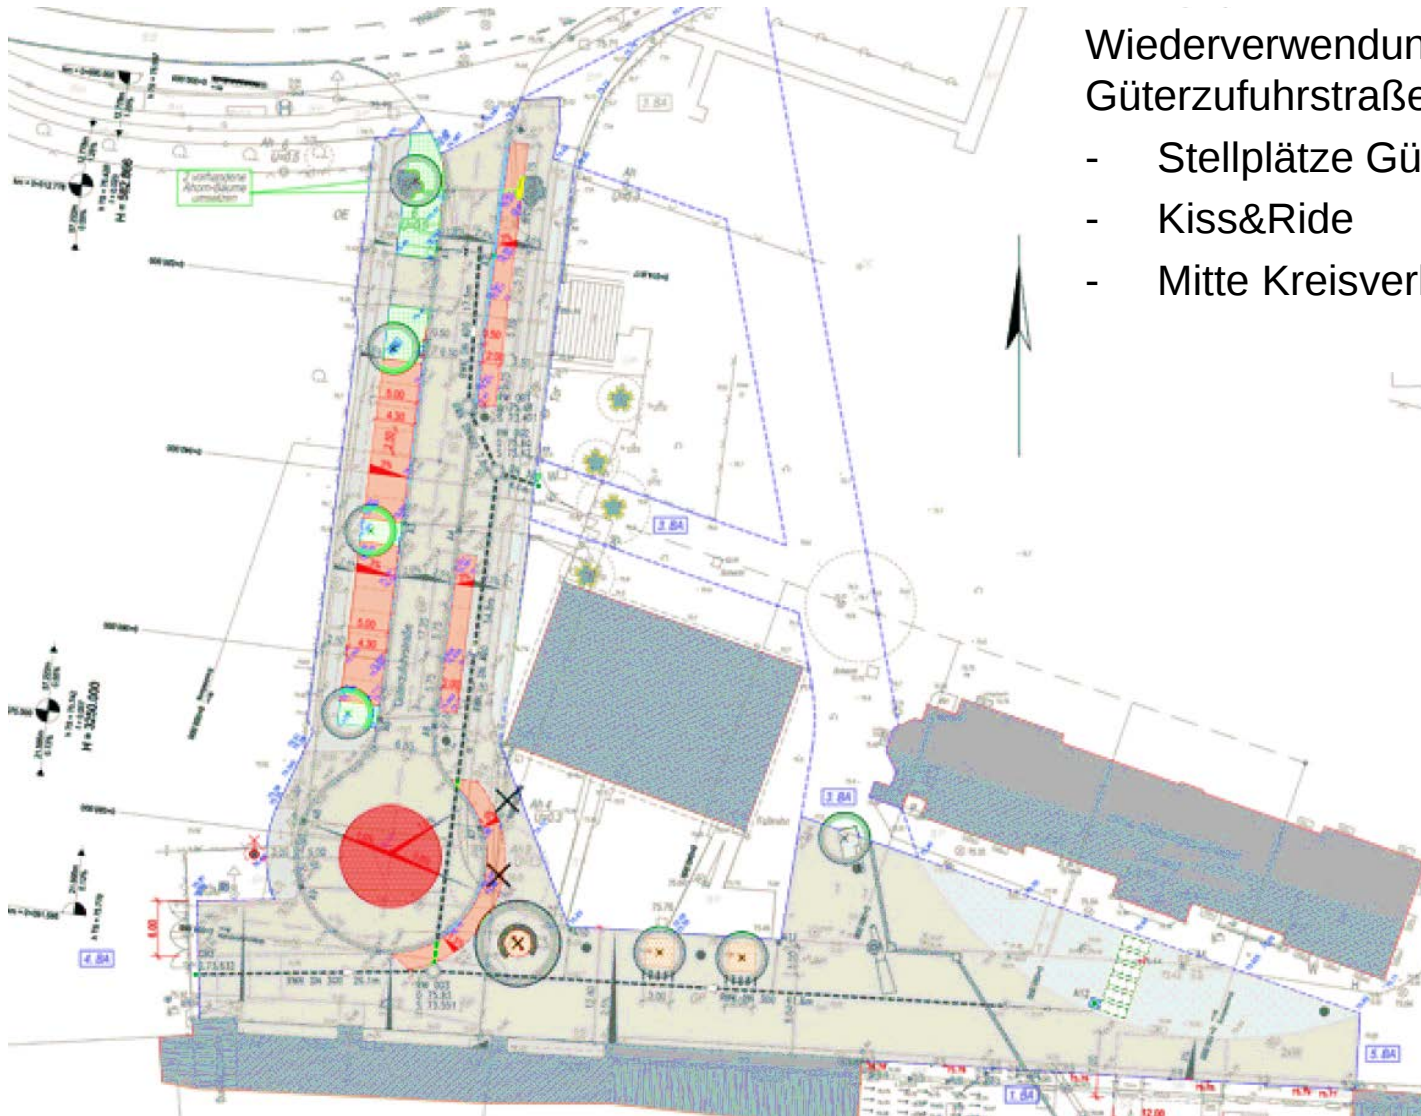

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit
