

# Verkehrsknoten – ÖPNV Terminal<sup>1</sup> 2016 - 2019




## Bautenstand/Bauablauf


Ausschuss Wirtschaft, Bau und Verkehr 10.10.2018

# **Arbeiten VOR Inbetriebnahme Vetschauer Str./Bahnhofstraße Ende 2018**

1. Gleisausbau / Lückenschluss
2. Komplettierung Lichtsignalanlage
3. Prüfung Leerrohranbindungen
4. Fertigstellung Geh-/Radwege  
Bahnhofstraße/Vetschauer Str.
5. Beschilderung Verkehrszeichen-  
brücke Vetschauer Str.
6. Asphaltanschluss Bahnhofsbrücke
7. Komplettierung Beleuchtung
8. Baumpflanzungen Vetschauer Str.

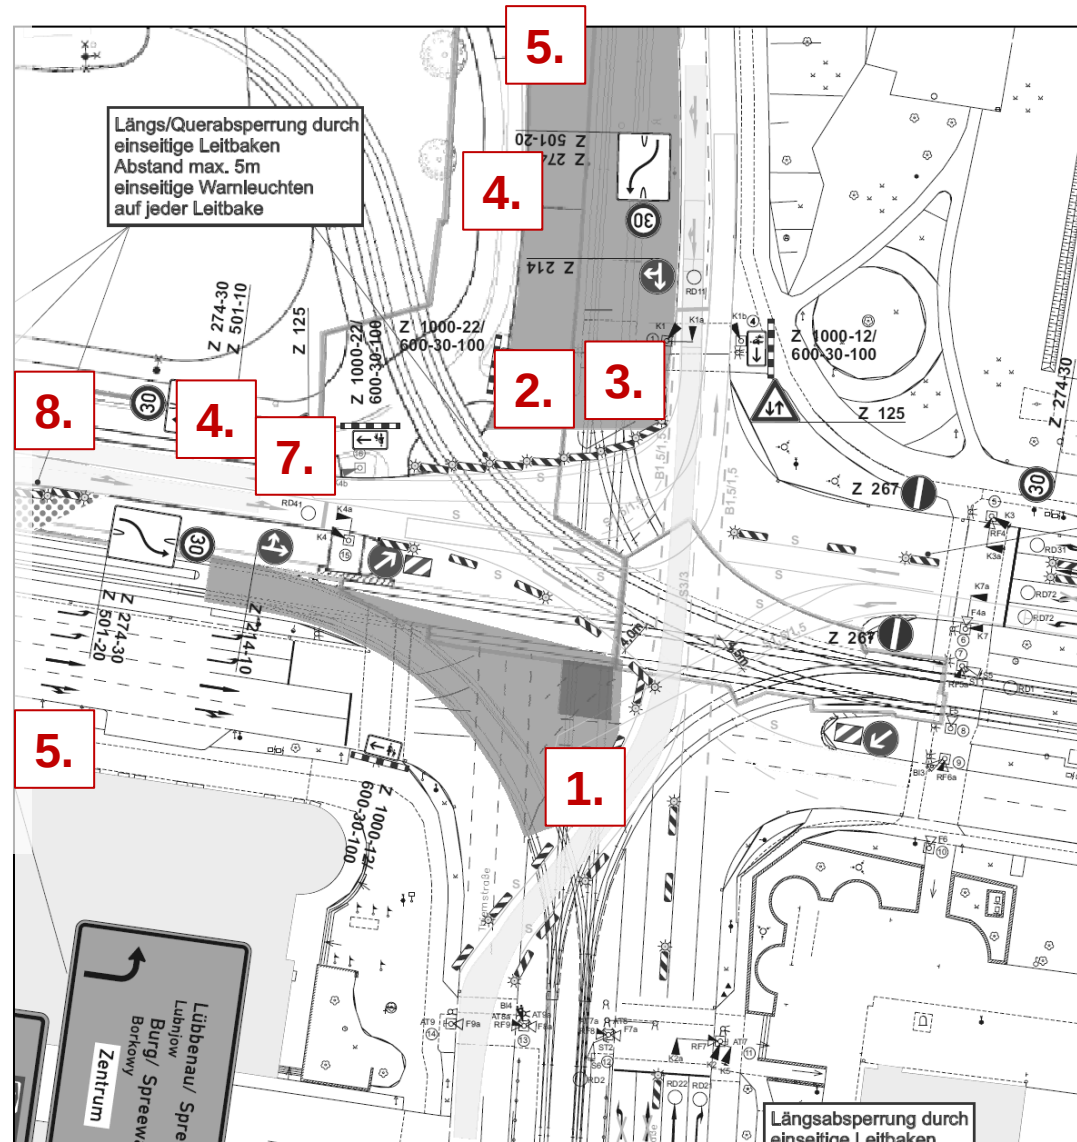


1. Durchörterung/Rohranbindung Vetschauer Str.
2. Komplettierung Lichtsignalanlage
3. Pflasterfläche Anbindung Bahnhof (Vorplatz Süd, Weiche)
4. Komplettierung Beleuchtung
5. Erweiterung provisorische Lichtsignalanlage (Fußgänger)
6. Herstellung prov. Haltestelle Vetschauer Str. Nord
7. Asphalt Vetschauer Str., Teil Ost (Zufahrt Vorplatz, außer Startgrube Durchörterung)

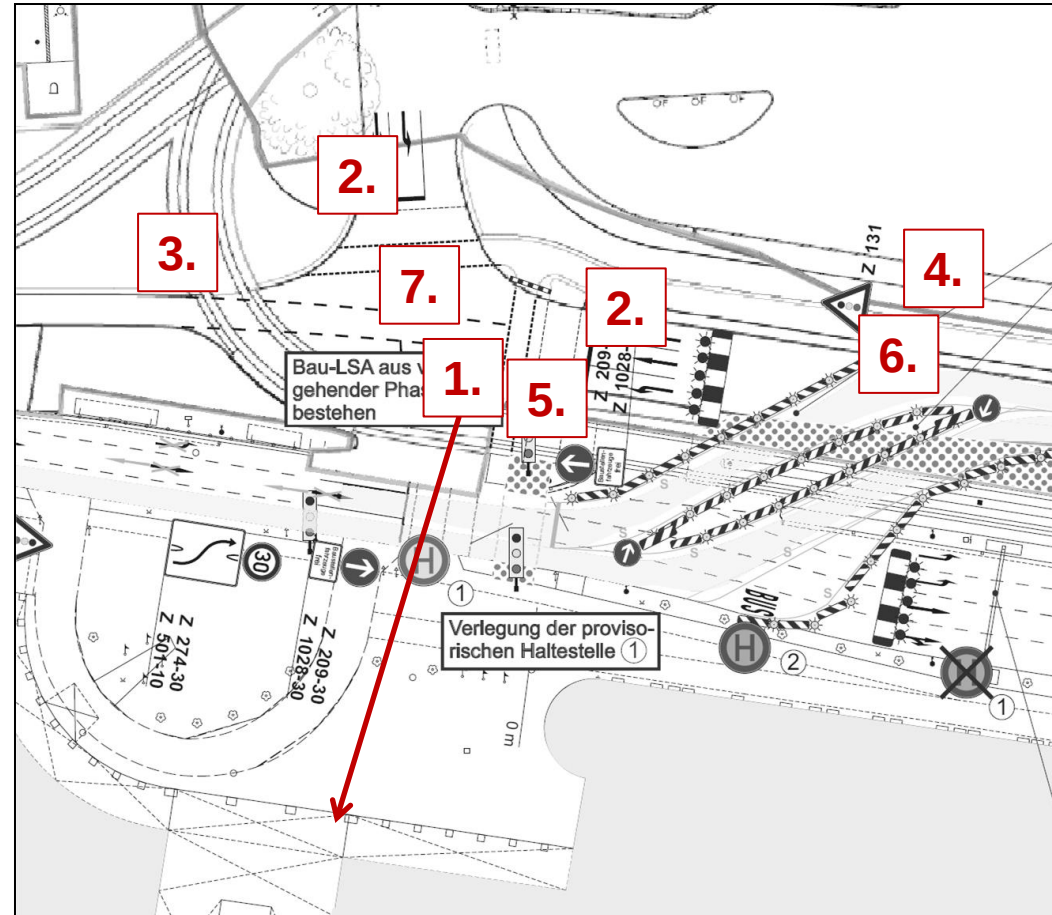


# **Arbeiten NACH Inbetriebnahme Vetschauer Str./Bahnhofstraße Frühjahr 2019**


1. Rückbau Asphaltkeil an westlich Tram-Haltestelle Thiemstr.
2. Bahnhofstr. westlich Fahrspur
  - Blitzer (Fräsen, Asphalt)
  - Grünstreifen Bahnhofstraße
  - Gleisusbau Rest (Nord/Mitte)
3. Bahnhofstr. östlich Fahrspur
  - Blitzer (Fräsen, Asphalt)
  - Ecke Knappschaft (Straßen- und Gehwegbau; Lichtsignalanlage)
4. Rückbau Überfahrt Bahnhofstraße Nord

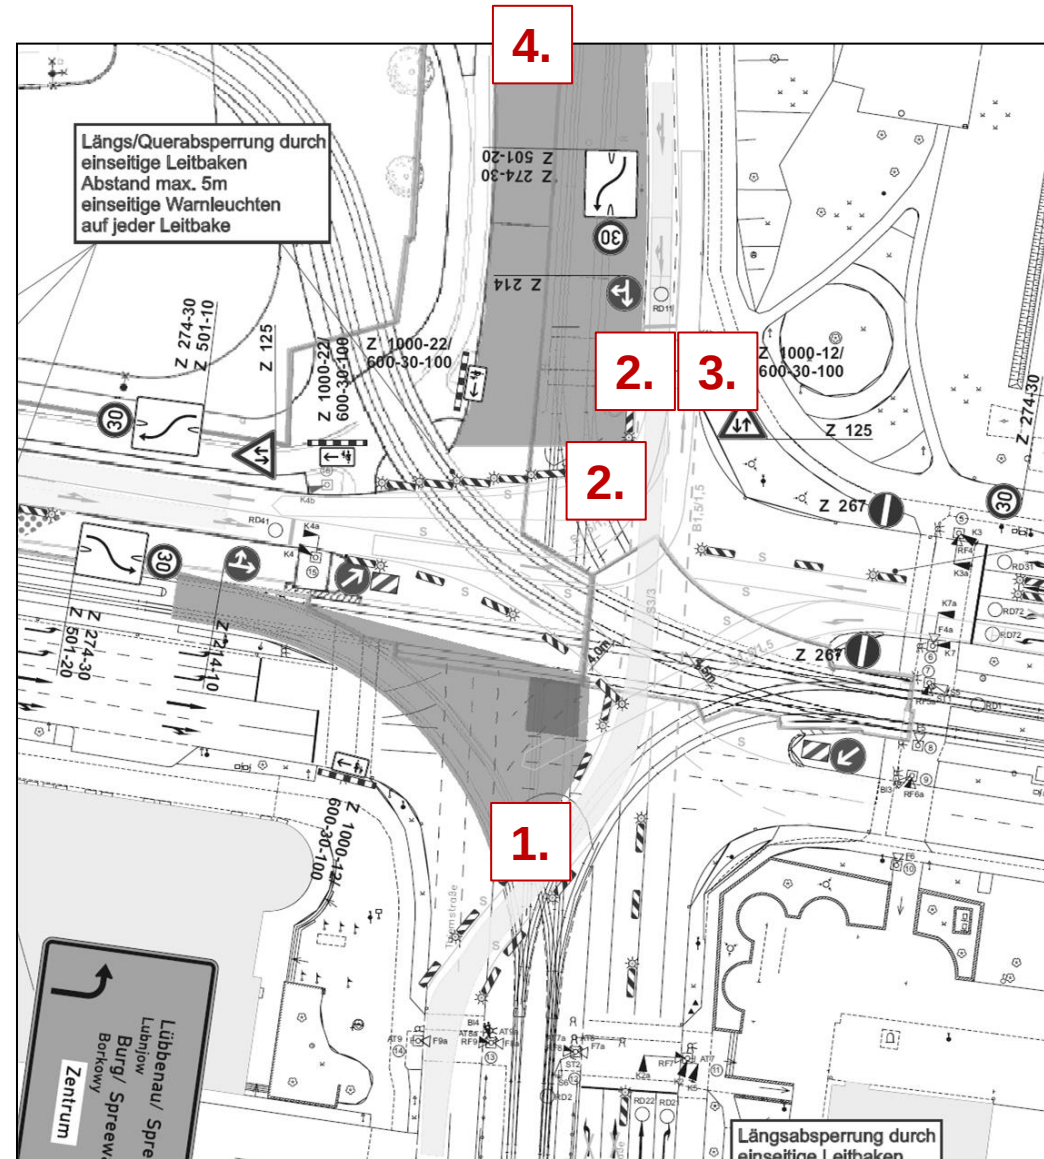


1. Rückbau alte Tram-Haltestelle Vetschauer Straße
2. Asphalt Vetschauer Str., Teil West
3. Rückbau Überfahrt Vetschauer Str. (Bauphase 3)
4. Pflasterfläche & Überdachung Fahrradabstellanlage
5. Restleistungen Bauphase 4

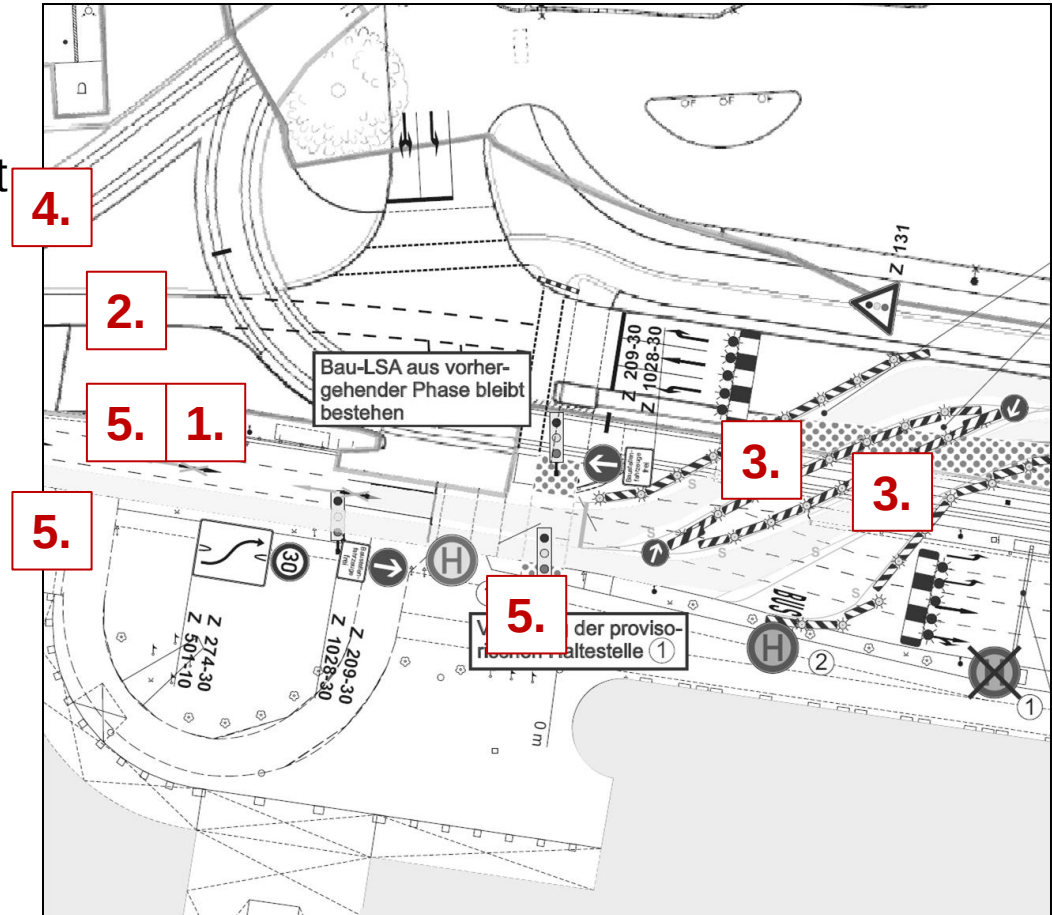

## Bautenstand

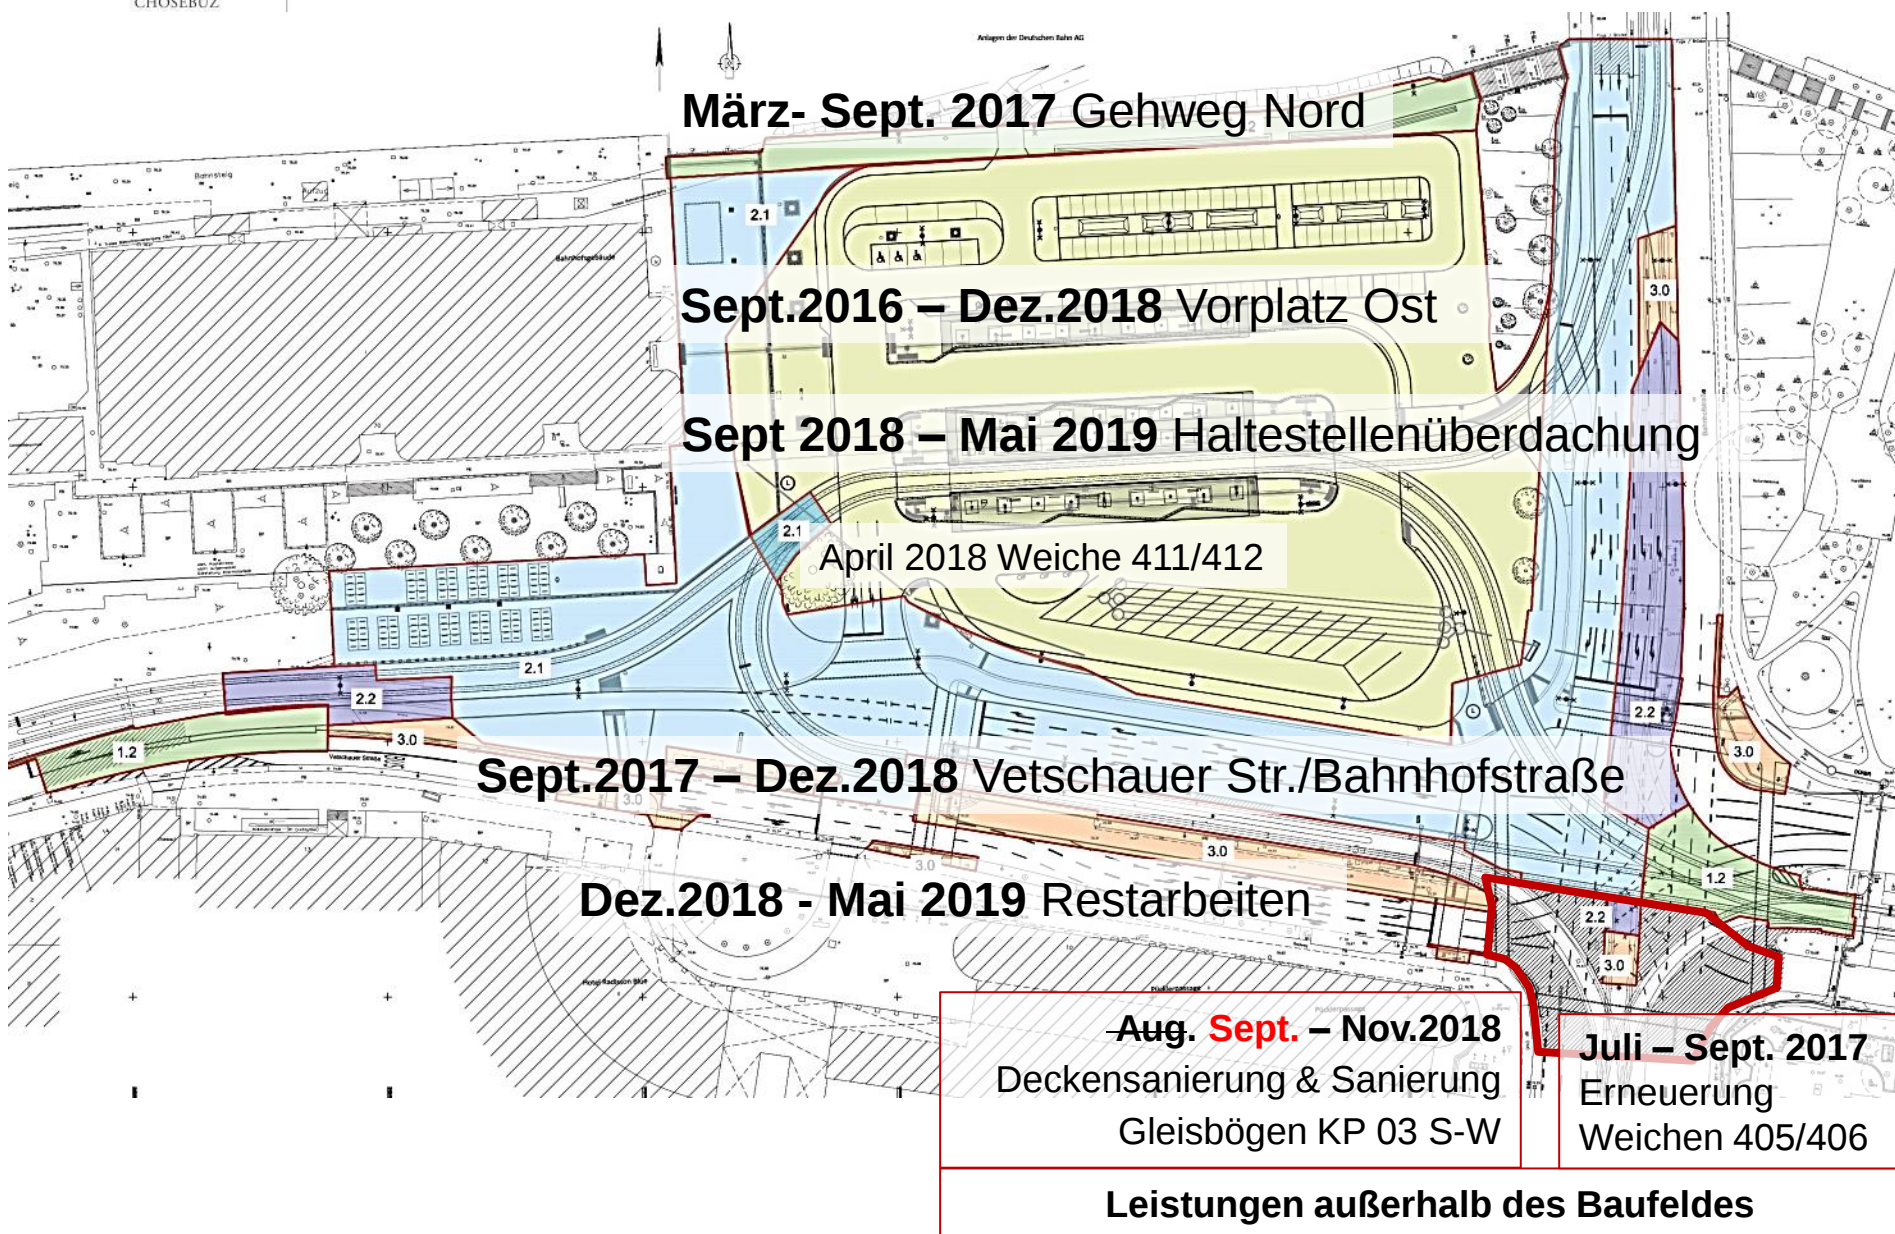

## Vorplatz

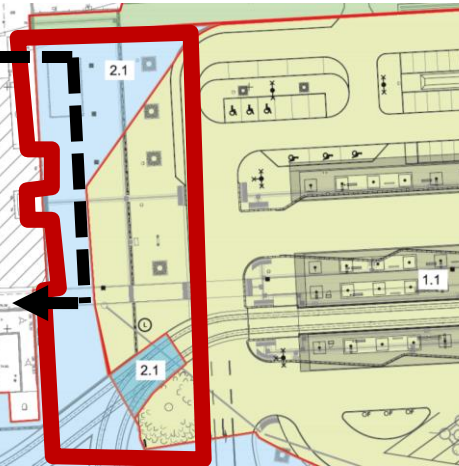


Fertiggestellt

Erdbau, Pflasterarbeiten Bauphase 1  
Einbau Weiche 413/414 (CV)  
Baumpflanzungen  
Pflasterarbeiten bis zum Bahnhofsgebäude  
Anbindung Bahnsteig 1  
Sanierung Sockel der Stele

derzeit

Pflasterarbeiten Teil Süd  
(Anbindung Vetschauer Str.)


11/2018



# Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

## Haltestellenüberdachung

12

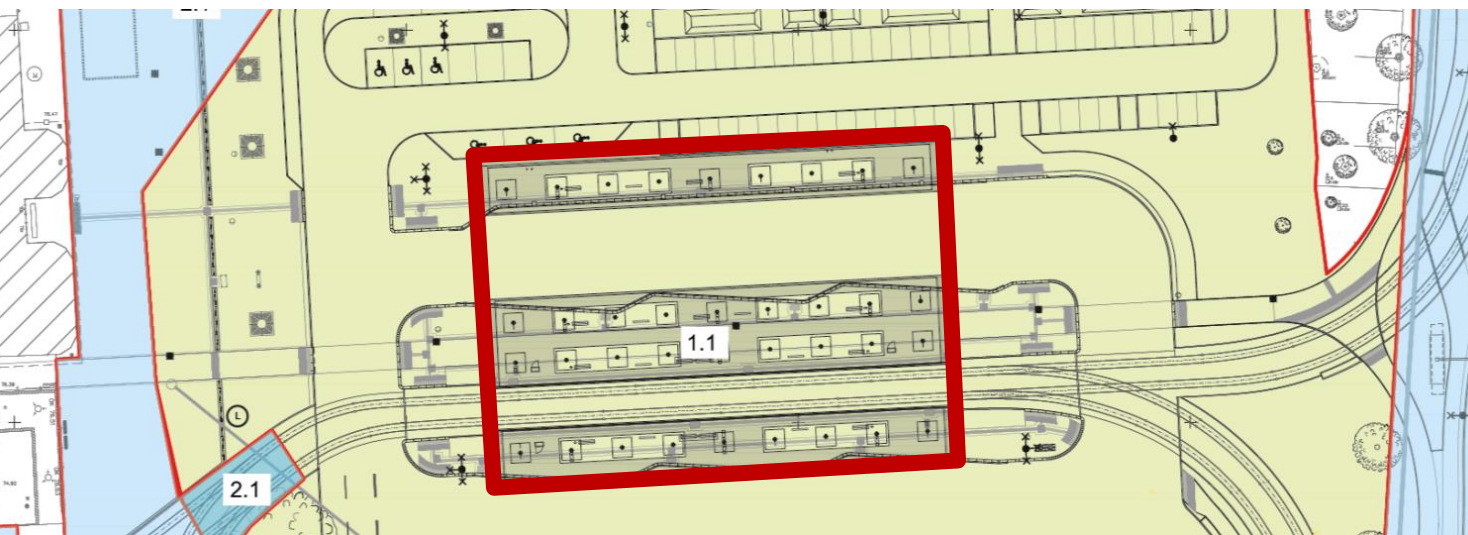

Fertiggestellt

Einbau Fundamente, Abschluss Vergabe

derzeit

Bauanlaufberatung

09.10.2018

offen:

Bestätigung Fördermittel SUW

11/2018 erwartet

Kabeltiefbau, Blitzschutz

12/2018

Stahlbau

12/2018

Dachbeschichtung

05/2019

Elektroausstattung, Beleuchtung

05/2019

Fundamente



10%

03/2017

05/2019




STADT COTTBUS  
CHÓSEBUZ

# Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

## Vorplatz Süd / Fahrradabstellanlage

13

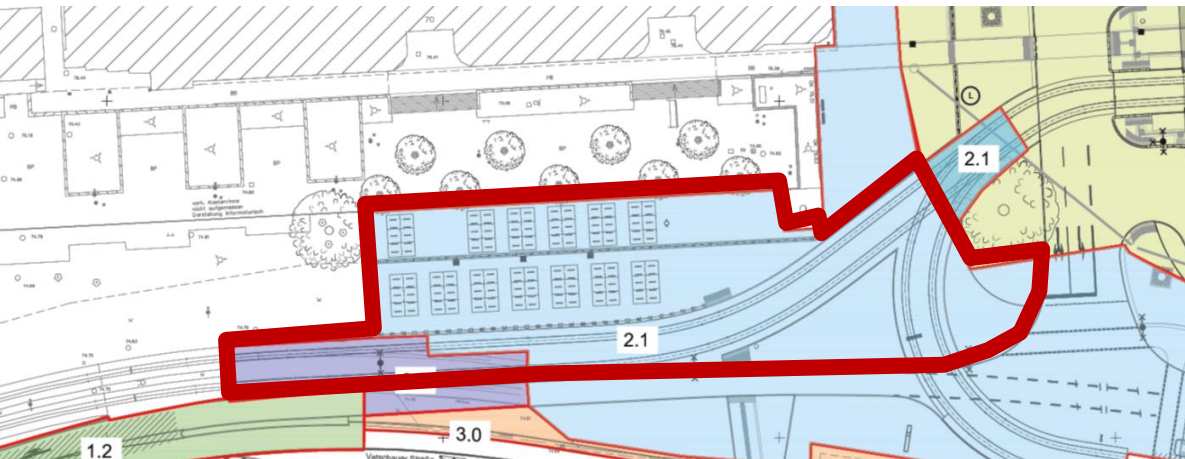

Fertiggestellt

Abbrucharbeiten, Kampfmittelfreiheit

Schmutzwasserkanal, Fettabscheideanlage (DB AG)

Regenwasserkanal, Gleisbau (CV)

offen:

Pflasterarbeiten Anbindung

12/2018 **11/2018**

Pflasterarbeiten Fahrradabstellanlage


12/2018 **05/2019**

Fahrradständer

~~07/2018~~ **05/2019**

Überdachung Fahrradabstellanlage

12/2018 **05/2019**




## Vetschauer Str./ Bahnhofstraße

# Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

## Vetschauer Straße und Zufahrt Verkehrsknoten

15

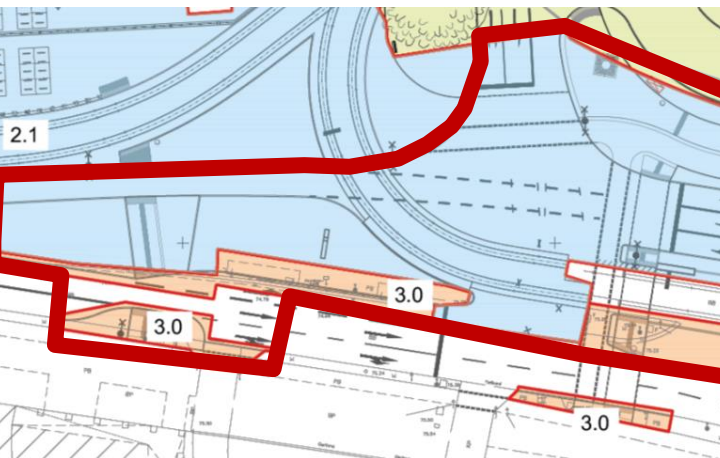

Fertiggestellt

Abbrucharbeiten, Kampfmittelfreiheit, Kabel- und Leitungsbau, Unterbau,  
Asphalt – Tragschicht & Deckschicht  
Gleisbau (CV), Rückbau (Fahrspur)

derzeit

Lichtsignalanlage  
Pflasterarbeiten

12/2018


12/2018 **12/2018**


offen:

Asphalt – Tragschicht & Deckschicht  
Restarbeiten (Überwege, etc.)

11/2018

05/2019



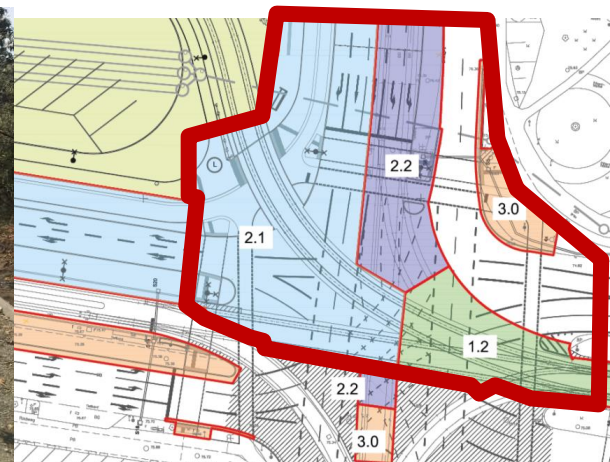

Fertiggestellt

Verkehrszeichenbrücke

Asphalt – Tragschicht & Deckschicht

Markierungsarbeiten

derzeit:

Lichtsignalanlage

10/2018


12/2018


Pflasterarbeiten Nebenanlagen

03/2019

12/2018

>> Inbetriebnahme der Verkehrsflächen Bahnhofstr. kann erst nach Fertigstellung der Sanierung Gleisbogen S/W erfolgen - **Ende 2018**



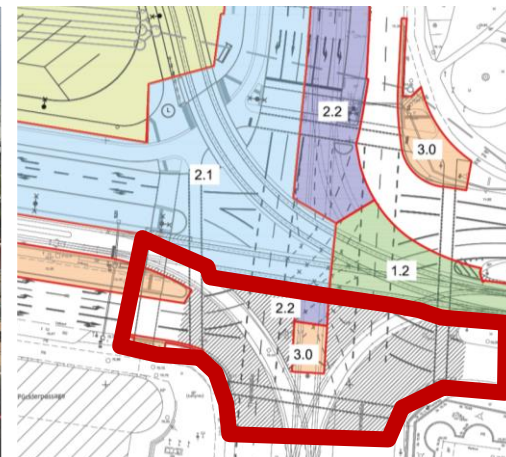

Fertiggestellt

Rückbau

Unterbau/ Erdbau S/W

derzeit

Gleisbau S/W (CV)

10/2018

offen:


Asphalt – Trag- /Deckschicht S/W

11/2018

Lichtsignalanlage

12/2018

>> Inbetriebnahme der Verkehrsflächen Vetschauer Str. und Bahnhofstr. nach Sanierung Gleisbogen S/W -  
**Ende 2018**



| Bauphase                                                | Soll-Termin |          | Ist-Termin |                      |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------|------------|----------------------|
|                                                         | Anfang      | Ende     | Anfang     | Ende                 |
| Bauvorbereitung                                         | 01.09.16    | 29.09.16 | 01.09.16   | 23.09.16             |
| Bauphase 1.1.                                           | 30.09.16    | 18.08.17 | 24.09.16   | 01.07.17             |
| Bauphase 1.2. (mit Decken-<br>sanierung KP 03 Ostseite) | 21.08.17    | 01.11.17 | 02.07.17   | 16.09.17             |
| Bauphase 1.2. nördlicher<br>Gehweg                      | 21.08.17    | 01.11.17 | 13.03.17   | 16.09.17             |
| Bauphase 2.1.                                           | 01.11.17    |          | 17.09.17   |                      |
|                                                         |             | 20.09.18 |            |                      |
| Bauphase 2.2.                                           | 20.09.18    | 18.12.18 | entfällt   | in 2.1.<br>enthalten |
| Bauphase 3 (Ausbau KP 03<br>Süd/West)                   | 02.09.18    | 18.12.18 | 02.09.18   |                      |
| Bauphase 4 (Restarbeiten)                               | 07.01.19    | 14.05.19 |            |                      |



# Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

## Übersicht Kosten

|                                                                                             | in T€            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>HH 2016-19</b>                                                                           | <b>7.585,0</b>   |
| Auftragssumme ARGE                                                                          | 4.434,0          |
| Nachträge                                                                                   | 1.163,86         |
| davon geschlossene und finanzierte Nachträge<br>→ Anteil Leistungen außerhalb des Baufeldes | 1.163,86<br>90,0 |
| davon Nachträge in Verhandlung                                                              | keine            |
| Mehrmengen Nachträge                                                                        | 566,50           |
| potenzielle Einsparungen (Entfallpositionen LV)                                             | - 244,7          |
| Planung/Baunebenkosten                                                                      | 620,0            |
| <b>Summe</b>                                                                                | <b>6.539,6</b>   |
| Leistung Haltstellenfundamente (bereits finanziert)                                         | 346,2            |
| Haltestellendach (beauftragt)                                                               | 1.725,0          |
| <b>Summe</b>                                                                                | <b>8.610,86</b>  |

Ausgleich des Defizits durch die beantragten Fördermittel (inkl. Mehrkosten Ausschreibung) aus dem Programm SUW für das Haltestellendach (bessere Konditionen) geplant

## Bautenstand Personentunnel

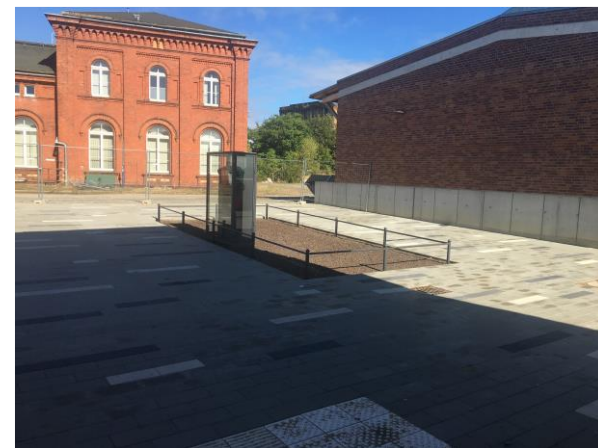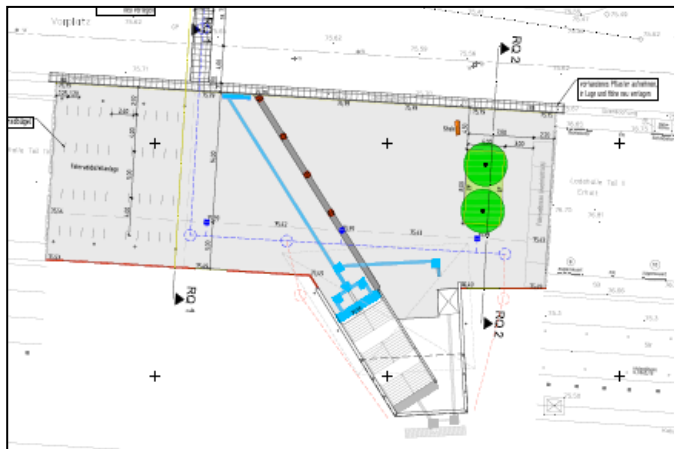

Fertiggestellt

Regenwasserkanal  
Tiefbau, Stromzuführung  
Fertigstellung Überdachung  
Pflasterarbeiten  
Einbau Fahrradbügel


derzeit

Baumpflanzung


10/2018

Fertigstellung/Inbetriebnahme:

11/2018



## Verlängerung Personentunnel

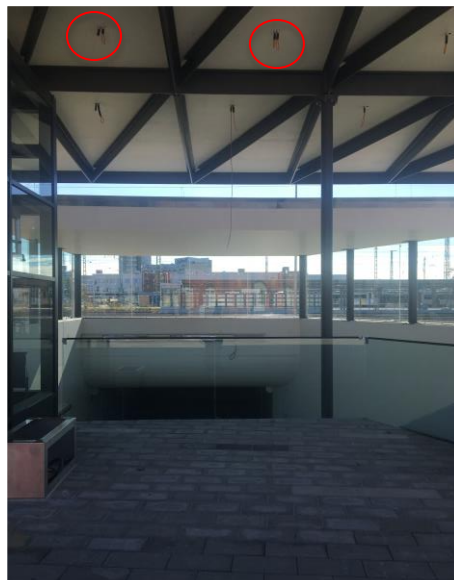

### Zeitplan

12.10. Auslieferung Beleuchtung ab Werk  
 bis 16.10. Lieferung Beleuchtung  
 16.-24.10. Montage  
 25./26.10. Endreinigung  
 29./30.10. Abnahme Inbetriebnahme-verantwortl. DB  
 01./02.11. Mängelbeseitigungen  
 ab 05.11. Abstimmung Eröffnungstermin MIL/Stadt/ DB AG

Fertiggestellt

Verglasung Zugangsbauwerk

derzeit

Ausführung Elektro Zugangsbauwerk


10/2018

Ausführung Fotowände

10/2018

Fertigstellung/Inbetriebnahme:

10/2018



**Vielen Dank**  
**für Ihre Aufmerksamkeit**
