

Verkehrsknoten – ÖPNV Terminal¹ 2016 - 2019



Bautenstand/Bauablauf

Ausschuss Bau und Verkehr 11.09.2019


Warum hat sich die Eröffnung verschoben?

- avisierte Eröffnungstermin (04.08.2019) musste aufgrund von Verzögerungen beim Bau des Haltestellendach verschoben werden
Ursache: das notwendige Personal des Auftragnehmer stand zeitweise nicht wie geplant zur Verfügung
Folgen: Verschiebung weiterer Gewerke
Neuanmeldung des Inbetriebnahmetermins der Straßenbahn durch die Technische Aufsichtsbehörde

Wann wird der Verkehrsknoten jetzt eröffnet?

- ein seriöser Eröffnungstermin kann erst nach der Abnahme/Inbetriebnahme durch die Technische Aufsichtsbehörde für die Straßenbahn am **24.09.2019** erfolgen
- ist die Abnahme erfolgreich (ohne gravierende Mängel), erfolgt die Eröffnung im **Oktober 2019**

Bauphase 4.1 (Haltestelle) ■

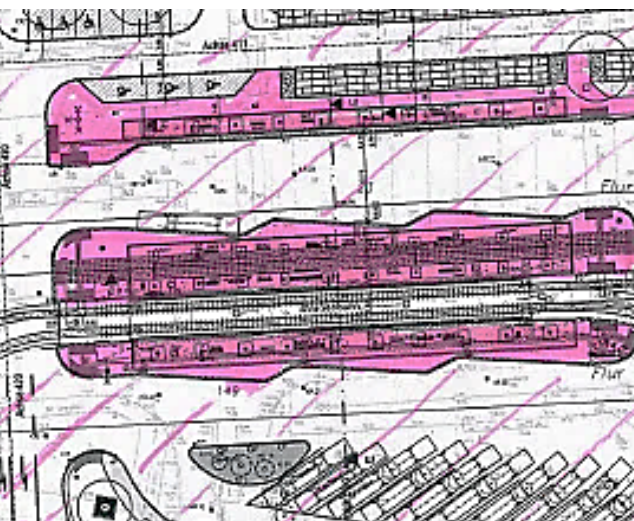

Fertiggestellt

Arbeiten abgeschlossen

offen

Nacharbeiten

09/2019

Reinigungsarbeiten Pflasterfläche


09/2019


formelle VOB Abnahme

09/2019

Beschriftung

09/2019



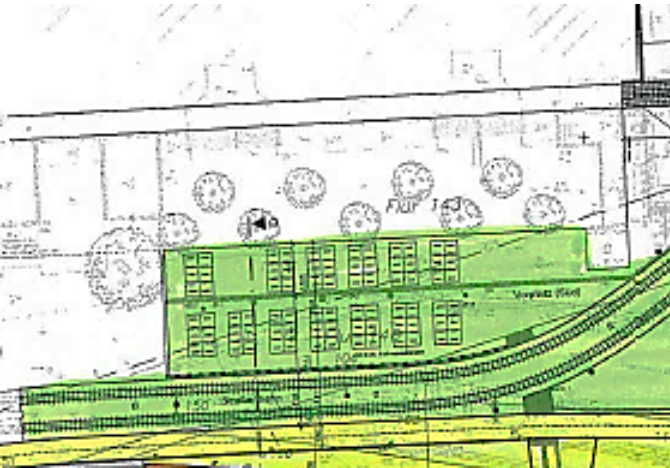

Fertiggestellt

Arbeiten abgeschlossen

VOB Abnahme/ Freigabe konnte im August nicht erfolgen, da vollständige Funktionstüchtigkeit nicht gegeben war


offen:

Nacharbeiten

formelle VOB Abnahme


09/2019

anschließend Inbetriebnahme



Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Vetschauer Str. & Bahnhofsstraße

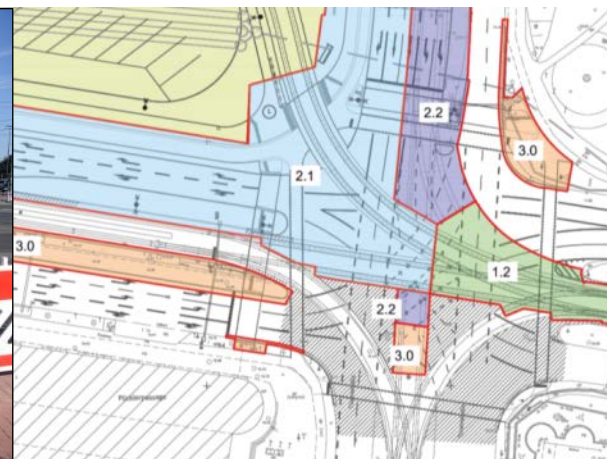

Fertiggestellt

Arbeiten abgeschlossen


offen:

Lichtsignalanlage (Endzustand)

- Probebetrieb läuft aktuell 19.08. –
- formelle VOB Abnahme 15.09.2019
- anschl. Verkehrsfreigabe und 18.09.2019
- Inbetriebnahme Lichtsignalanlage **18.09.2019**

Restleistung:

Begrünung Fahrbahnteiler 09/2019
Markierung & Beschilderung 09/2019






Fertiggestellt

Bügefahrt am 16.08.2019 erfolgt

offen:

- Nacharbeiten im Gleisbereich 09/2019
- formelle VOB Abnahme durch Cottbusverkehr 09/2019
- Einweisungsfahrten mit Bus-, Straßenbahn- und Fahrpersonal ab 19.09.19
- Abnahme Technische Aufsichtsbehörde **24.09.2018**



Bauphase	Soll-Termin		Ist-Termin	
	Anfang	Ende	Anfang	Ende
Bauvorbereitung	01.09.16	29.09.16	01.09.16	23.09.16
Bauphase 1.1.	30.09.16	18.08.17	24.09.16	01.07.17
Bauphase 1.2. (mit Decken- sanierung Knotenpunkt (KP) 03* Ostseite)	21.08.17	01.11.17	02.07.17	16.09.17
Bauphase 2.1.	01.11.17	20.09.18	17.09.17	18.12.18
Bauphase 2.2.	20.09.18	18.12.18	entfällt	in 2.1. enthalten
Bauphase 3 (Ausbau KP 03 Süd/West)	02.09.18	18.12.18	02.09.18	13.01.19
Bauphase 4 (Restarbeiten)	07.01.19	14.08.19	13.01.19	

KP 03* = Kreuzung Stadtring / Thiemstraße / Vetschauer Str. / Bahnhofstraße

Nördliches Bahnumfeld




Radparken Nordseite



- aktuelle Situation unbefriedigend
- 120 geschaffenen Fahrradstellplätze nicht ausreichend
- aktuell Mehrbedarf von ca. 50 Stellplätzen erkennbar
- Lösungen:
 - Einbau von 15 Fahrradbügel = 30 Stellplätze vor der Klinkerwand bis Ende 09/2019
 - Umsetzung vorhandener „mobiler“ Fahrradständer von der Südseite nach Freigabe der Fahrradabstellanlage Süd (Rückbau im Rahmen der Realisierung 2.BA)
 - Abschätzung weiterer Bedarfe
 - 2.BA ergänzendes Angebot von weiteren 10 Fahrradbügel = 20 Stellplätzen
 - ggf. Realisierung einer weiteren überdachten Fahrradabstellanlage im Rahmen des 4.BA


BA	Status
1.BA	Abgeschlossen
2.BA	Bewilligung FM 08/2019 erfolgt Ausschreibung IV. Quartal 2019 Baubeginn I/II. Quartal 2020
3.BA	Aktuell Vorplanung
4.BA	Planungen noch nicht begonnen Einordnung FM StuA erfolgt Vorbereitung Interessenbekundung „Förderung innovativer Projekte zur Verbesserung des Radverkehrs“
5.BA	Planungen noch nicht begonnen Einordnung FM StuA erfolgt

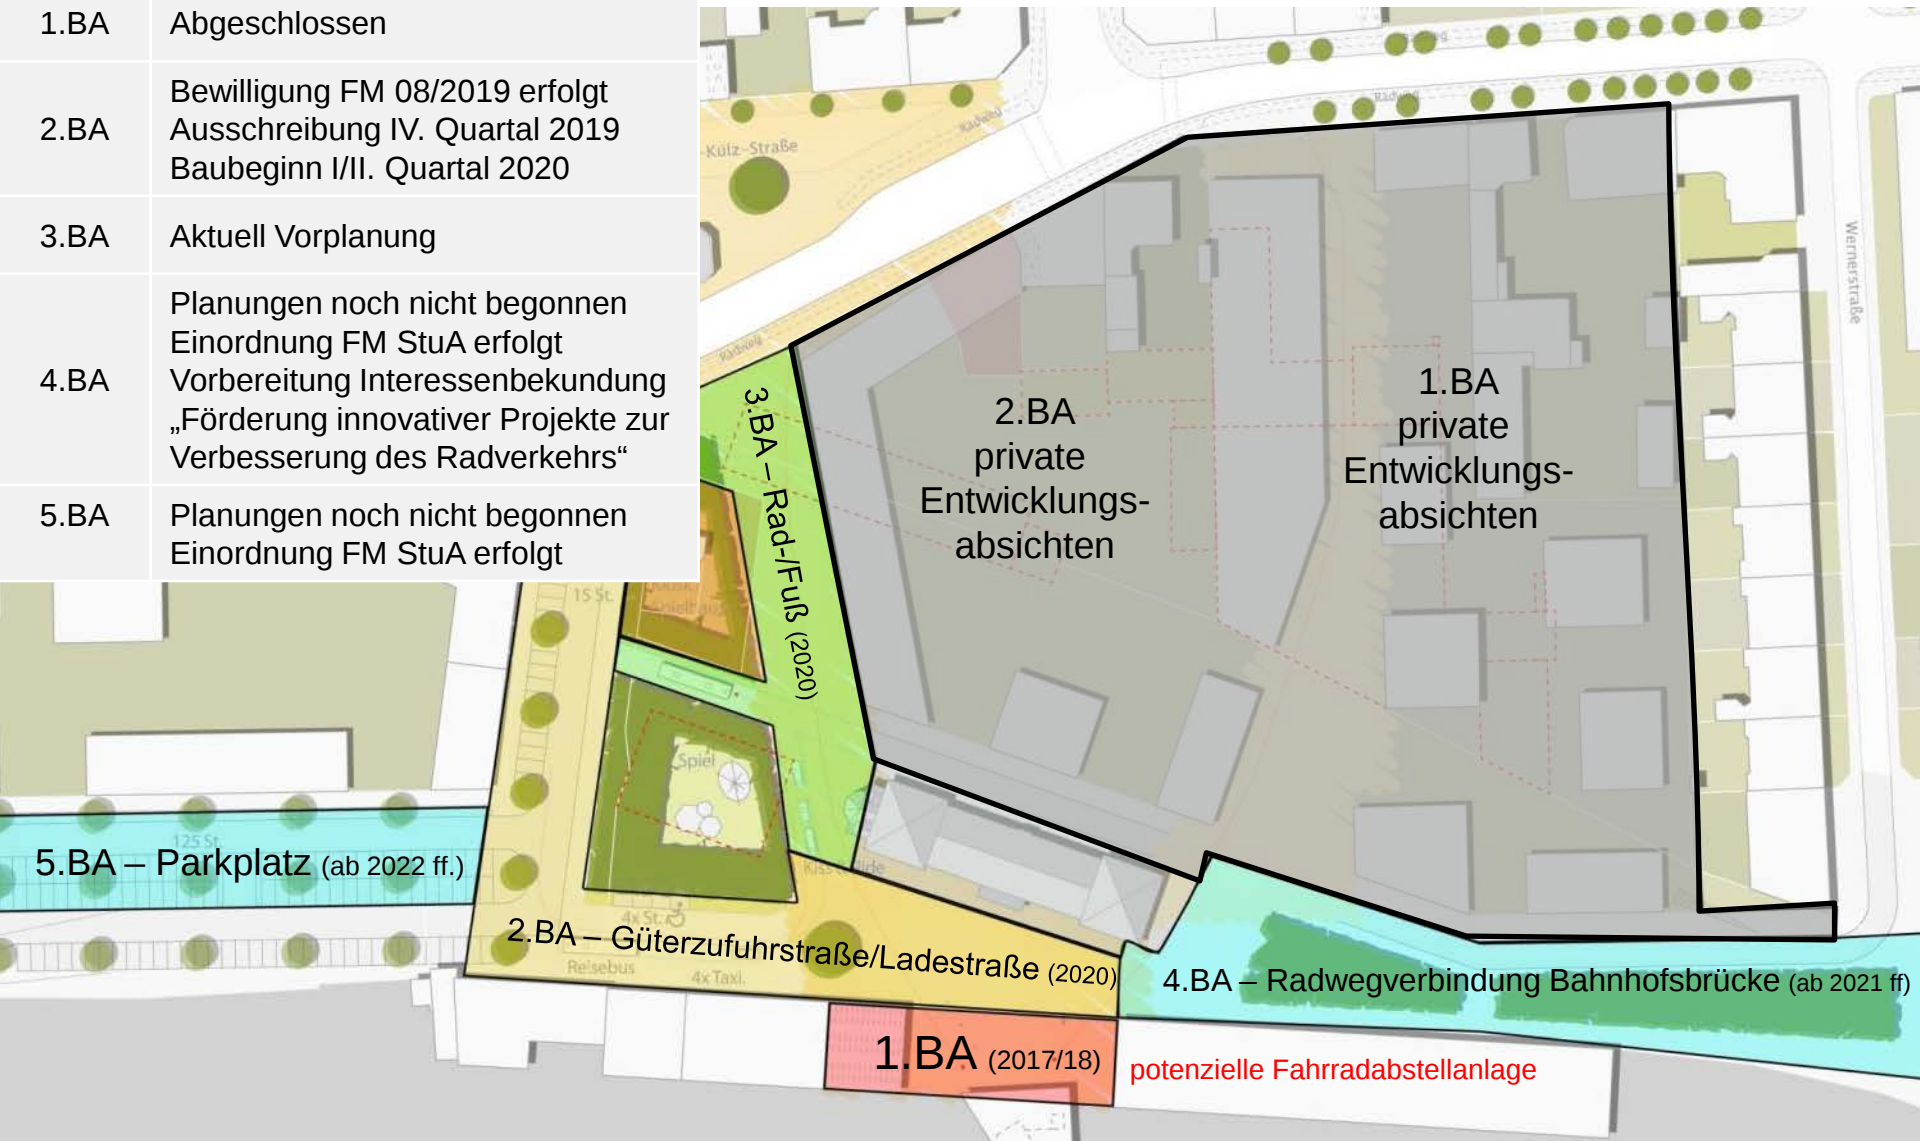

Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Stand Bebauungsplan

15

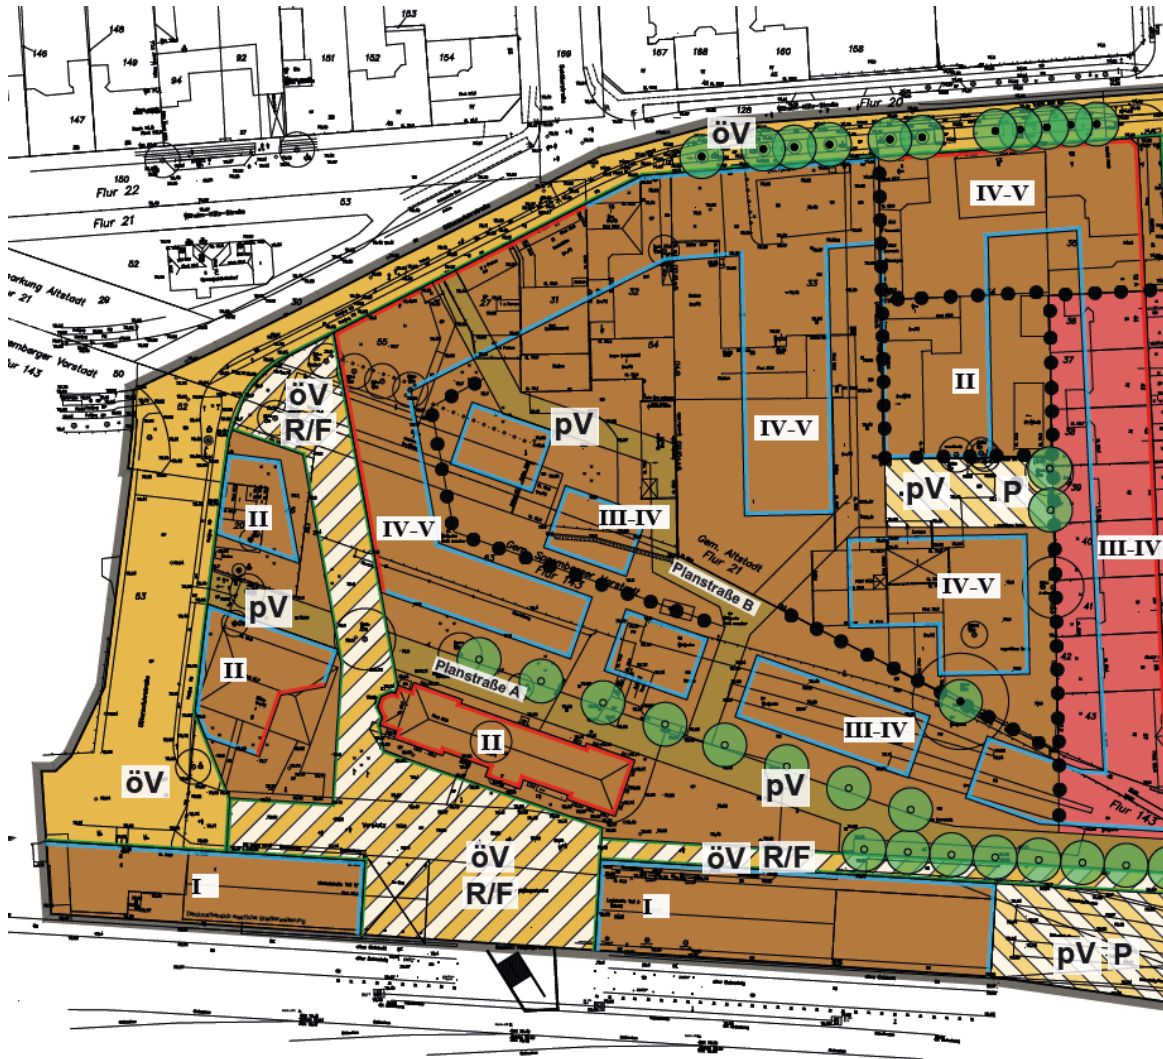

Stand Bebauungsplan

- 1. Offenlage und Sichtung aller eingegangenen Stellungnahmen abgeschlossen
- **derzeit Anpassung Gesamtkonzept durch Vorhabenträger**
- überarbeiteter Planentwurf sowie erneuter Offenlagebeschluss notwendig (2.HJ)

Vielen Dank

für Ihre Aufmerksamkeit
