

Verkehrsknoten – ÖPNV Terminal¹ 2016 - 2019



Bautenstand/Bauablauf


Ausschuss Wirtschaft, Bau und Verkehr 12.09.2018

Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand


Schaustelle/Baustelle – 26.07.2018

2



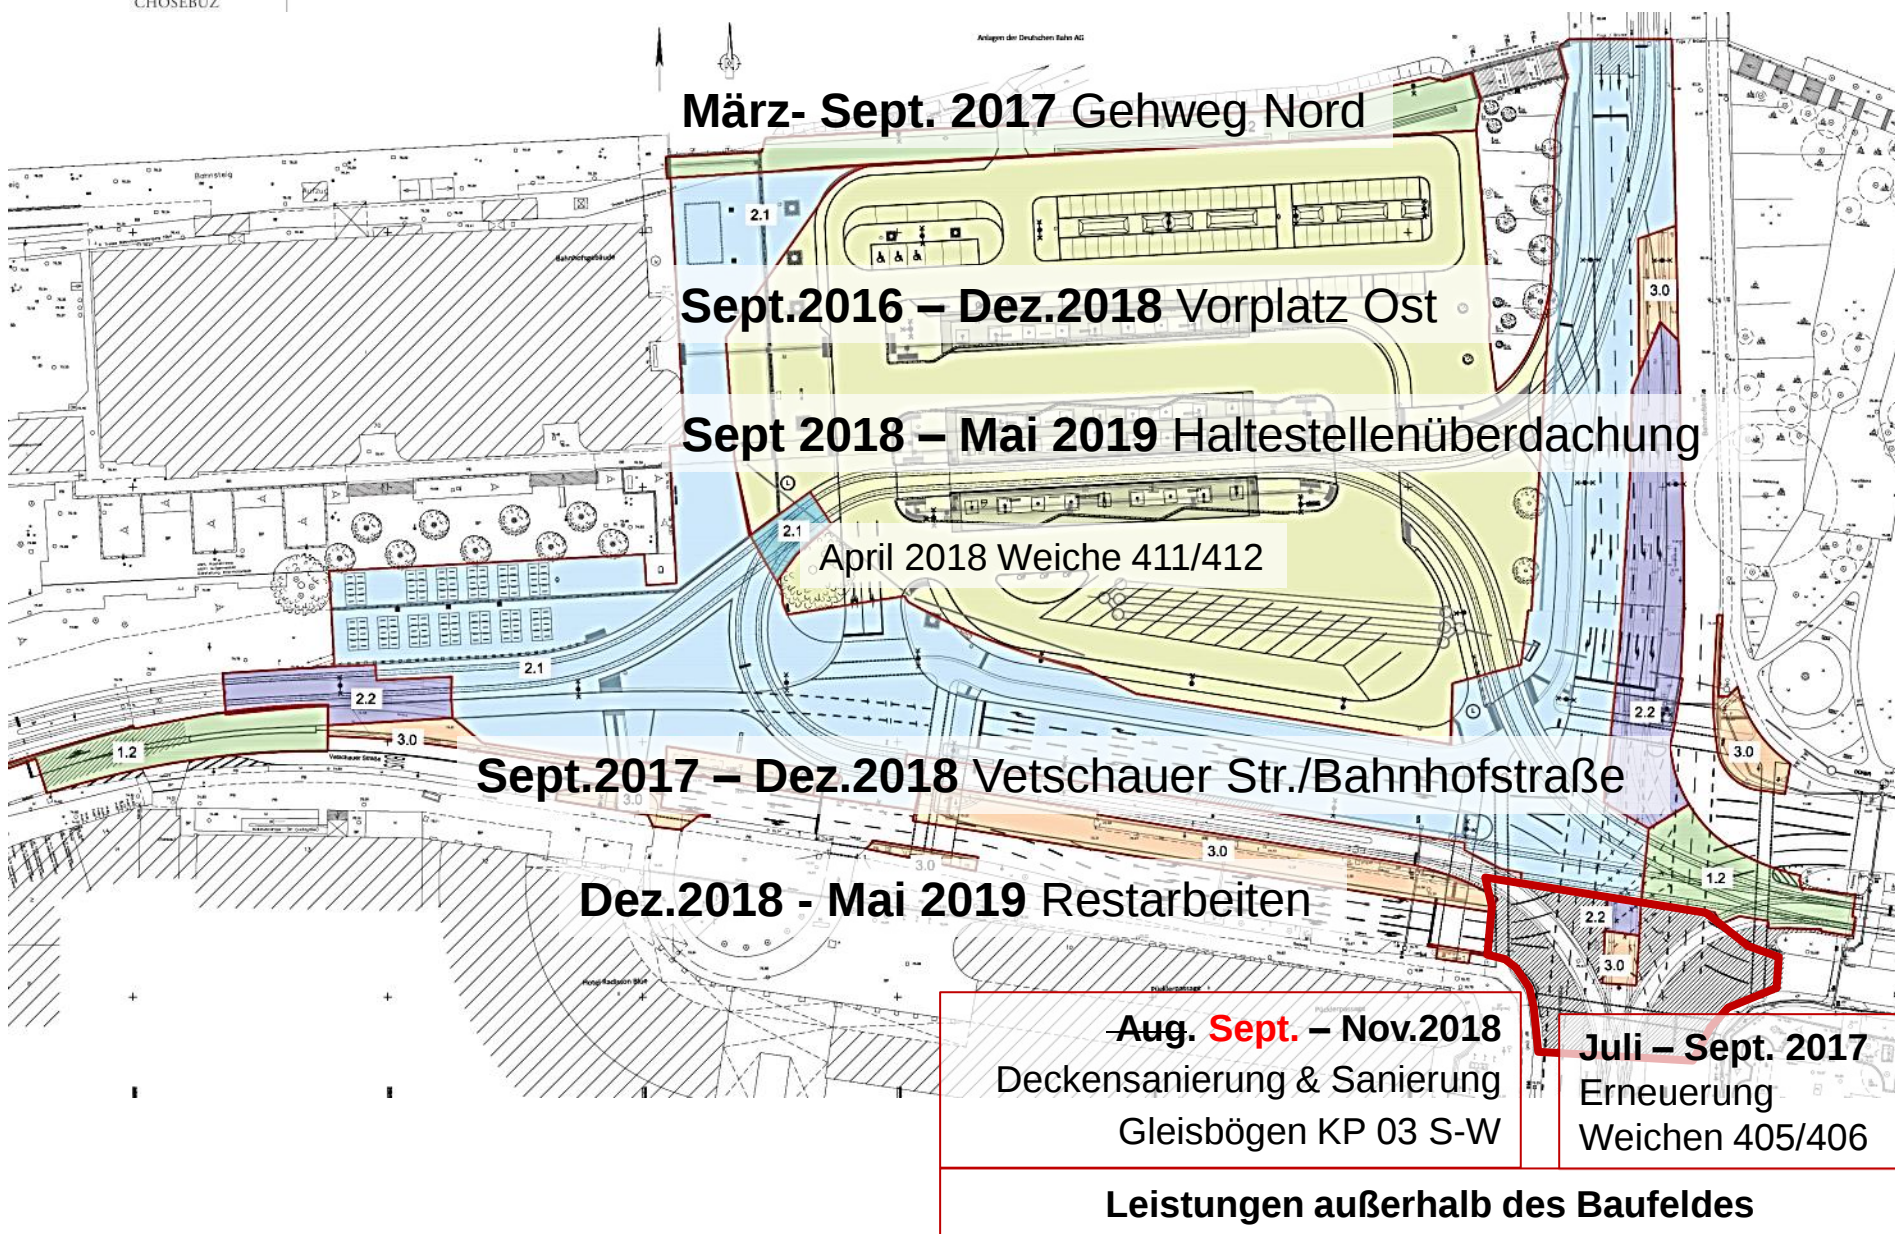

Vorplatz

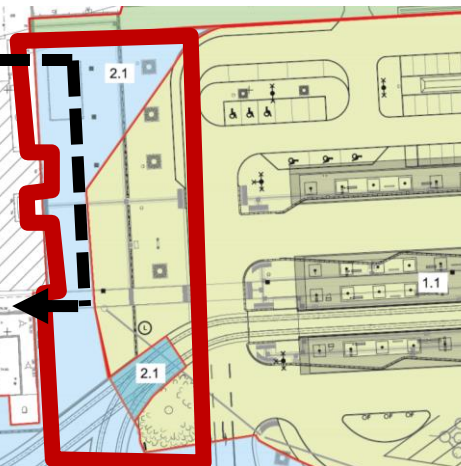

Fertiggestellt

Erdbau, Pflasterarbeiten Bauphase 1
Einbau Weiche 413/414 (CV)
Baumpflanzungen
Pflasterarbeiten bis zum Bahnhofsgebäude
→ *Öffnung Osteingang Bahnhof erfolgt*

07/2018


derzeit

Anbindung Bahnsteig 1
Sanierung Sockel der Stele
Pflasterarbeiten Teil Süd

09/2018


09/2018

11/2018



Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Haltestellenüberdachung

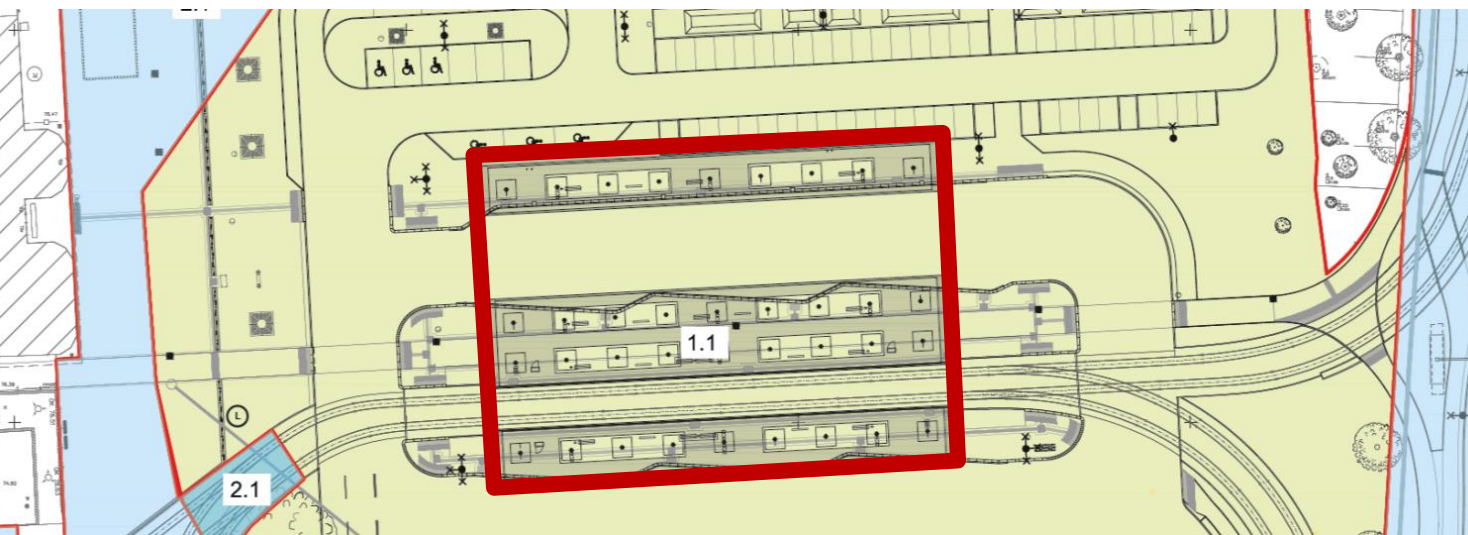

Fertiggestellt

Einbau Fundamente

derzeit

Abschluss Vergabe

08/2018 **09/2018**

offen:

Bestätigung Fördermittel SUW

offen

Kabeltiefbau, Blitzschutz

12/2018

Stahlbau

12/2018

Dachbeschichtung

05/2019

Elektroausstattung, Beleuchtung

05/2019

Fundamente



10%

03/2017

05/2019




STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Vorplatz Süd / Fahrradabstellanlage

7

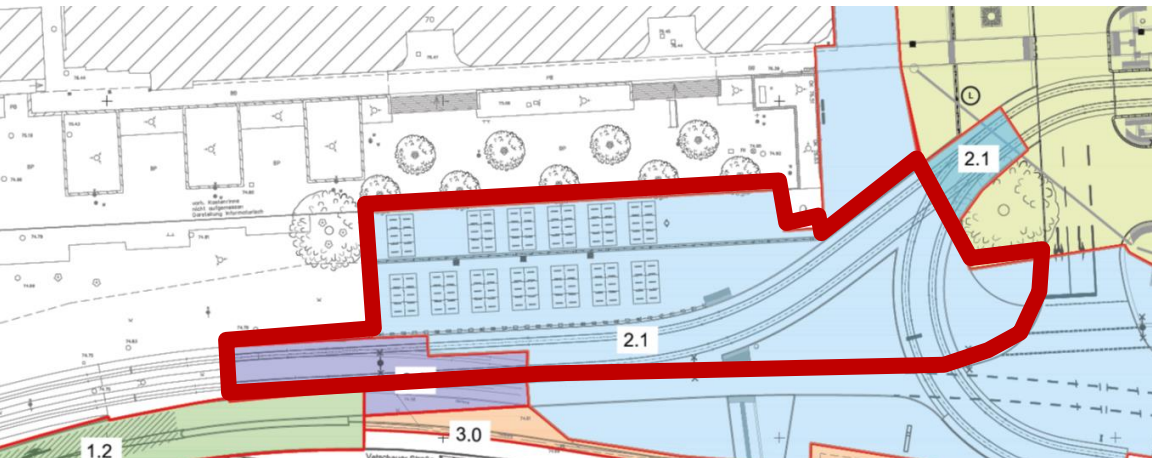

Fertiggestellt

Abbrucharbeiten, Kampfmittelfreiheit
Schmutzwasserkanal, Fettabscheideanlage (DB AG)
Regenwasserkanal

derzeit

Gleisbau (CV)

11/2018 **09/2018**

offen:

Pflasterarbeiten


12/2018 **11/2018**

Fahrradständer

07/2018 **10/2018**

Überdachung Fahrradabstellanlage


12/2018



Vetschauer Str./ Bahnhofstraße

Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Vetschauer Straße und Zufahrt Verkehrsknoten

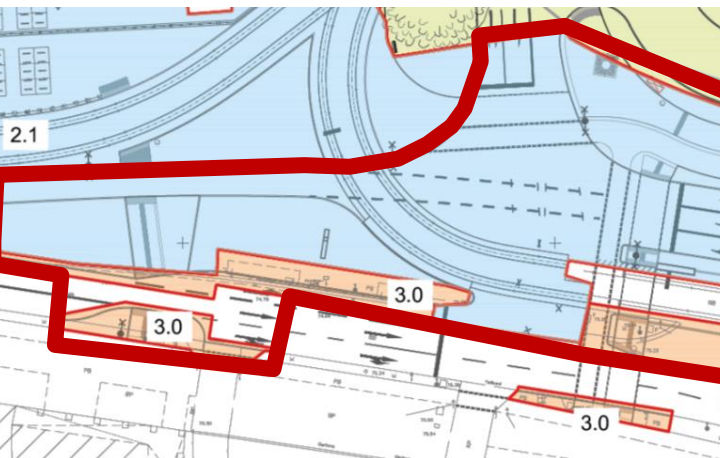

Fertiggestellt





Abbrucharbeiten, Kampfmittelfreiheit, Kabel- und Leitungsbau, Unterbau, Asphalt – Tragschicht & Deckschicht

Teilbetriebnahme mit Verkehrsumstellung 09/2018

derzeit	Lichtsignalanlage	12/2018
	Gleisbau (CV)	12/2018 09/2018
	Rückbau (Fahrspur)	04/2019 09/2018
	Pflasterarbeiten	05/2019

offen:	Asphalt – Tragschicht & Deckschicht	11/2018
	Restarbeiten (Überwege, etc.)	05/2019



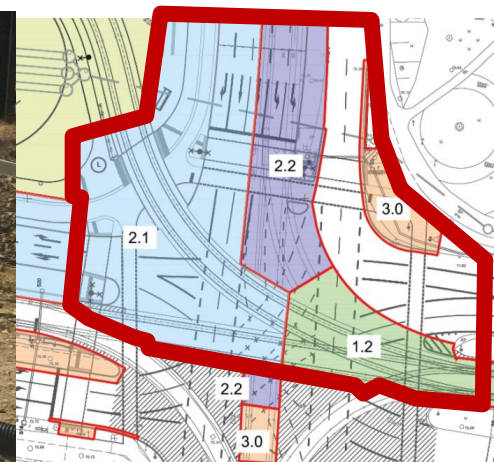

Fertiggestellt

Verkehrszeichenbrücke

Asphalt – Tragschicht & Deckschicht

derzeit:

Lichtsignalanlage

10/2018

Markierungsarbeiten


11/2018


Pflasterarbeiten Nebenanlagen

03/2019

12/2018

>> Inbetriebnahme der Verkehrsflächen Bahnhofstr. kann erst nach Fertigstellung der Sanierung Gleisbogen S/W erfolgen - **Ende 2018**



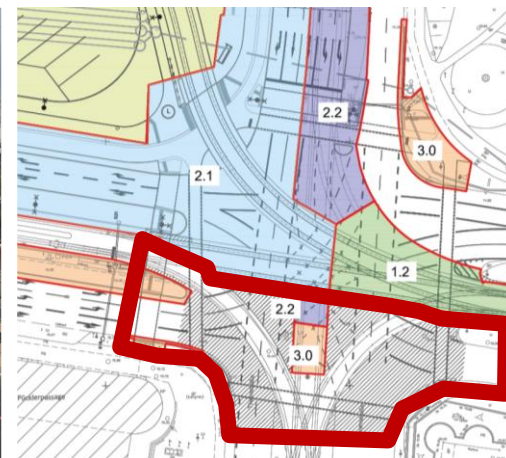

derzeit

Rückbau

08/2018 **09/2018**

offen:

Unterbau/ Erdbau S/W

10/2018


Gleisbau S/W (CV)

11/2018

Asphalt – Trag- /Deckschicht S/W

11/2018

>> Inbetriebnahme der Verkehrsflächen Vetschauer Str. und Bahnhofstr. nach Sanierung Gleisbogen S/W -
Ende 2018



Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Ableich Terminplan Soll & IST

Bauphase	Soll-Termin		Ist-Termin	
	Anfang	Ende	Anfang	Ende
Bauvorbereitung	01.09.16	29.09.16	01.09.16	23.09.16
Bauphase 1.1.	30.09.16	18.08.17	24.09.16	01.07.17
Bauphase 1.2. (mit Decken- sanierung KP 03 Ostseite)	21.08.17	01.11.17	02.07.17	16.09.17
Bauphase 1.2. nördlicher Gehweg	21.08.17	01.11.17	13.03.17	16.09.17
Bauphase 2.1.	01.11.17		17.09.17	
		20.09.18		
Bauphase 2.2.	20.09.18	18.12.18	entfällt	in 2.1. enthalten
Bauphase 3 (Ausbau KP 03 Süd/West)	02.09.18	18.12.18	02.09.18	
Bauphase 4 (Restarbeiten)	07.01.19	14.05.19		

Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Übersicht Kosten

	in T€
HH 2016-19	7.585,0
Auftragssumme ARGE	4.434,0
Nachträge	1.163,86
davon geschlossene und finanzierte Nachträge → Anteil Leistungen außerhalb des Baufeldes	1.163,86 90,0
davon Nachträge in Verhandlung	keine
Mehrmengen Nachträge	566,50
potenzielle Einsparungen (Entfallpositionen LV)	- 244,7
Planung/Baunebenkosten	620,0
Summe	6.539,6
Leistung Haltstellenfundamente (bereits finanziert)	346,2
Haltestellendach (Kostenberechnung)	1.224,0
<i>Kostenerhöhung nach Ausschreibung*</i> <i>*(Vergabeverfahren noch nicht abgeschlossen)</i>	<i>vorhanden</i>
Summe	8.109,86

Ausgleich des Defizits durch die beantragten Fördermittel aus dem Programm SUW für das Haltestellendach (bessere Konditionen) geplant

Bautenstand Personentunnel

Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Verlängerung Personentunnel

15



Fertiggestellt

Elektro im Tunnel
Montage Aufzug

derzeit

Verglasung ZGBW

09/2018

Ausführung Elektro ZGBW


10/2018

Ausführung Fotowände

10/2018

Fertigstellung/Inbetriebnahme:



10/2018



Umbau Bahnhof Cottbus – Bautenstand

Vorplatz Nord 1.BA

16

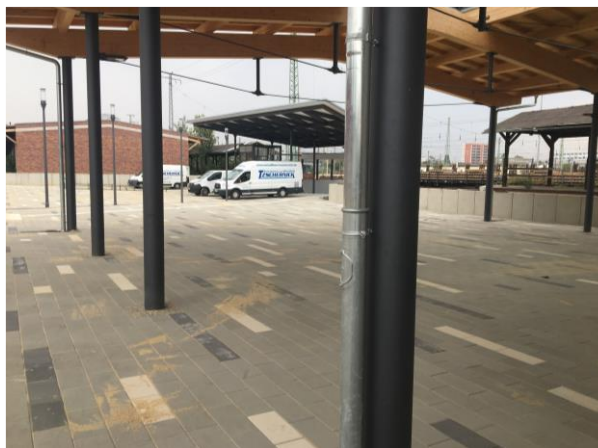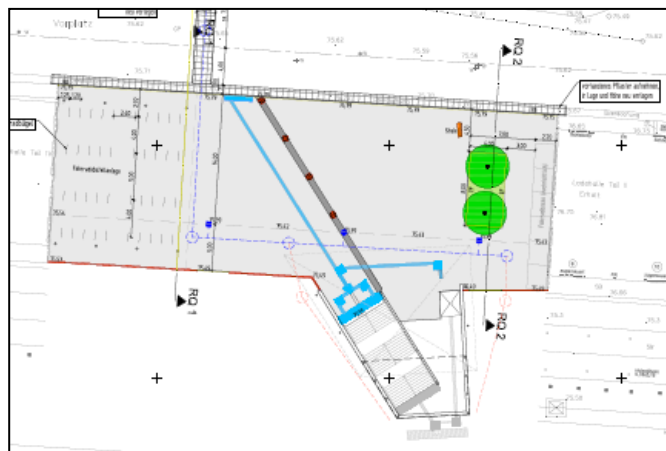

Fertiggestellt

Regenwasserkanal
Tiefbau, Stromzuführung
Fertigstellung Überdachung
Pflasterarbeiten

derzeit


Einbau Fahrradbügel
Baumpflanzung

09/2018

10/2018

Fertigstellung/Inbetriebnahme:

10/2018





Eröffnung Personentunnel

Do. 11.10.2018

umbau-bahnhof-cottbus.de



Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit
