




Rücklaufmittel der EFRE-Förderperiode 2007-13

Nachrücker-Projekte der Stadt Cottbus


1. Außenanlagen Wilhelm-Nevoigt-Grundschule
2. Spiel- und Ballsportanlage Am Stadtrand

NSE 2007-13 | Kurzübersicht der angemeldeten Projekte – Rücklaufmittel II



Außenanlagen Wilhelm-Nevoigt-Grundschule

Gesamtkosten 650,8 T€ , davon
488,1 T€ FM



Spiel- und Ballsportanlage Am Stadtrand

Gesamtkosten 133 T€, davon
92,2 T€ FM



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

EFRE Förderperiode 2007-2013 | Rücklaufmittel

NSE 2007-13 | Kurzübersicht der angemeldeten Projekte – Rücklaufmittel II

11.02.2014	Information des MIL zur Verfügbarkeit weiterer Rücklaufmittel NSE
8.KW	Erarbeitung und Abstimmung von Projektvorschlägen
18.02.2014	Abstimmung mit dem LBV zu den Projektvorschlägen und Rahmenbedingungen
28.02.2014	Information an das LBV zur weiteren Ablaufplanung
04.03.2014	Zwischeninformation der Rathaus spitze
06.03.2014	Abstimmung mit dem MIL zur Ablaufplanung
12.03.2014	1. Information des WBVA
28.03.2014	Termin zur Einreichung der Antragsunterlagen
16.04.2014	2. Information des WBVA
10.09.2014	3. Information des WBVA
30.09.2014	Gebrauchsfertige Herstellung der Spiel- und Ballspielanlage Am Stadtrand und Nachweis der Eigentümerschaft/Verfügungsgewalt
30.11.2014	Gebrauchsfertige Herstellung der Außenanlagen Wilhelm-Nevoigt-Grundschule



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

1. Außenanlagen Wilhelm-Nevoigt-Grundschule



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

EFRE Förderperiode 2007-2013 | Rücklaufmittel

Außenanlagen Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | Fotos vom Ausgangszustand



29.09.2014



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

EFRE Förderperiode 2007-2013 | Rücklaufmittel

Außenanlagen Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | Fotos vom Bauzustand




29.09.2014



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

EFRE Förderperiode 2007-2013 | Rücklaufmittel

Außenanlagen Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | Entwurfsplan

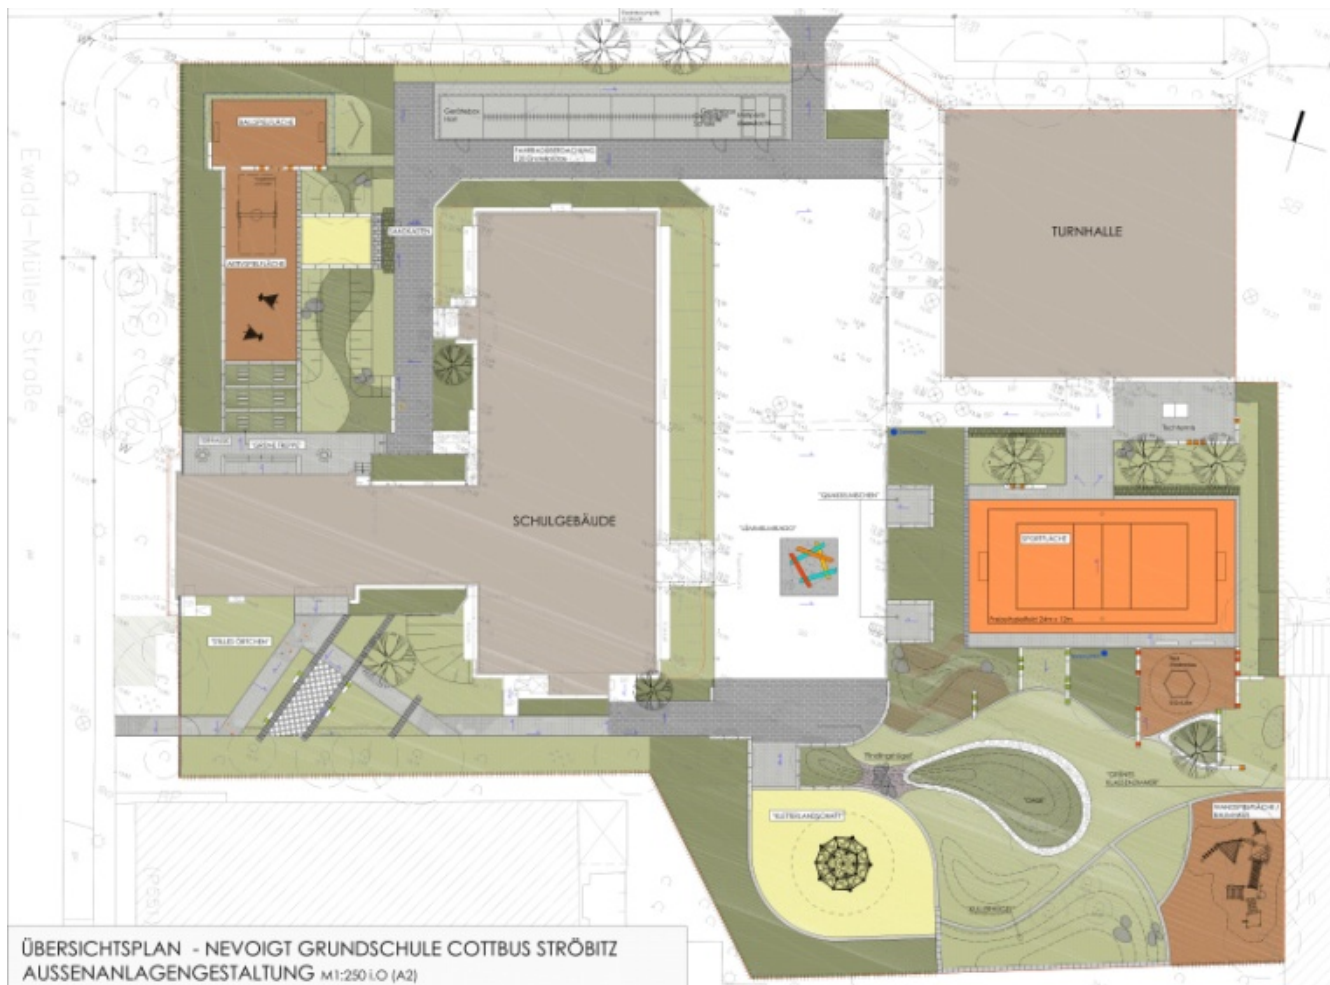



Schulgebäude, Aula-Unterlagerung mit dem Hort sowie Multifunktionshalle wurden über die StBauF realisiert

Letzter Bauabschnitt ist die **Gestaltung der Außenanlagen** mit attraktiven Spiel- und Erholungsbereichen für die Pausen und den Hortbetrieb sowie für die Nutzung in der Freizeit

Versorgung für das gesamte Quartier maßgeblich, d.h. Zugänglichkeit der Außenanlagen auch außerhalb des Schulbetriebes sollen abgesichert werden

Themen Barrierefreiheit und Ganztagschulbetrieb

Fördermittelantrag wurde am 28.03.2014 fristgerecht eingereicht

Zuwendungsbescheid wurde am 08.07.2014 erteilt:

Gesamtausgaben	650.800,02 €
75 % Zuwendung NSE (EFRE)	488.100,00 €
25 % Eigenmittel Stadt	162.700,02 €

Baubeginn war am 10.07.2014, Bauende ist am 30.11.2014



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

EFRE Förderperiode 2007-2013 | Rücklaufmittel

Außenanlagen Wilhelm-Nevoigt-Grundschule | Bauablaufplanung

Planung/ Vorbereitung

24.02.14	Veröffentlichung der Planungsleistung über ZVM auf Vergabemarktplatz
07.03.14	Angebotsabgabe mit Zeitangaben zur Umsetzung durch die Planungsbüros
11.03.14	Wertung der Angebote, ggf. Bietergespräche, Vorschlag PB
17.03.14	Architektenvertrag mit Honorarermittlung gem. Angebot des PB
17.03.14	erste Abstimmung mit Schule und Schulförderverein: Klärung Aufgabenstellung, Festlegung der Rangfolge in der Umsetzung (Bezug: Machbarkeitsstudie)
28.03.14	FM-Antrag eingereicht, Kostenangaben nach städtebaulichem Fördersatz
22.04.14	Entwurfsplanung (Lph 3) inkl. Kostenberechnung,
30.05.14	Ausführungsplanung/ Vorbereitung Vergabe (Lph 5/ 6)/ baufachliche Prüfung durch BLB
08.07.14	Zuwendungsbescheid der ILB (Investitionsbank des Landes Brandenburg) über insgesamt 650,8 T€

Bau – Öffentliche Ausschreibung VOB

02.06.14	Verfahrensbeginn, Veröffentlichung der Ausschreibung über Zentrales Vergabemanagement/ ZVM
16.06.14	Submission
26.06.14	Vergabekommission
03.07.14	Bauftrag an PASA Bau GmbH
10.07.14	Baubeginn (1.Ferienwoche)
41.Kw	voraussichtliche Freigabe des südlichen und östlichen Schulgeländes (nach Einbau der Spielgeräte und des Kunststoffbelags)
30.11.14	Bauende (gemäß Zuwendungsbescheid)



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

2. Spiel- und Ballsportanlage Am Stadtrand



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

EFRE Förderperiode 2007-2013 | Rücklaufmittel

Spiel- und Ballsportanlage Am Stadtrand | Fotos vom Ausgangszustand





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

EFRE Förderperiode 2007-2013 | Rücklaufmittel

Spiel- und Ballsportanlage Am Stadtrand | Fotos vom Bauzustand





STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

EFRE Förderperiode 2007-2013 | Rücklaufmittel

Spiel- und Ballsportanlage Am Stadtrand | Übersichtsplan





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

EFRE Förderperiode 2007-2013 | Rücklaufmittel

Spiel- und Ballsportanlage Am Stadtrand | Kosten nach Auftrag

Schaffung von Angeboten für Kinder 10+ im Bereich Stadtrand durch
Spielplatz 7-15 Jahre und Ballsportanlagen (Streetball, Fußball)

In unmittelbarer Nähe zum Flüchtlingswohnheim mit derzeit 150 Bewohnern,
davon ca. 50 Kinder und Jugendliche

Nachweise zur Verfügbarkeit des Grundstücks und Sicherung des
Standortes für Dauer der Zweckbindung liegen vor

Zuwendungsbescheid wurde am 16.06.2014 erteilt :

	lt. Zuwendung	Bedarf lt. Auftrag
Gesamtausgaben	123.009,22 €	133.054,65 €
Zuwendung NSE (EFRE)	92.256,00 €	92.256,00 €
Eigenmittel Stadt	30.753,22 €	40.798,65 €



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

EFRE Förderperiode 2007-2013 | Rücklaufmittel

Spiel- und Ballsportanlage Am Stadtrand | Bauablaufplanung

Planung/ Vorbereitung

26.02.14	Anschreiben zur Abforderung eines Angebots ist an Planungsbüros verschickt worden
10.03.14	Angebotsabgabe, Wertung und Auswahl eines Büros
14.03.14	Architektenvertrag entsprechend Angebotsauswertung
28.03.14	FM-Antrag eingereicht, Kostenangaben nach Schätzung: 150 T€ brutto
14.04.14	Entwurfsplanung (Lph 3)
19.05.14	Ausführungsplanung/ Vorbereitung Vergabe (Lph 5/6)
22.05.14	baufachliche Prüfung durch BLB
28.05.14	Gestattungsverträge der Wohnungsunternehmen zur Verfügbarkeit der Flächen unterschrieben
02.06.14	Baugenehmigung erteilt
16.06.14	Zuwendungsbescheid durch ILB

Bau– Öffentliche Ausschreibung VOB

20.05.14	Verfahrensbeginn, Veröffentlichung der Ausschreibung
02.06.14	Submission
12.06.14	Vergabekommission
20.06.14	Bauftrag an Alpina AG, NL Cottbus
18.08.14	Baubeginn (war abhängig von der Lieferfrist der Spielgeräte; Auflage FB Umwelt, erst nach 15.08.14 zu beginnen)
30.09.14	Bauende
17.10.14	voraussichtliche Freigabe der Anlagen (28 Tage Beton-Aushärtezeit Fundamente)
