

Neugestaltung der Flaniermeile und Postparkplatz Stadtpromenade / Stadt Cottbus




Präsentation

Bearbeitung: atelier8 landschaftsarchitektur / DEGAT Planungsgesellschaft mbH






1. Bauabschnitt

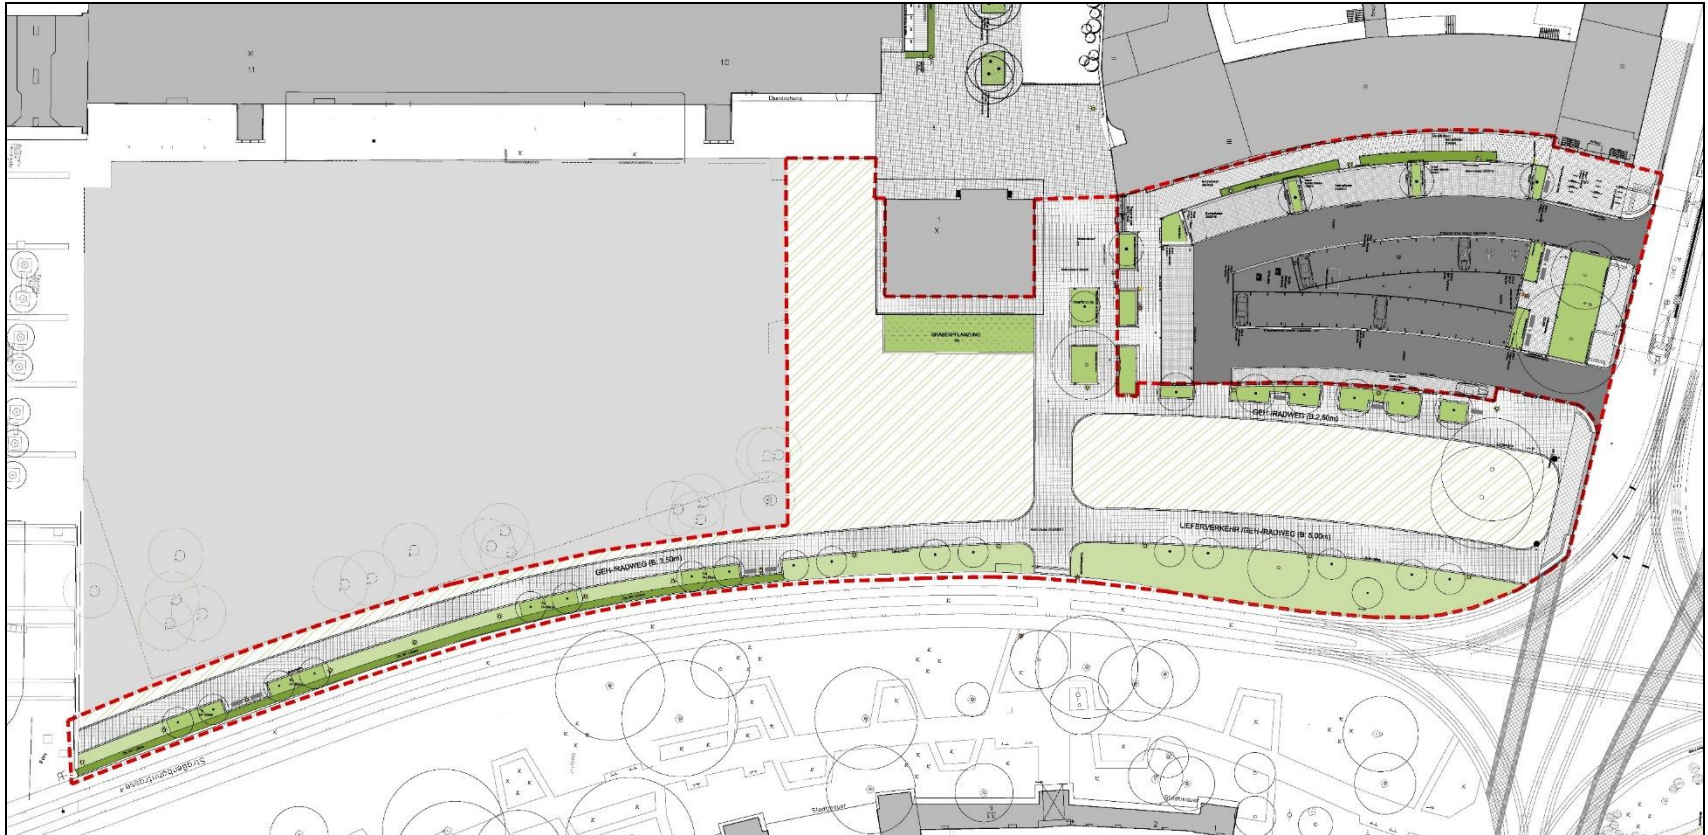




Bearbeitungsflächen

Bearbeitungsgebiet unterteilt nach 1.BA (Postparkplatz und Flaniermeile) und 2.BA (Flaniermeile)

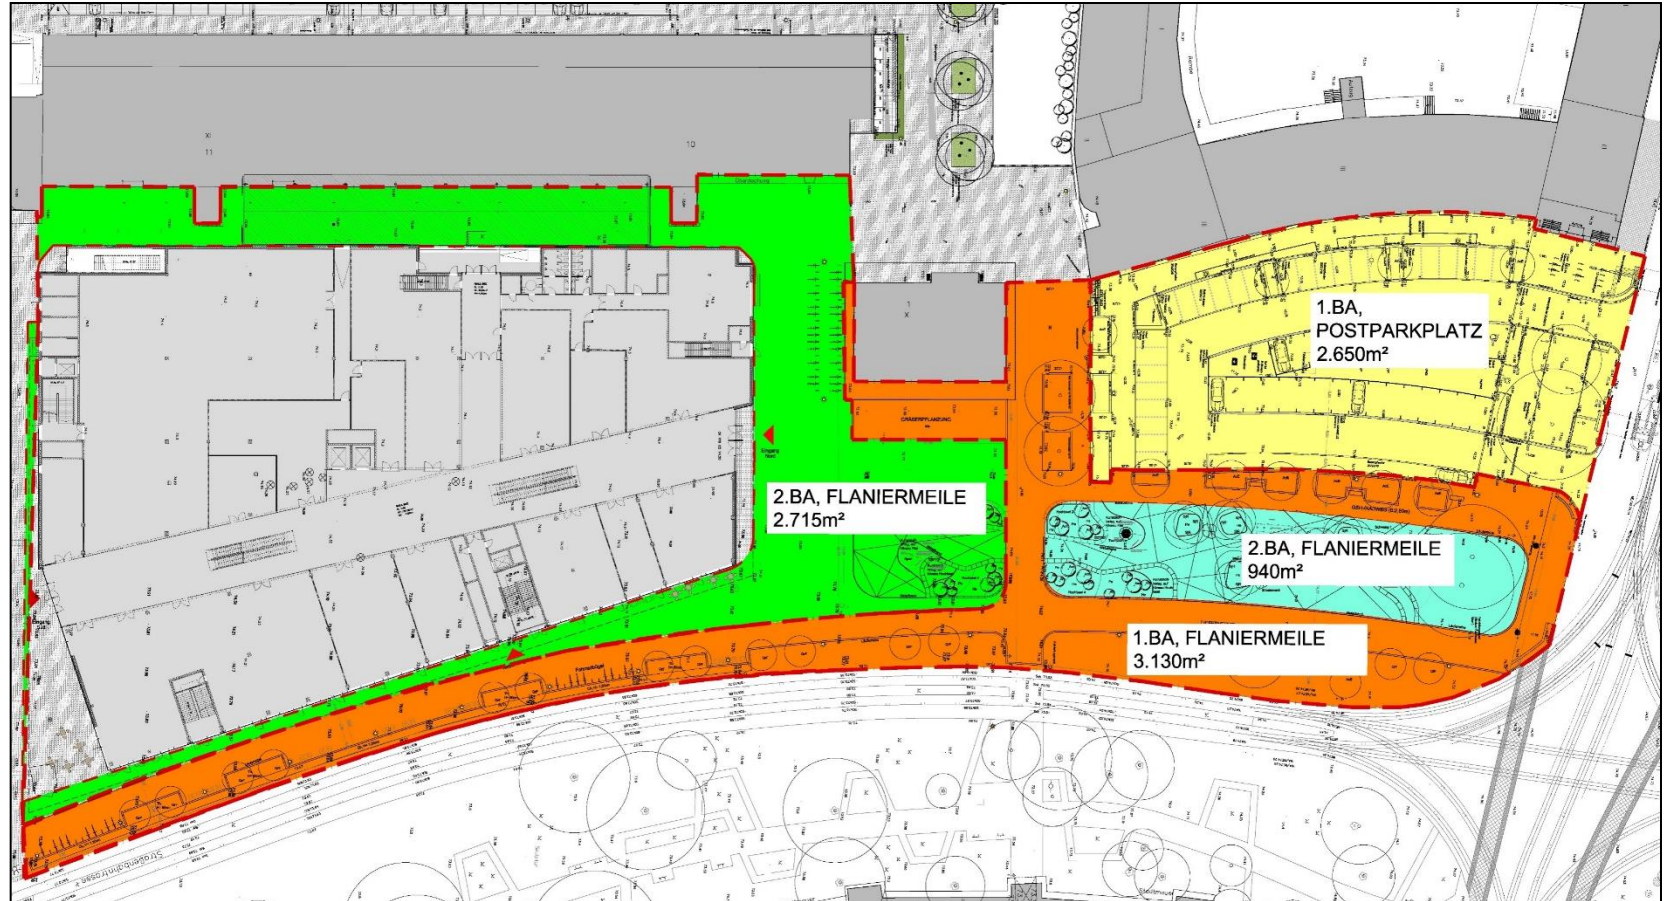

Übersichtsplan Leitungsplan

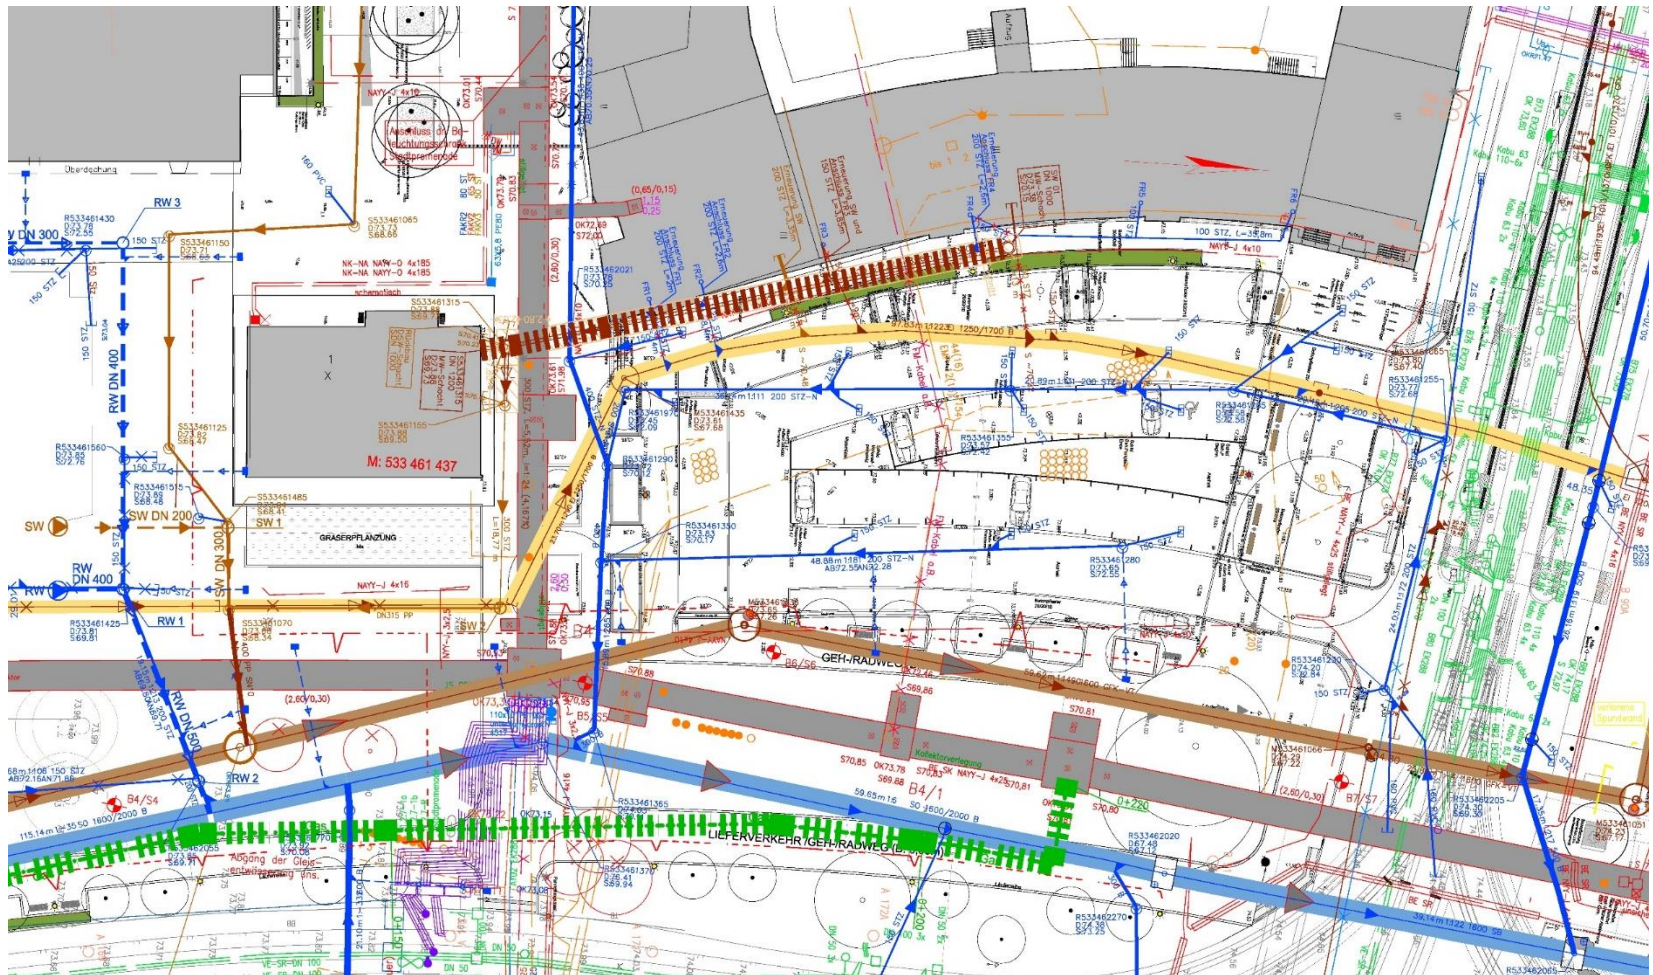

Medien Neuverlegung:


EVC verlegt Gasleitung



LWG Schmutzwasser



Flaniermeile / Postparkplatz

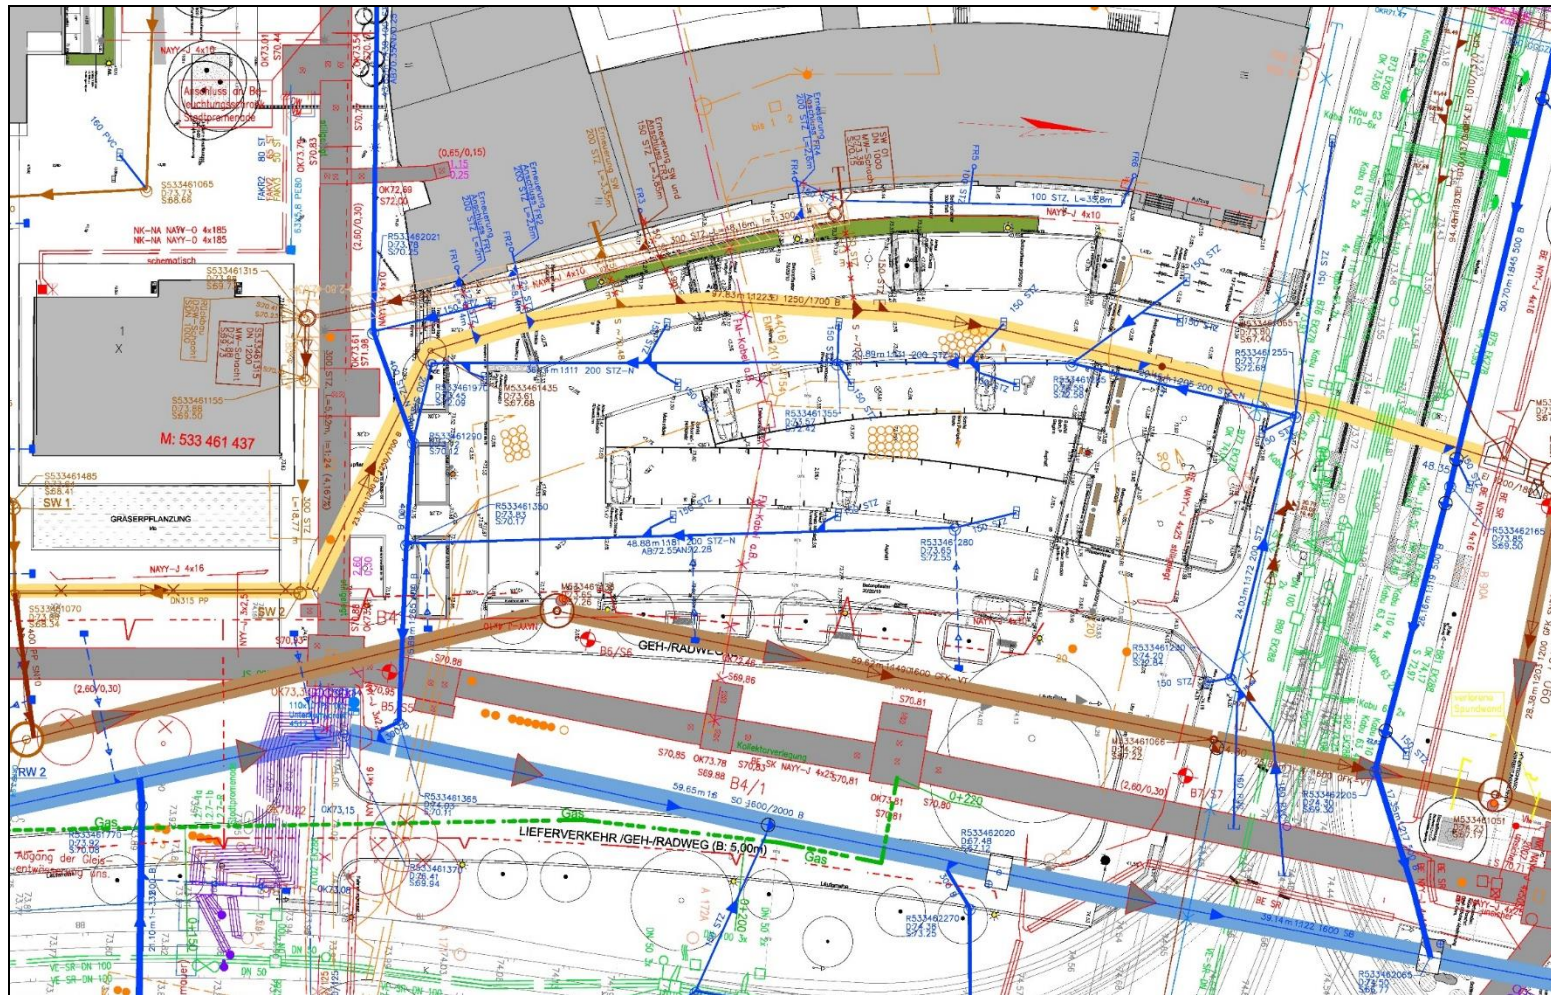

EVC verlegt Gasleitung



LWG Schmutzwasser — — ➔






Zeitplan

Stadt Cottbus Flaniermeile Stadtpromenade und Postparkplatz

NULL-ABLAUFPLAN


Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen												
					1. Qtl, 2017	2. Qtl, 2017	3. Qtl, 2017	4. Qtl, 2017	1. Qtl, 2018	2. Qtl, 2018	3. Qtl, 2018	4. Qtl, 2018	1. Qtl, 2019	2. Qtl, 2019	3. Qtl, 2019	4. Qtl, 2019
1	Baumfällungen/Ersatzpflanzung (sep.LV)	3 Wochen	Mo 19.02.18	Fr 09.03.18	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul
2	Bau Flaniermeile (1.BA) u. Postparkplatz	451 Tage	Mo 19.02.18	Sa 09.11.19												
3	Abräumung Oberflächen Flanierbereich	2 Wochen	Mo 16.04.18	Fr 27.04.18												
4	Gasleitung EVC verlegen und montieren	3 Wochen	Mo 14.05.18	Fr 01.06.18												
5	Regenwasserableitung	4 Wochen	Mo 04.06.18	Fr 29.06.18												
6	Beleuchtung herstellen	2 Wochen	Mo 02.07.18	Fr 13.07.18												
7	Plattenbeläge Zufahrtstraßen	12 Wochen	Mo 16.07.18	Fr 05.10.18												
8	Rasenflächen herstellen	3 Wochen	Mo 08.10.18	Fr 26.10.18												
9	Pflanzungen	4 Wochen	Mo 19.11.18	Fr 14.12.18												
10	Bau Postparkplatz	190 Tage	Mo 02.04.18	Fr 21.12.18												
11	Verlegung SW _Kanal LWG	10 Wochen	Mo 02.04.18	Fr 08.06.18												
12	Verlegung Regenwasser PPP	6 Wochen	Mo 11.06.18	Fr 20.07.18												
13	Beleuchtung herstellen	2 Wochen	Mo 23.07.18	Fr 03.08.18												
14	Verkehrsanlage PPP	13 Wochen	Mo 03.09.18	Fr 30.11.18												
15	Ausstattung Markierung PPP	2 Wochen	Mo 03.12.18	Fr 14.12.18												
16	Pflanzungen PPP	4 Wochen	Mo 17.12.18	Fr 11.01.19												

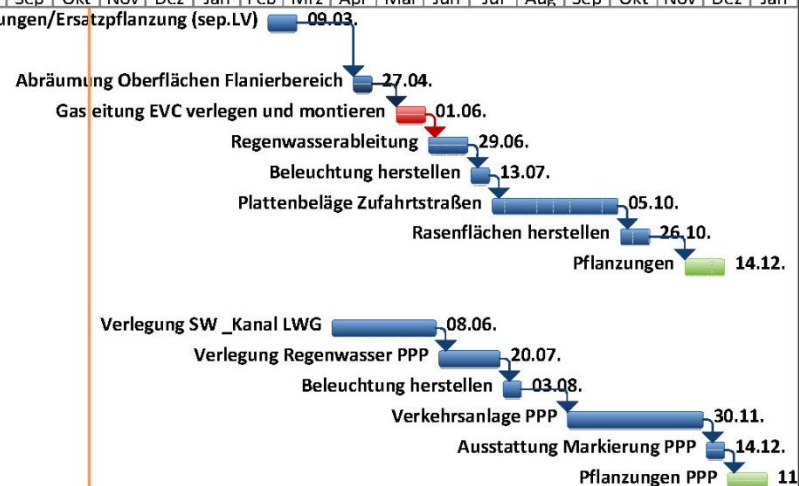

Mi 25.10.17



Neugestaltung der Flaniermeile / Erschließung EKZ Stadtpromenade / Stadt Cottbus

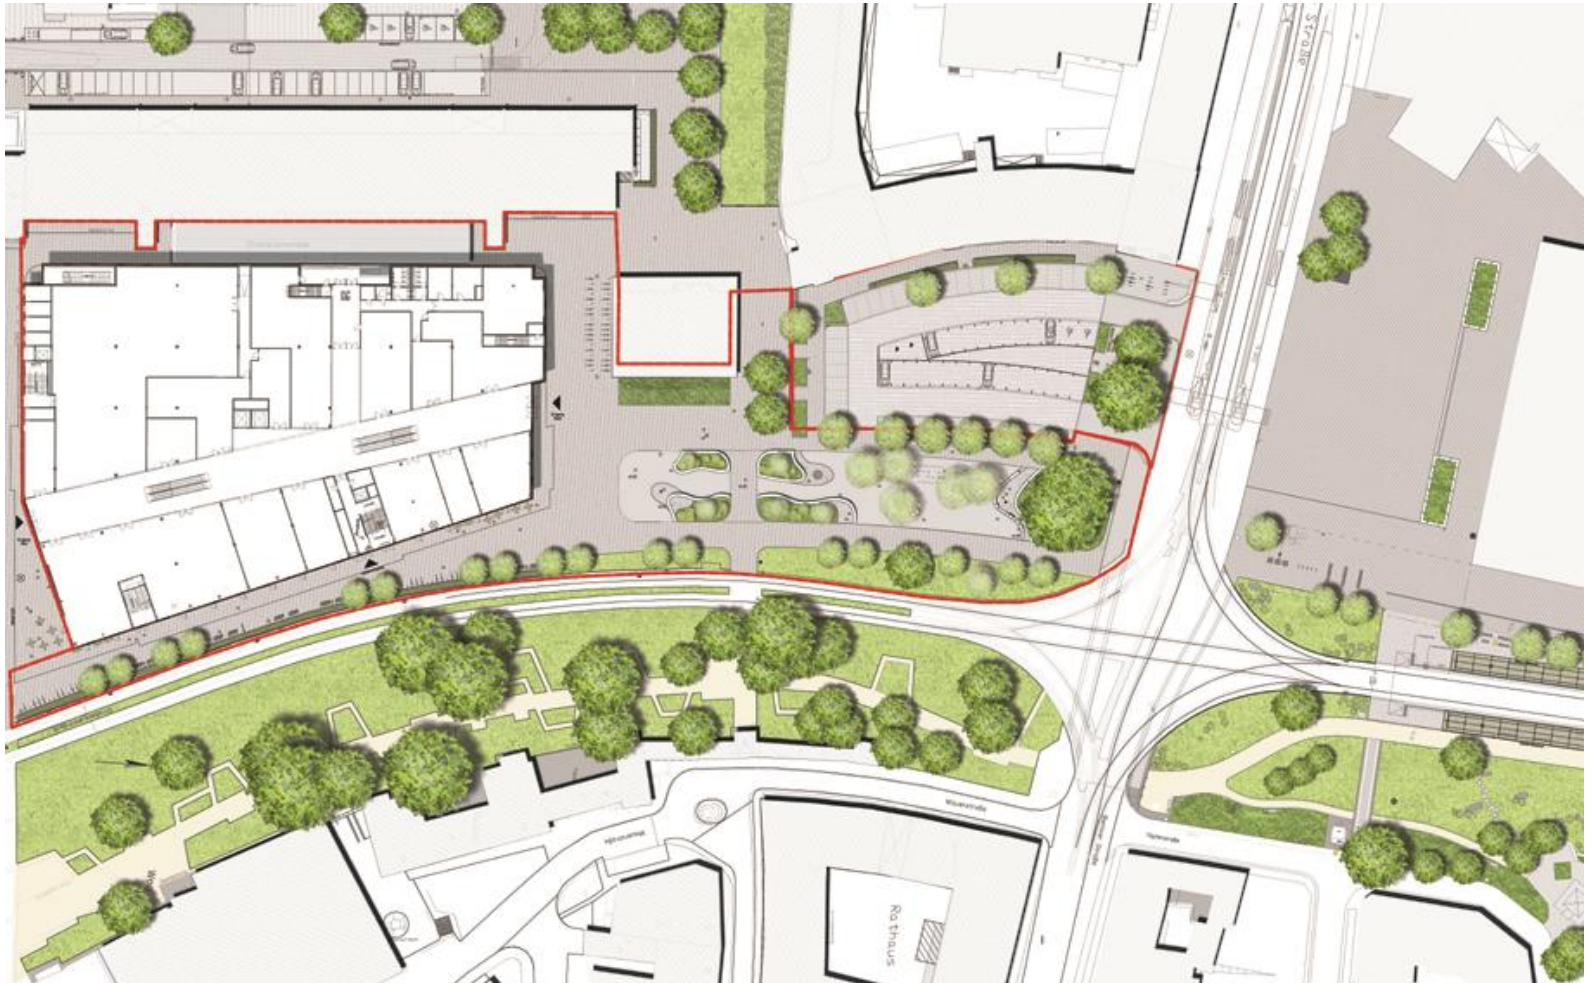

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit!
