

Ostseemanagement der Stadt Cottbus
Stefan Korb
Tel.: 0355/612-4120
E-Mail: info@cottbuser-ostsee.de

AECOM Deutschland GmbH
Calauer Str. 70
03048 Cottbus
Tel. 0355/75099901

13.05.2020






STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Projekt Cottbuser Ostsee

***Sachstand Mai
2020***

Aktueller Bearbeitungsstand Seeachse (mit Kunstprojekt)

- Angebote zur Radweg- und Freiraumplanung sind ausgewertet
- Zuschlagserteilung an **Bietergemeinschaft aus DEGAT /Altelier 8 / Nagler & Dieck** erfolgt
 - Überzeugte durch Leitidee „Adapter“ – „Konnektor“ – „Charakter“

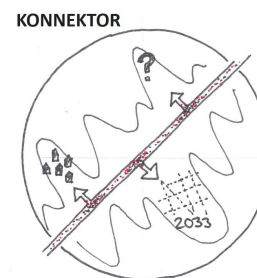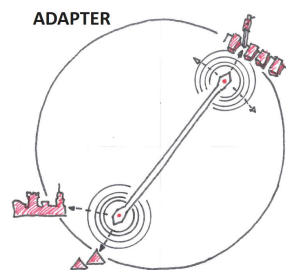

- **Anlaufbegehung** am 07.05.2020 bereits stattgefunden, in Bearbeitung
- Entwurfs- und Genehmigungsplanung bis 04/2021
- Nach baufachlicher Prüfung und Ausführungsplanung / Vergabe als Baubeginn 1. Teilabschnitt ca. 03/2022 avisiert

Aktueller Bearbeitungsstand **Kanallandschaft Seevorstadt**

- Vergabe im Dezember 2019 an gerstgraser Ingenieurbüro für Renaturierung
- erste Ergebnisse liegen nun vor und werden diskutiert

Wesentliche Erkenntnis: **Kanäle sind machbar!**

- Ausarbeitung von 3 Varianten mit Untervarianten
 - Anbindung an Hammergraben
 - Anbindung Seewärmepumpe HKW
 - Kombination aus beidem
- Kostenermittlung

Endfassung ca. Juli 2020 zu erwarten

Vorstellung Ergebnisse in der Sondersitzung des BVA (September 2020) im Detail

Aktueller Bearbeitungsstand Machbarkeitsstudie BUGA



- Zuschlag wurde an eine 6er-Bietergemeinschaft unter Leitung SINAI Berlin erteilt



SINAI GESELLSCHAFT VON LANDSCHAFTSARCHITEKTEN MBH



in Zusammenarbeit mit

Prof. Heinz Nagler

Gert Streidt

- Bietergemeinschaft mit Referenzen zu BUGA'en in Koblenz 2011, Havelland 2015, Heilbronn 2019, Mannheim 2023, Rostock 2025; ferner IGA Berlin 2017 u.w.
- Bearbeitungsbeginn Mitte Mai 2020
- Erste Abstimmung im Juni per Video/Telefonkonferenz / erstes Arbeitsgespräch nach Lockerung Corona-Regeln
- Bearbeitungszeitraum ca. 22 Monate (also bis ca. März 2022)

Aktueller Bearbeitungsstand

FBV – Vorbereitungsarbeiten



- Im Zuge FBV ist es erforderlich, das Begehren auf Zuordnung von Flurstücken für öffentlichen Bedarf zu untersetzen
- Dazu sind Planungen vorzubereiten (mindestens Vorplanung) und nachfolgend B-Pläne zu etablieren
- Für die Vorplanung Hauptstrand ist eine Aufgabenstellung in der Abstimmung, für weitere 4 Strände (Merzdorf, Willmersdorf, Südspitze, Bärenbrücker Bucht) in Erarbeitung
- Zielstellung: Vorplanungen Ende 2020 vorliegend (Finanzierung vorausgesetzt)

Aktueller Bearbeitungsstand Infomobil


- Projekt des Fördervereins Cottbuser Ostsee e.V.
- Mobil zur medialen Begleitung des Cottbuser Ostsees
- Auftakt abrufbar unter:

[https://youtu.be/sreFgs -JaQ](https://youtu.be/sreFgs-JaQ)

Ansehen lohnt.

20 Min Ausschnitt vorab:

Aktueller Bearbeitungsstand *Infomobil*



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

13.05.2020

*Stefan Korb
AECOM Deutschland GmbH
Ostseemanagement
T +49 355 6124120
E-Mail info@cottbuser-ostsee.de*

*M +49 179 9333744
F +49 355 75099901*
