

Sachstand Umbau Bahnhof Cottbus






STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Umbau Bahnhof Cottbus / Chóšebuz

Übersicht - Teilprojekte

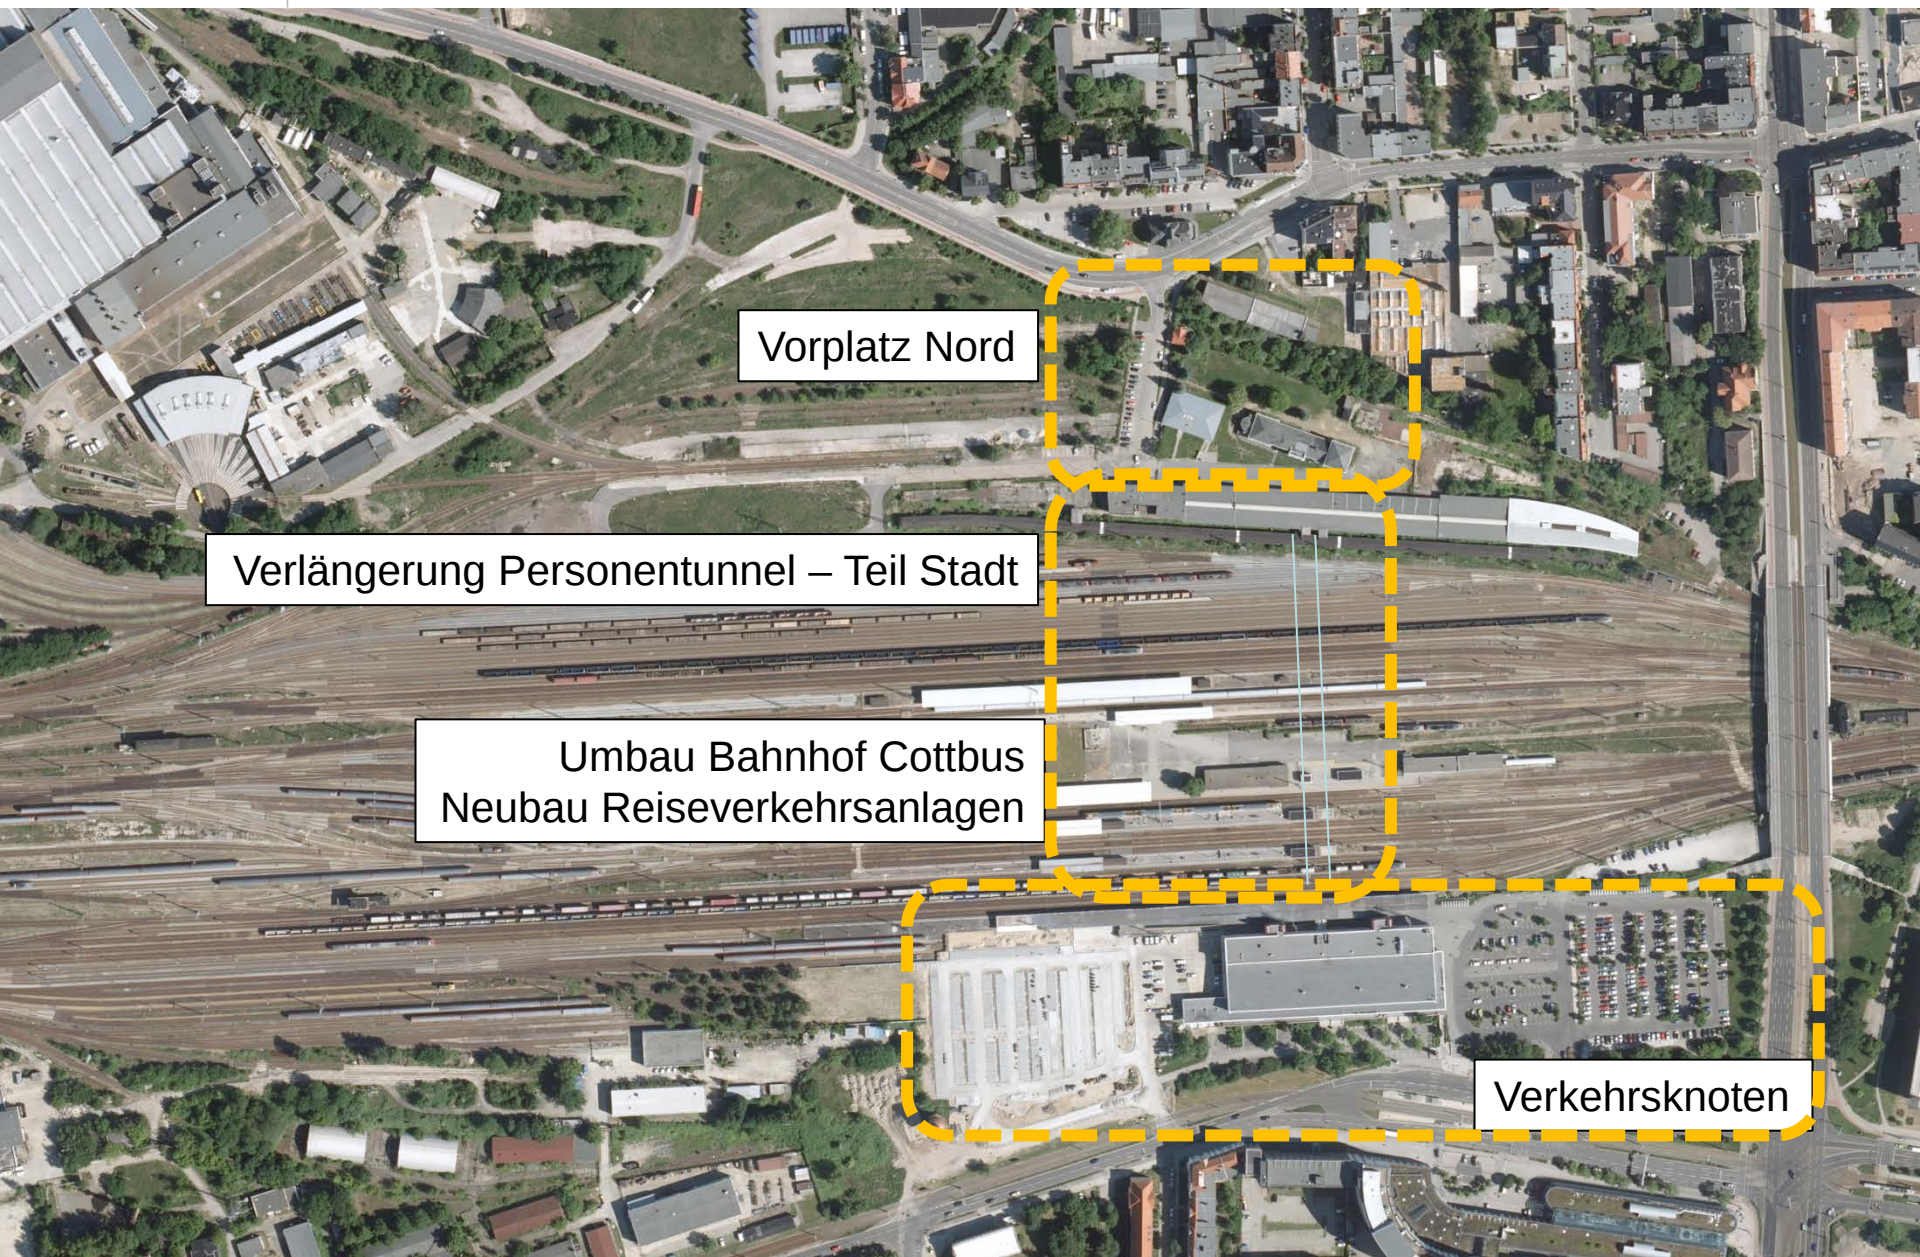

Vorplatz Nord

Verlängerung Personentunnel – Teil Stadt

Umbau Bahnhof Cottbus
Neubau Reiseverkehrsanlagen

Verkehrsknoten

Umbau Bahnhof Cottbus / Chóšebuz

Verkehrsknoten | Arbeitsstand

**HIER BAUT DIE STADT COTTBUS
HOW TWARI MĚSTO CHÓŠEBUZ**

**BAUHERREN:
TWARSKÉ KNĚZE:**



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ



Stadtverwaltung Cottbus
Postfach 101235
03012 Cottbus
Telefon: 0355 812-4015



Cottbusverkehr GmbH
Hilfiker-Rathenau-Str. 38
03044 Cottbus
Telefon: 0355 866-20



Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG
Berliner Str. 2021
03046 Cottbus
Telefon: 0355 3500

**VORHABEN:
PŠEDEWZEŠE:**

Klimagerechtes Mobilitätsverkehrszentrum Cottbus
Klimapřawý mobilitny wobchadny centrum Chóšebuza
Verkehrsknoten Hauptbahnhof (Ostseite)
Wobchadowe kšicnišćo gławne dwornišćo (pódzajtšny bok)

**FINANZIERUNG:
FINANCĖROWANJE:**



Diese Baumaßnahme wird finanziert mit:

- Fördermitteln des Bundes und des Landes Brandenburg aus dem Programm für "Investitionen für den Öffentlichen Personennahverkehr im Land Brandenburg" (mit Finanzierungshilfen aus dem Entflechtungsgesetz).
- Fördermitteln des Bundes und des Landes Brandenburg aus dem Städtebauförderungsprogramm "Stadtumbau - Ost, Teilprogramm Aufwertung" sowie
- Eigenmitteln der Stadt Cottbus, der Cottbusverkehr GmbH und LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG.

**ENTWURF:
NACERJENJE:**

Dorsch Gruppe
BDC

ARGE
Bahnhofsumfeld Cottbus

Henry Ripke
Architekten

**AUSFÜHRUNG:
WUGBAŠE:**

ARGE Cottbus - Bahnhofsvorplatz



Baubeginn 01.09.2016

Umbau Bahnhof Cottbus / Chóšebuz

Verkehrsknoten | Bauvorbereitende Maßnahmen – September 2016



Busabstellfläche/-wendeschleife – Vetschauer Str. am P+R Parkplatz



Ersatzhaltestellen Bus – Vetschauer Str.



Ersatzstandort Fahrradabstellanlage – südlich Bahnhof

Umbau Bahnhof Cottbus / Chóšebuz

Verkehrsknoten | Kampfmitteluntersuchung - April 2016 – Januar 2017



Sondierung Langzeitparkplatz

- 19 Anomalien geöffnet
- keine Funde

Sondierung Kurzzeitparkplatz

- 19 Anomalien geöffnet
- keine Funde

- Kampfmittelfreigabe für Baufeld liegt vor

Umbau Bahnhof Cottbus / Chóšebuz

Verkehrsknoten | Errichtung Staukanal – Oktober- Dezember 2016



Errichtung Staukanal



Zukünftige Geländehöhe

Umbau Bahnhof Cottbus / Chóšebuz

Verkehrsknoten | Unterbrechung Jahreswechsel / Winter



Unterbrechung Winter – 22.12.2016 – 27.2.2017

Umbau Bahnhof Cottbus / Chóšebuz

Verkehrsknoten | Aktuell - Erdbauarbeiten – März/April 2017



◀ **Erdbau Gleistrasse**



Erdbau Kurzzeitparkplatz ▶




STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Umbau Bahnhof Cottbus / Chóšebuz

Verkehrsknoten | Ausblick 2017

ab 02. Juli 2017 Bauphase 1.2 – Einbau Weiche Stadtring

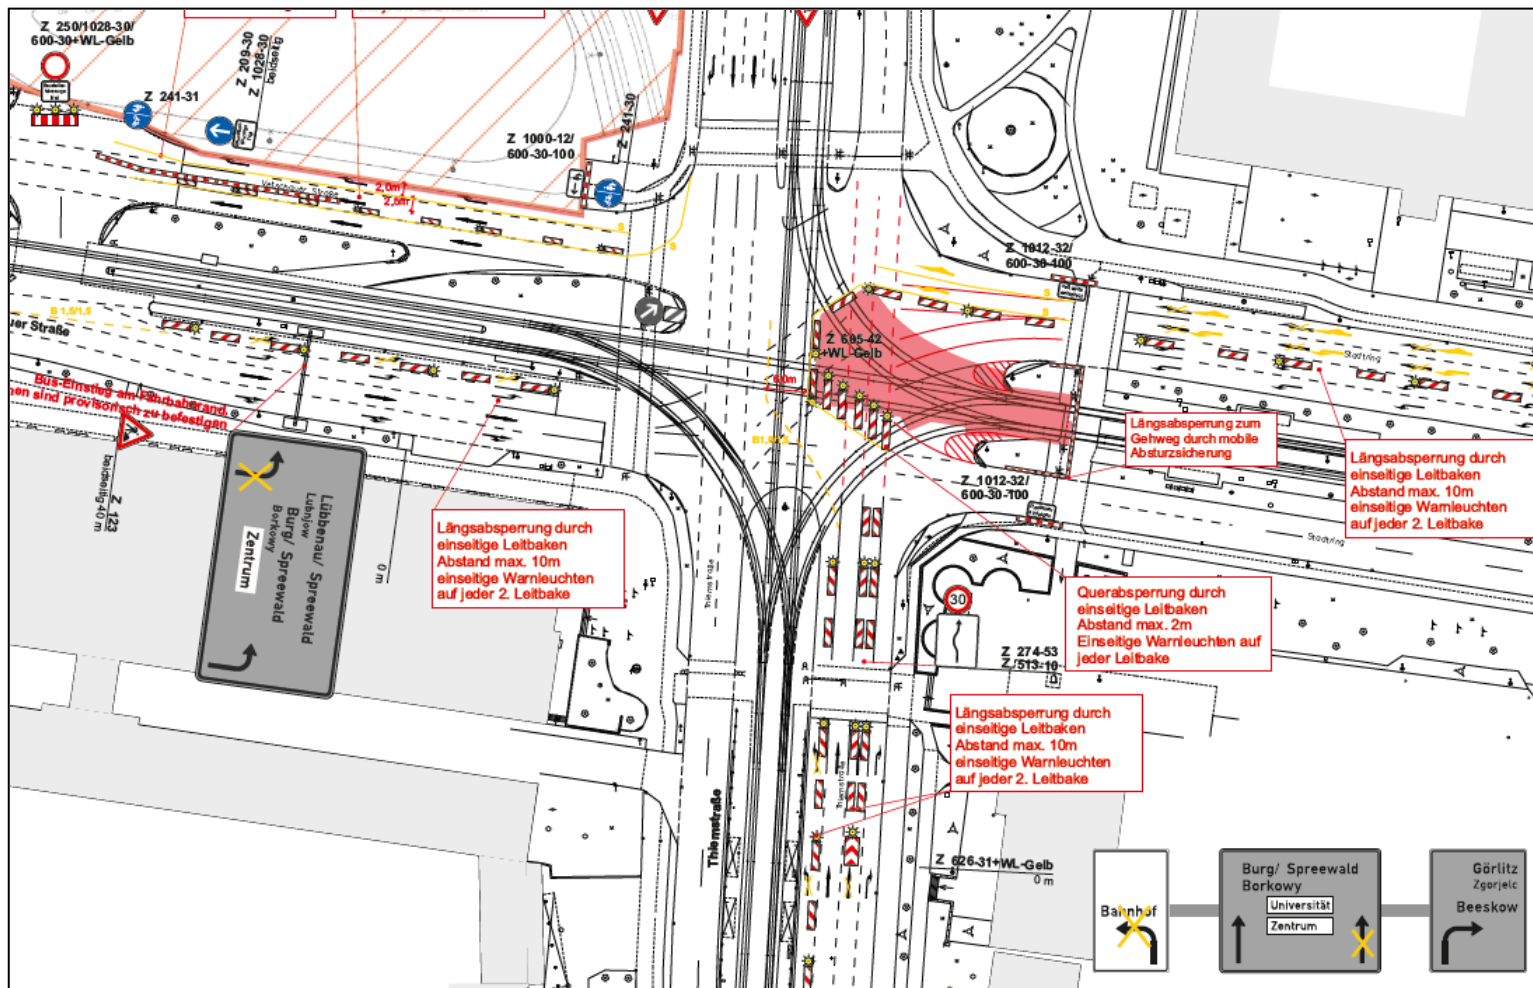




STADT COTTBUS
CHÓSEBUS

Umbau Bahnhof Cottbus / Chósebus

Verkehrsknoten | Ausblick 2017

ab September 2017 Beginn Bauphase 2.1 – Anbindung Vetschauer Str./Bahnhofstraße

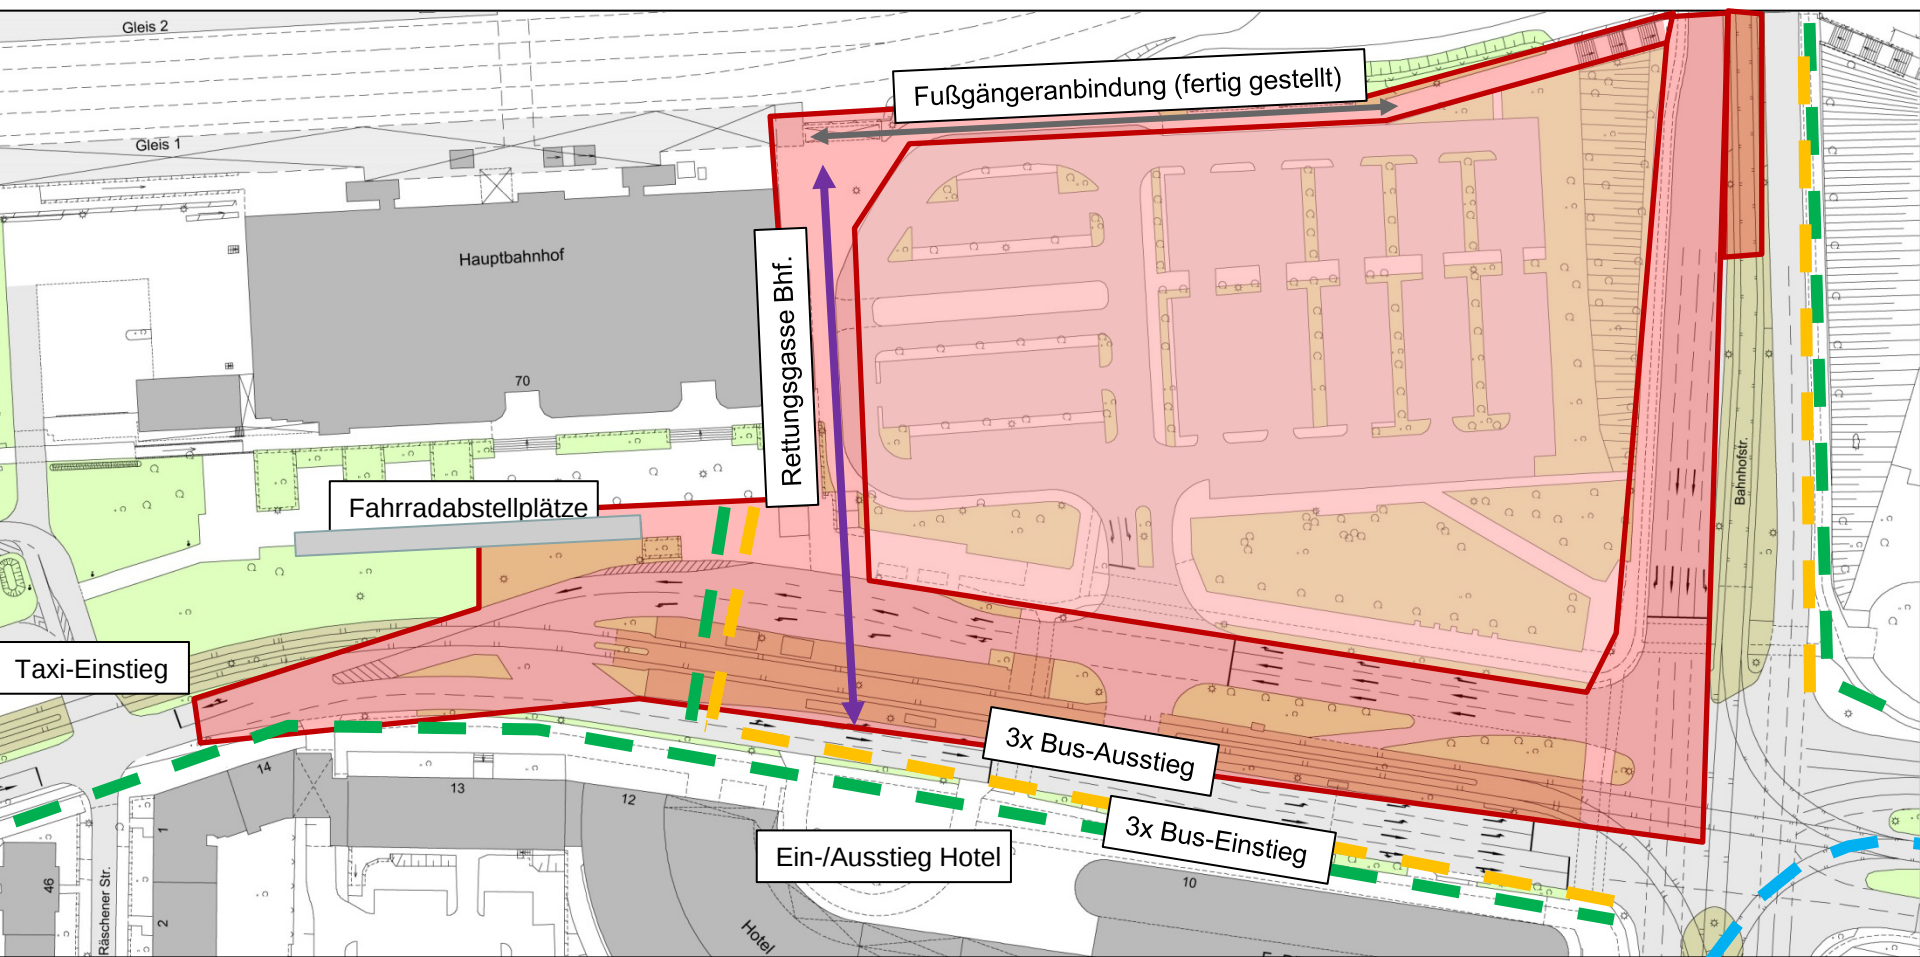

Fußverkehr 

Radverkehr 

Straßenbahn 



STADT COTTBUS
CHÓSEBÚZ

Verlängerung Personentunnel – Teil Stadt 2016 - 2018



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Umbau Bahnhof Cottbus / Chóšebuz

Personentunnel | Arbeitsstand




Feierliche Baustelleneröffnung am 08.04.2016



Umbau Bahnhof Cottbus / Chóšebuz

Personentunnel | Arbeitsstand

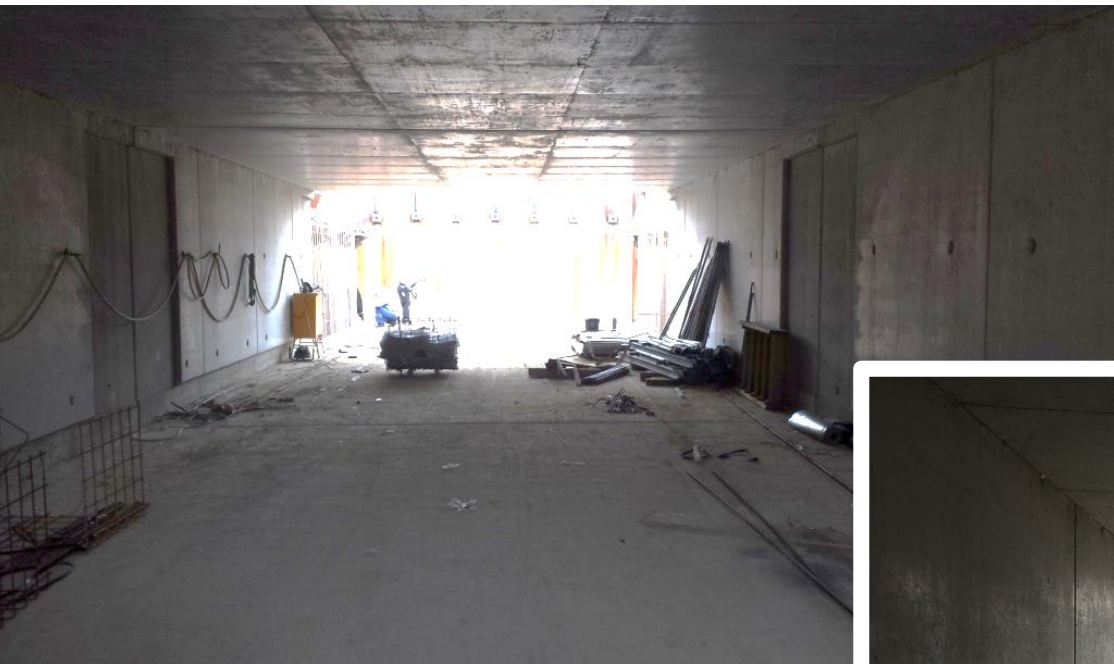

▶ **1. Bauabschnitt** fristgerecht
im September 2016 abgeschlossen



2. Bauabschnitt fristgerecht zum
Jahresende 2016 abgeschlossen



Umbau Bahnhof Cottbus / Chóšebuz

Personentunnel | Arbeitsstand und Ausblick



- Fertigstellung Zugangsbauwerk bis 08/2017
- derzeit Betonarbeiten Treppenwange




- aktuell **3. Bauabschnitt** bis 06.06.2017
→ derzeit Decke (Betonarbeiten)
und Wände in Vorbereitung (Bewährung)
- **Zusammenschluss der Tunnelabschnitte
Stadt und DB AG am Bahnsteig 9/10
(Gleis 21) am 06.03.2017 erfolgt**



Umbau Bahnhof Cottbus / Chóšebuz

Personentunnel | Bauabschnitte - Übersicht

→ Maßnahme im Zeit- und Kostenrahmen

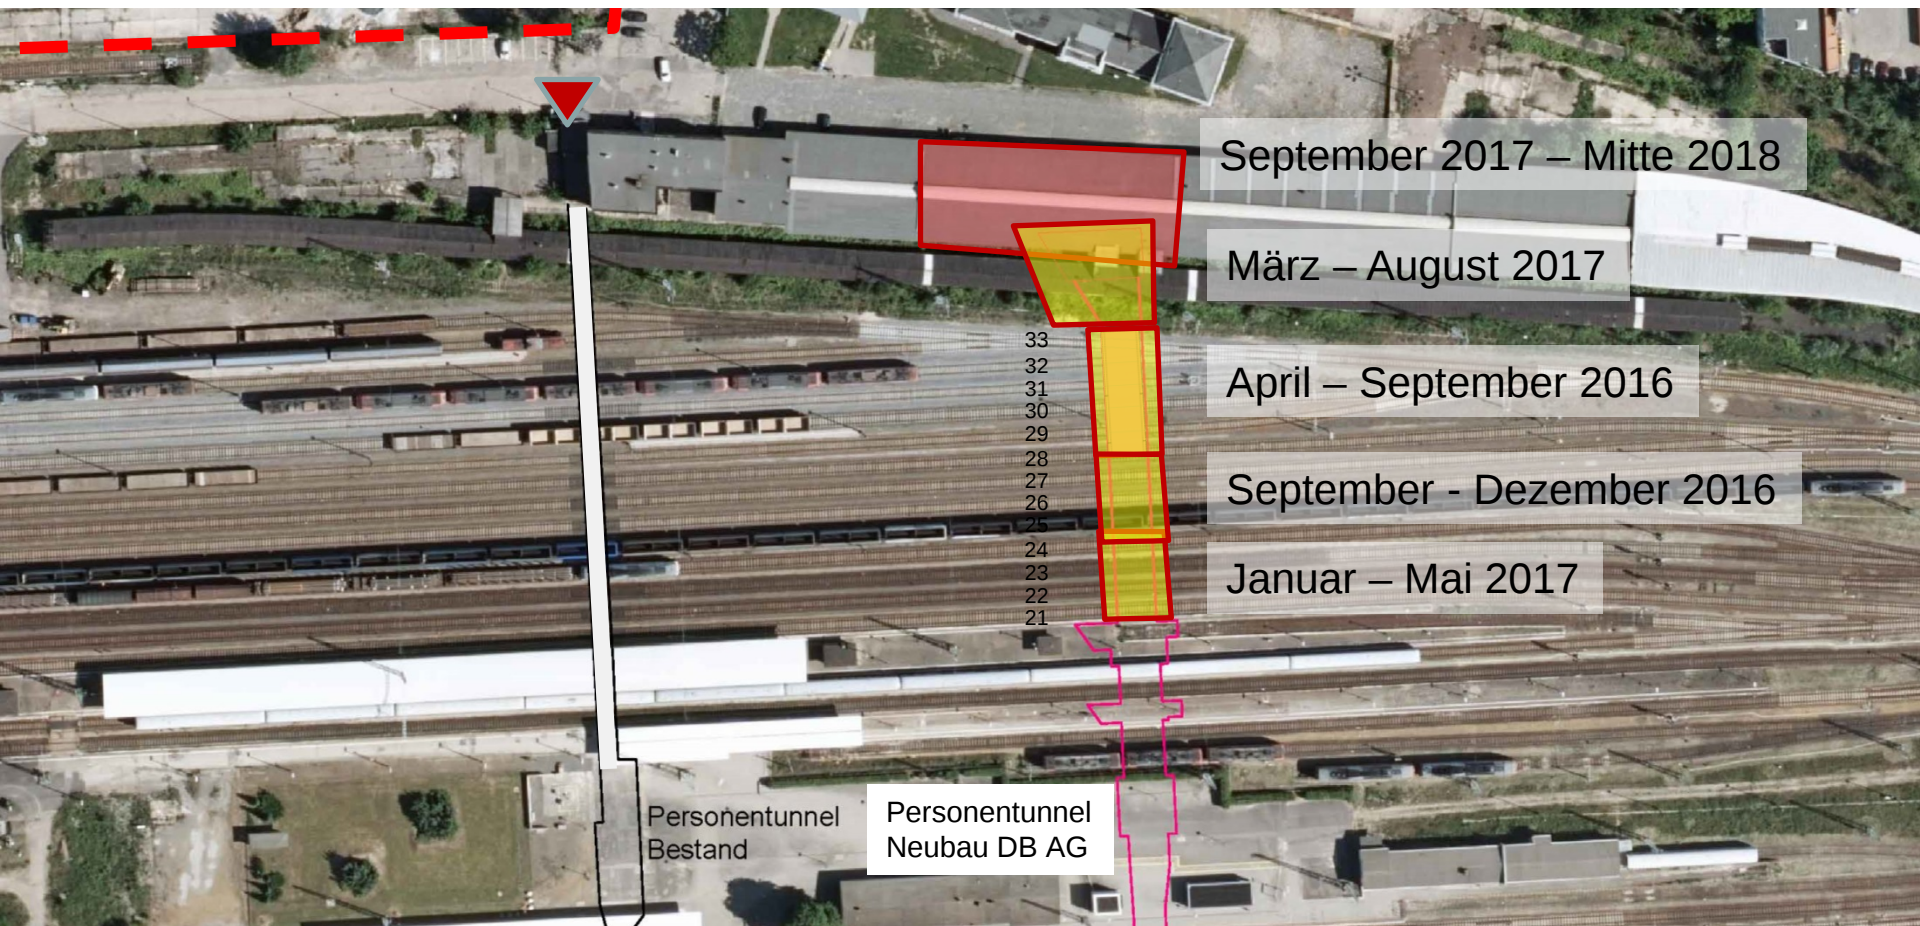

2016				2017				2018			
1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl	1. Qtl	2. Qtl	3. Qtl	4. Qtl

Wohnen, Dienstleistung, Gewerbe

neuer Stadtwall

Wohnen

Kultur, Freizeit, Sport, Veranstaltungsplatz

neuer Stadtwall

Gewerbe, Wohnen (gemischte Baufläche)

Vorplatz

Fahrradabstellanlage, Fahrradservice

Bebauungsvorschlag Viehmarkt

Typologie Etagenwohnung

Typologie Reihenhäuser

Typologie Stadtvillen

Stadtwall/ Radwegenetz

Sport-, Freizeit- Erholungsflächen

Kultur, Veranstaltungsplatz


verkehrliche Infrastruktur Nordausgang Personentunnel (P+R Parkplatz und Fahrradstation)



STADT COTTBUS
CHÓSEBUZ

Umbau Bahnhof Cottbus / Chósebuz

Nördliches Bahnumfeld | Vorplatz Nord – 1. BA

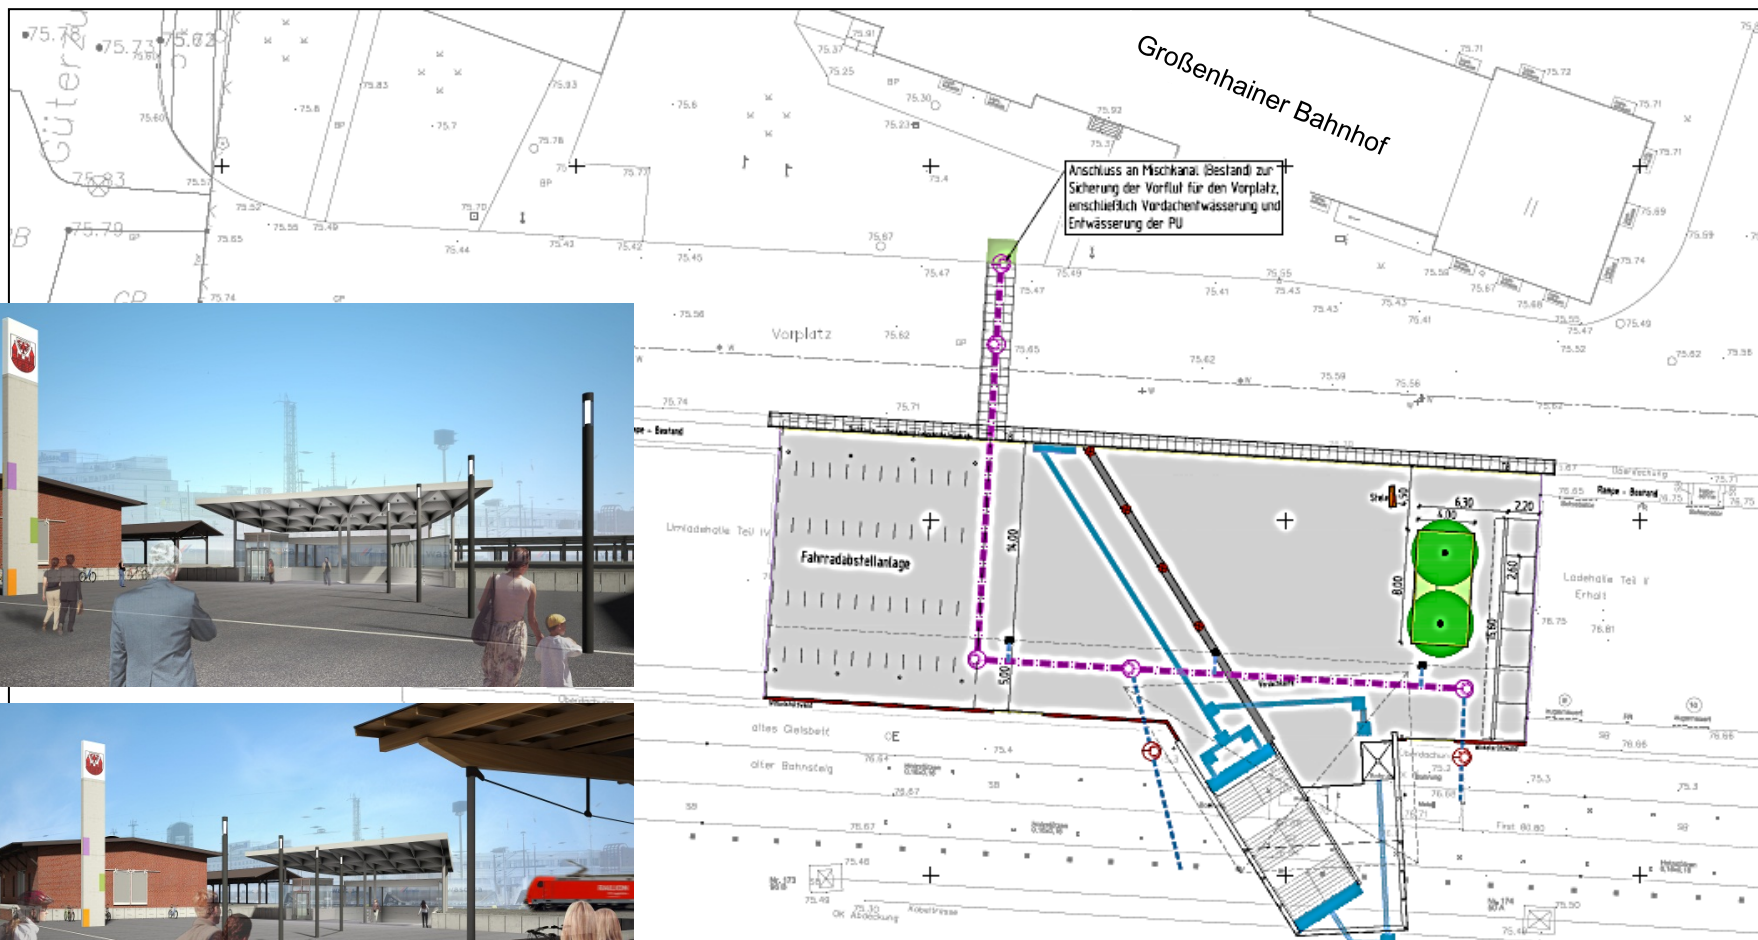

Tunnelausgang – Vorplatz Nord 1.BA

Vorplatz (Stand 02/2017)	380 T€
Finanzierung	StuA
Realisierung	09/2017 - 05/2018

Umbau Bahnhof Cottbus / Chóšebuz

Bahnhof NORD | Zeit- und Maßnahmekonzept

	Teil DB Umbau Bahnhof	Verlängerung PU inkl. ZGBW	1.BA Vorplatz NORD	2.BA Güterzufuhrstr. Ladestraße	
Planung	abgeschlossen	abgeschlossen	bis 06/2017	bis 12/2017	
Ausschreibung/ Vergabe	abgeschlossen	abgeschlossen	06 - 08/ 2017	01 – 03/2018	
Grunderwerb			bis 09/2017	bis 09/2017	
Realisierung	ab 12/2015	ab 04/2016	ab 09/2017	ab 06/2018	
2016	Mittelbauwerk	1.BA & 2.BA			
1. HJ 2017	Bhstg. 9/10	3. BA PU			
2. HJ 2017	Bhstg 7/8	04 - 08/2017 ZGBW	ab 09/2017 bis 05/2018		
1. HJ 2018	Ausbau Rohbau 01 – 04/2018				
Öffnung PU	05/2018	05/2018	05/2018		
1. HJ 2018	Bhstg. 2/3				
2. HJ 2018	Bhstg. 4/5			06 -12/2018	
1. HJ 2019	Bhstg. 6				
2. HJ 2019	Bhstg. 1				
Bauende	2020	08/2017	05/2018	12/2018	
