



Umsetzung DigitalPakt an Cottbuser Schulen

Zeitplan der Antragstellung (Teilprojekte 1 bis 4)



- ▶ Fertigstellung der päd. MEPs durch die Schulen (22 von 25 liegen bisher vor)
- ▶ Abgleich und gemeinsamer Austausch der Daten in den Antragsunterlagen zwischen Schule und Schulträger
- ▶ Bestätigung der päd. MEPs durch das Staatliche Schulamt
- ▶ Ausschreibung für die Planungsleistung
- ▶ Beginn der baufachl. Planung für die konkreten Bauvorhaben (geplanter Abschluss der Planung Ende 2. Q. 2020)
- ▶ geplanter Zeitpunkt für die Fördermittelantragstellung durch den Schulträger sowie geplante Ausschreibung der Bauleistungen (2. Quartal 2020)
- ▶ Geplante Bewilligung der ersten Fördermittelbescheide (3. Quartal 2020)



Umsetzung DigitalPakt an Cottbuser Schulen


Zeitplan der Antragstellung (Teilprojekte 1 bis 5)

Legende:

Abgeschlossen

Im Zeitplan/ oder Verzug ohne Risiko

Verzug mit Risiko

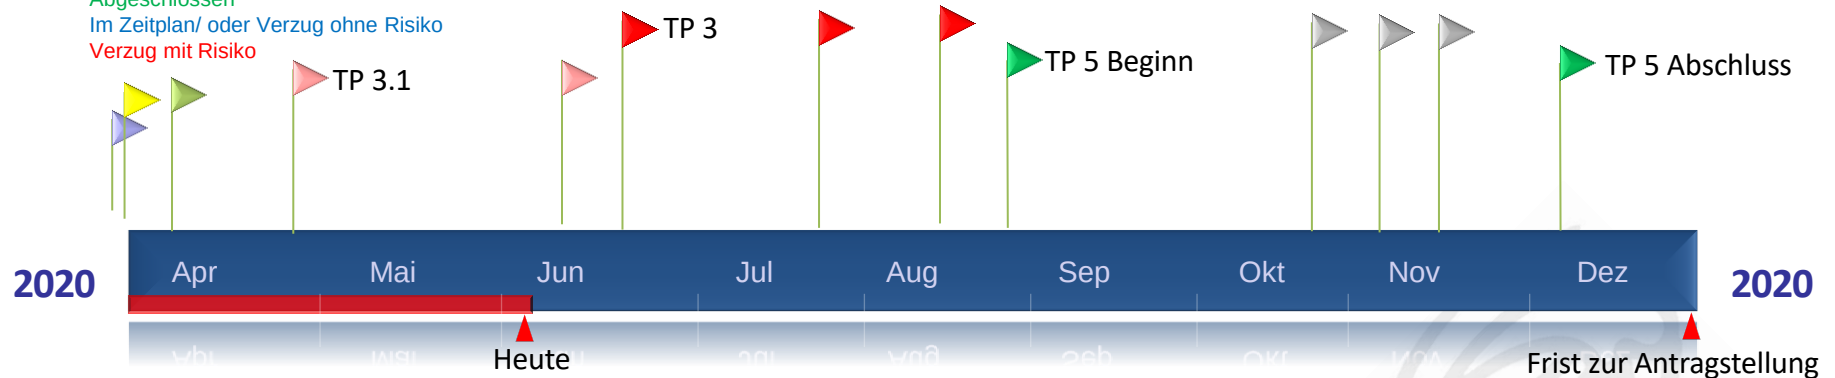


- ▶ TP 1: Fertigstellung der päd. MEPs durch die Schulen (abgeschlossen)
- ▶ TP 2: Abgleich und gemeinsamer Austausch der Daten in den Antragsunterlagen zwischen Schule und Schulträger (abgeschlossen)
- ▶ TP 3.1: Bestätigung der päd. MEPs durch das Staatliche Schulamt (18 von 25 liegen bisher vor)
- ▶ TP 3: geplanter Zeitpunkt für die Fördermittelantragstellung durch den Schulträger
- ▶ TP 4: Ausschreibung der Planungsleistung (Anfang April 20 abgeschlossen statt geplant Februar 20)
- ▶ TP 5: baufachl. Planung für die konkreten Bauvorhaben (August 20 statt geplant Juni 20)
- ▶ Geplante Bewilligung der Fördermittel (3.- 4. Quartal 2020)



Umsetzung DigitalPakt an Cottbuser Schulen

Ausblick (weitere Teilprojekte)

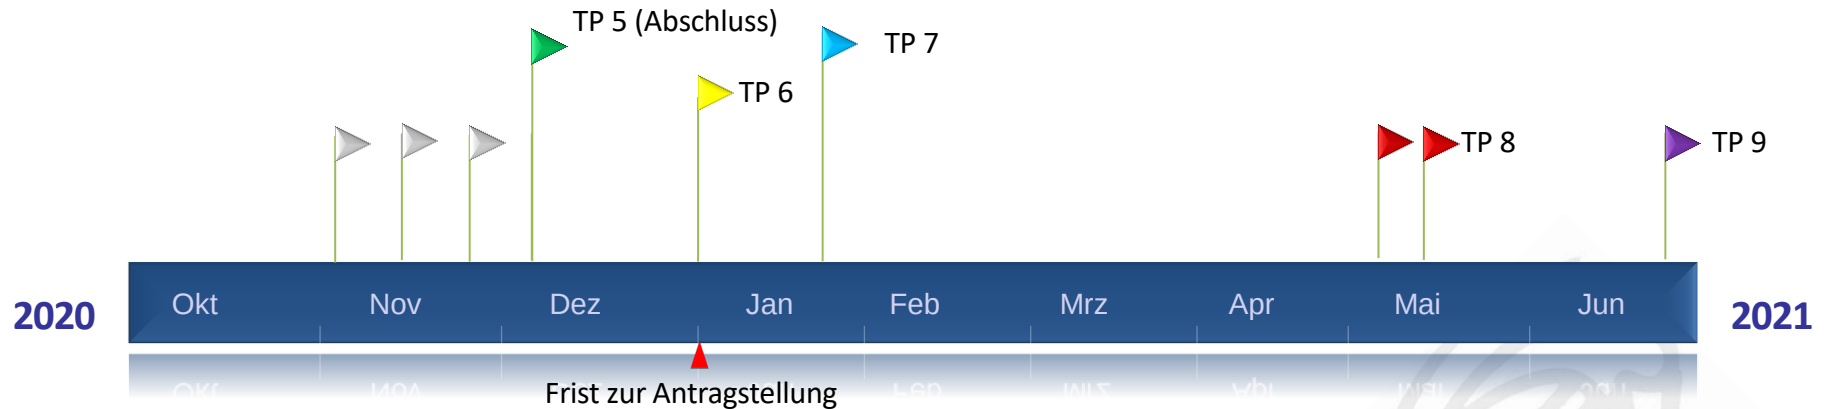

- ▶ Geplante Bewilligung der Fördermittel per Zuwendungsbescheid
- ▶ TP 5: Abschluss der Bauplanung zur Umsetzung DigitalPakt
- ▶ TP 6: Entscheidung der Reihenfolge der Schulen zur baulichen und ausstattungstechn. Umsetzung des DigitalPakts (u.a. abhängig von: Umfang der Baumaßnahmen, Verfügbarkeit der Baufirmen in Abhängigkeit des Schulbetriebs, Verfügbarkeit von digitalen Ausstattungsgegenständen etc)
- ▶ TP 7: Ausschreibung der Bauleistungen
- ▶ TP 8: ggf. Änderungsantragstellung gegenüber der ILB bei Veränderungen des Finanzbedarfs, da innerhalb der Fördermittelbudgets aller 25 Schulen umgeschichtet werden muss (Abrufen der Mittel)
- ▶ TP 9: Beginn der baulichen Umrüstungen überwiegend ab den Sommerferien 2021



Umsetzung DigitalPakt an Cottbuser Schulen

Zielstellung des DigitalPakts ist die Vereinheitlichung der IT-Landschaft an Schulen auf gutem Niveau

- Einbettung von Fördermitteln (u.a. **DigitalPakt**) in die qualitative Verbesserung der IT-Landschaft an Cottbuser Schulen

techn. Medienentwicklungsplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz für Schulen 2020 – 2030

LAN/ WLAN

Anzeigetechnik

(mobile) Endgeräte

Software

Druckumgebung

Schulserver

Dafür reichen die Mittel des DigitalPakt i.H.v. 5,5 Mio. Euro

Notwendige bauliche und technische Herstellung an Schulen kostet ca. 5,5 Mio. Euro

Sofortausstattungsprogramm??



Umsetzung DigitalPakt an Cottbuser Schulen

Zielstellung des DigitalPakts ist die Vereinheitlichung der IT-Landschaft an Schulen auf gutem Niveau

- Einbettung von Fördermitteln (u.a. **DigitalPakt**) in die qualitative Verbesserung der IT-Landschaft an Cottbuser Schulen

techn. Medienentwicklungsplan der Stadt Cottbus/Chóśebuz für Schulen 2020 – 2030

LAN/ WLAN

Anzeigetechnik

(mobile) Endgeräte

Software

Druckumgebung

Schulserver

Dafür reichen die Mittel des DigitalPakt i.H.v. 5,5 Mio. Euro

Sofortausstattungsprogramm??

An allen Schulen wird der notwendige bauliche Investitionsbedarf getätigt (im Durchschnitt ca. 200.000 Euro)

An allen Schulen wird der notwendige technische Investitionsbedarf getätigt (im Durchschnitt ca. 20.000 Euro)
