



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Informationen zur Haushaltsplanung 2016 – 2019 zur Diskussion in den Fachausschüssen

Bauprojekte / Maßnahmen FB Immobilien

Schwerpunkt Investitionshaushalt

Fachbereichsleiterin Anja Zimmermann
Ausschuss für Wirtschaft, Bau und Verkehr am 02.12.2015



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Kurze Erläuterung zum Einstieg:

Die Baumaßnahmen des FB Immobilien finden sich in der HH-Darstellung in den **Geschäftsbereichen II, III und IV** wieder, da der FB Immobilien als „Dienstleister“ für die anderen Geschäftsbereiche (inkl. der Eigenbetriebe) baulich tätig ist!



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

1. Geplante Bauprojekte für den GB II

(S. 7 im Investitionsplan)

Neue Maßnahme:

Feuerwehr – Gerätehaus Süd → 30,0 T€ im HH-Jahr 2019

Kosten für Planungsleistungen → Entscheidung zur Maßnahme im Zusammenhang der Fortschreibung des Gefahrenabwehrplanes der Stadt Cottbus → Folgekosten für eine Hochbaumaßnahme sind noch nicht dargestellt

Zur Klarstellung:

Das Projekt „Freiwillige Feuerwehr Gallinchen“ wird nicht, wie in den vergangenen Jahren avisiert, ab 2016 zur Umsetzung gebracht!



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

2. Geplante Bauprojekte für den GB III

(S. 7/8 im Investitionsplan)

1. Bereich Schule und Sport

- **Schulen – Medienentwicklung Bau** → 30,0 T€ je Jahresscheibe
Die Medienentwicklung umfasst die erforderlichen Bauleistungen zur Umsetzung moderner leistungsstarker Netzwerke in den Cottbuser Schulstandorten. Konkrete Planung für 2016: z.B. 13,8 T€ zur Erweiterung des Netzwerkes für die Sachsendorfer Oberschule
- **Schulen – Spielgeräte** → 20,0 T€ je Jahresscheibe
Ersatz- und/oder Neubeschaffung von Spielgeräten für alle kommunalen Schulstandorte
- **Komplexe Bauprojekte** → *separate Folien*



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Fortsetzungsmaßnahme: Fröbel Grundschule

Inhalt: Energetische Sanierung von Schule und Turnhalle inkl. Außenanlagen und Ausstattung



Kosten: 6.787.000 € gesamt, davon im HH-Plan 2016-2019:

1.058,0 T€ in 2016 → Deckung soll zu 90 % aus dem Kommunalinvestitionsfördergesetz beantragt werden, der EM-Anteil 10 % wird beim Land zur Finanzierung beantragt

Zeitablauf:	1. Projektvorbereitung:	Juni 11 - Aug.13
	2. Planung (analog HOAI - LP1-4):	Sept. 13 - April 14
	3. Ausführungsvorbereitung (LP5-7):	Nov. 13 - Mai. 15
	4. Ausführung (LP8):	Feb. 14 - Febr. 16 (Turnhalle bereits seit Anfang 2015 in Nutzung)
	5. Projektabschluss (LP9): →	Febr. 2020

Planung: Vergabe im EU-weiten VOF- Verfahren: 1 Bietergemeinschaft zzgl. 3 weitere Ingenieurbüros

Realisierung: nationale, kleinteilige, gewerkweise Vergabe der Bauleistungen (VOB) in ca. 60 Baulosen → davon alle vergeben.



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Fortsetzungsmaßnahme: Ludwig-Leichhardt-Gymnasium – 3. BA

Inhalt: Energetische Sanierung des Haus B sowie
Teilbereiche der Außenanlagen unter Schulbetrieb

Bisherige Bauabschnitte:

- | | | |
|-------|---|---------------------|
| 1. BA | Zwischenbau (ZWB) – 1.OG | Juni 14 - August 14 |
| 2. BA | ZWB – EG und Aulaunterbau | Juli 14 – Januar 15 |
| 3. BA | Haus B + Küche Keller Haus A
+ Teilbereiche Außenanlagen | Mai 15 – August 16 |

Problem: 4. BA Haus A + Freianlagen
(ca. 3.000,0 Mio. €) derzeit erst ab 2018 im
Förderprogr. STUIA darstellbar

Kosten: 8.876.000 € gesamt zzgl. Ausstattung 506,7 T€
Ausstattung, davon im HH-Plan 2016-2019:
2.488,9 T€ in 2016-2017 (zur Fertigstellung 3. BA)
→ Deckung 90% aus KInvFG u. 10% Landesmittel geplant

Zeitablauf:

1. Projektvorbereitung:	Juli. 11 - Juni.13
2. Planung (analog HOAI - LP1-4):	Juli. 13 - 1. Quartal 16
3. Ausführungsvorbereitung (LP 5-7):	Jan. 14 – 1. Quartal 17
4. Ausführung (LP 8) für 3. BA:	→ Mai 15 – III. Quartal 16
5. Projektabschluss (LP9) für 3.BA	2020

Planung: EU-weite Planungsvergaben: 1 Generalplaner + 5 weitere Ing.-Büros

Realisierung: nationale, kleinteilige, gewerkweise Vergabe der Bauleistungen (VOB) in
ca. 38 Baulosen (3.BA) → davon bisher 24 Baulose vergeben.





STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Fortsetzungsmaßnahme: Regine-Hildebrandt-Europaschule

Inhalt: Komplettsanierung des Schulhaus A inkl. anteilige Außenanlagen und Ausstattung



Kosten: 5.071.617 € gesamt, davon im HH-Plan 2016-2019:

Mischfinanzierung aus Städtebaufördermitteln Teilprogramm RSI und Aufwertung und KInvFG

davon 2016-2019:

RSI: 2.852,0 T€, davon FM 80 %

Aufwertung: 588,0 T€, davon FM 66,6 %

KInvFG: 627,7 T€, davon 90 % Bundesmittel / 10 % Antrag Landesmittel geplant

Zeitablauf:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Projektvorbereitung (VOF): | September 14 - Januar 15 |
| 2. Planung (analog HOAI - LP1-4): | Januar 15 - II. Quartal 15 |
| 3. Ausführungsvorbereitung (LP5-7): | ab II. Quartal 15 |
| 4. Ausführung (LP8): | 2015 / 2016 |
| 5. Projektabschluss (LP9): | bis 2020 |



Planung: EU-weite Planungsvergaben → teilweise erfolgt: 1 Generalplaner (Architekturbüro) + 3 Ingenieurbüros ; 3 weitere geplant

Realisierung: nationale, kleinteilige, gewerkweise Vergabe der Bauleistungen in ca. 35 Baulosen → davon bisher 12 Baulose vergeben.



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Baubeginn Komplettisanierung: Astrid-Lindgren- Grundschule

Inhalt: Komplettisanierung des in den 1970er Jahren erbauten Schulgebäudes sowie Ersatzneubau der Turnhalle inkl. Gestaltung der Freianlagen und Ausstattung



Kosten: 7.349.000 € gesamt, davon im HH-Plan 2016-2019:

6.850,3 T€ in 2016-2018 → → Deckung 90% aus KInvFG u. 10% Landesmittel geplant

Zeitablauf:

1. Projektvorbereitung	Juli 12 - Aug.14
2. Planung (analog HOAI – LP 1-2):	Jan. 15 - Sep. 15
3. Planung (analog HOAI – LP 3-4): →	August 15 – abhängig von Finanzierung (Schule / Außenanlagen)
4. Ausführungsvorbereitung (LP 5-7): →	März 15 – abhängig von Finanzierung (Turnhalle)
5. Ausführung (LP 8):	geplant III. Quartal 2016 (Turnhalle) / 2017 (Schule) – abh. Ferien / Finanzierung
6. Projektabschluss (LP 9):	

Planung: Schulgebäude EU-weite Planungsvergaben → teilweise erfolgt: 1 beauftragter Generalplaner + 5 weitere geplant
Turnhalle: nationale Planungsvergaben → teilweise erfolgt: 8 beauftragte Architektur- u. Ingenieurbüros + 4 weitere geplant

Realisierung: nationale, kleinteilige, gewerkweise Vergabe der Bauleistungen (VOB) in ca. 65 Baulosen → noch keine Vergabe erfolgt



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Fortsetzungsmaßnahme: Sportfunktionsgebäude Branitz

Inhalt: Modernisierung der in den 1980er Jahren errichteten Sanitären Anlagen; Teilumbau + Erweiterungsbau



Kosten: 256.400 € **gesamt, davon im HH-Plan 2016-2019:**

2,0 T€ für Verwaltungskostenerstattung; Baukosten (100 % EM) aus HH-Jahren 2014/2015

Zeitablauf:	1. Projektvorbereitung	Juli 14 - Okt. 14
(Projektstufen)	2. Planung (analog HOAI - LP1-4):	Nov. 14 - Aug. 15
	3. Ausführungsvorbereitung (LP5-7): →	Sept. 15 - Feb. 16
	4. Ausführung (LP8):	März 16 - Nov. 16
	5. Projektabschluss (LP9):	Nov. 2020

Planung: nationale Planungsvergaben → teilweise erfolgt: 5 beauftragte Architektur- und Ingenieurbüros + 3 weitere geplant


Realisierung: nationale, kleinteilige, gewerkweise Vergabe der Bauleistungen (VOB) in ca. 15 Baulosen → davon bisher 1 Baulos (Heizungsumstellung) realisiert.



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Fortsetzungsmaßnahme: Paralympisches Zentrum - Sportzentrum Cottbus

Inhalt: Umbau des Funktionsgebäudes (ehemals Chakra) zum sportmedizinischen, physiotherapeutischen und paralympischen Stützpunkt

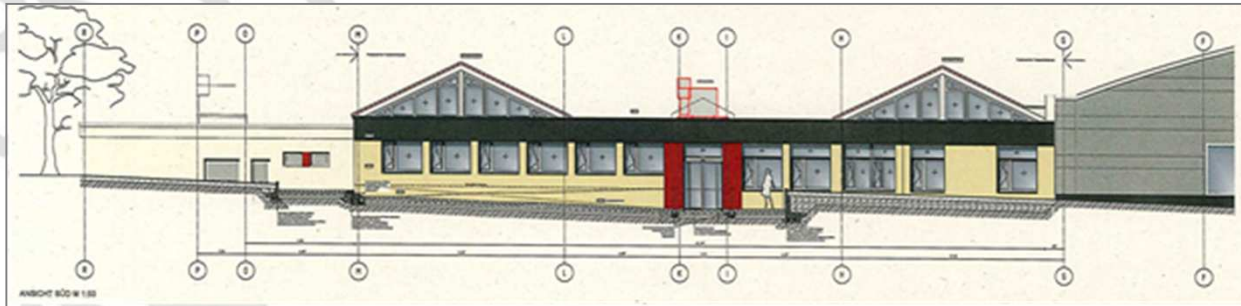

Kosten: **1.802.300 € gesamt, davon im HH-Plan 2016-2019:**
1.243,6 T€ in den Jahren 2016/2017, davon wiederum 1.027,9 T€ Fördermittel
(Gesamtfördersatz der Maßnahme: 72,9 %)

Zeitablauf:	1. Projektvorbereitung	Mai 13 - Okt.14
	2. Planung (analog HOAI - LP1-4):	Nov. 14 - März 15
	3. Ausführungsvorbereitung (LP5-7):	März 15 - April 16
	4. Ausführung (LP8):	13.Juli 15 - 31.08.16
	5. Projektabschluss (LP9):	bis 31.08.2020

Planung: nationale Planungsvergaben → erfolgt: 10 beauftragte Architektur- und Ingenieurbüros

Realisierung: nationale, kleinteilige, gewerkweise Vergabe der Bauleistungen (VOB) in ca. 30 Baulosen → davon bisher 19 Baulose vergeben.



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Baubeginn: Tierpark Cottbus (EFRE)

2. Bauabschnitt Sanierung Raubtierhaus

Inhalt: Umbau und Komplettsanierung des bestehenden Raubtierhauses ca. 1200 m² Grundfläche für Leoparden, Kleinkatzen, Wirbellose Tiere und Riesenotter


Kosten: **1.920.000 €** gesamt, davon im HH-Plan 2016-2019 1.700,0 T€ in den Jahren 2016-2018
Antrag auf Fördermittel aus INTERREG V (EFRE)
geplant ist eine 85 % Förderung (1.572.500 € FM)

Zeitablauf:

1. Projektvorbereitung	März 15 – Nov. 15
2. Planung (analog HOAI - LP1-2): →	ab Nov. 15 (notwendig für Antragstellung EFRE)
3. Planung (analog HOAI – LP3-4):	weitere Termine in Abhängig von Mittelfreigabe
3. Ausführungsvorbereitung (LP5-7):	
4. Ausführung (LP8):	
5. Projektabschluss (LP9):	

Planung: nationale Planungsvergaben → erfolgt noch an ca. 10 zu beauftragende Architektur- und Ingenieurbüros

Realisierung: nationale, kleinteilige, gewerkweise Vergabe der Bauleistungen (VOB) in ca. 25 Baulosen

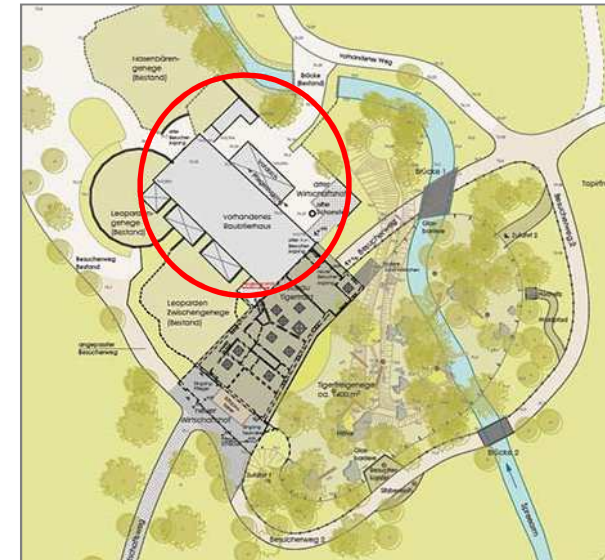



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

2. Geplante Bauprojekte für den GB III

(S. 7/8 im Investitionsplan)

2. Bereich Soziales


→ Neue Maßnahmen im Zusammenhang mit der Schaffung von Flüchtlingsunterkünften



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ


Neue Maßnahmen Herrichtung der ehem. Kita-Standorte Helene-Weigel-Straße und Schopenhauer Straße

Inhalt: Herrichtung von zwei leerstehenden Kita-Gebäuden zu Flüchtlingsunterkünften

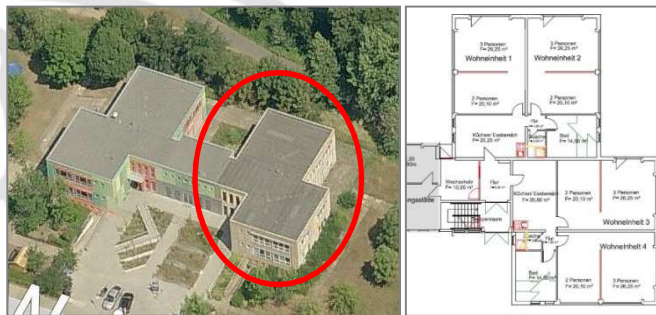

Kosten: **Helene-Weigel-Straße 220.000 €**

(Gebäudehälfte)

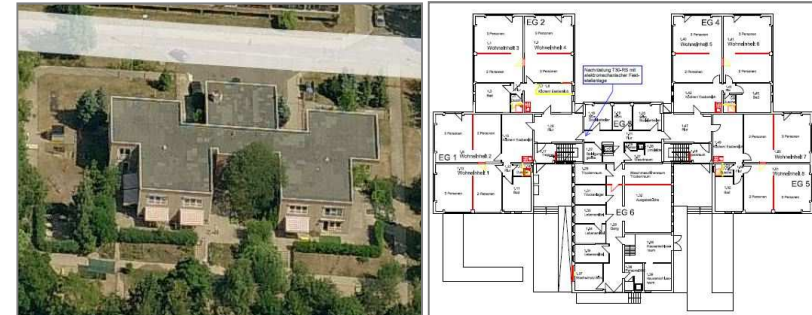

Schopenhauer Straße 370.000 €

(Komplettes Gebäude)

Finanzierung derzeit als Komplettdarstellung im HH-Jahr 2016 → anteilige Refinanzierung durch die Investitionspauschale Asyl (2.300,81 €/Platz) in Klärung

Zeitablauf:

1. Projektvorbereitung	Aug. 15 – Sept. 15
(Projektstufen) 2. Planung (analog HOAI - LP1-4):	Sept. 15 – Okt. 15
3. Ausführungsvorbereitung (LP5-7): →	Okt. 15 – Dez. 16
4. Ausführung (LP8):	Jan. 16 – März 16
5. Projektabschluss (LP9):	März 2020

Planung: nationale Planungsvergaben → erfolgt: 5 beauftragte Architektur- und Ingenieurbüros + 2 folgende Ing.-Büros je Objekt

Realisierung: nationale, kleinteilige, gewerkweise Vergabe der Bauleistungen (VOB) in ca. 10 Baulosen je Objekt



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

2. Geplante Bauprojekte für den GB III

(S. 7/8 im Investitionsplan)

3. Bereich Jugend

- **Zur Diskussion / Entscheidung in den Ausschüssen:**

- **Hort Groß Gaglow 2,5 Mio. €**

- Ersatzneubau für die Bestandsbaracke aus dem Jahr 1975 (u.a. asbesthaltige Fassadentafeln)
(Planung bis LP 4 (Genehmigungsplanung vorliegend - i. Z. FAG)

- **Hort Freundschaft 1,2 Mio. €**

- erforderlicher Anbau für 80 Hortkinder zum Erhalt der Betriebserlaubnis zur Absicherung der Kapazitäten der Sportbetonten Grundschule
(Machbarkeitsstudie vorliegend - bisher keine Planung beauftragt)

- **Humboldt-Gymnasium**

- (noch keine Aufgabenstellung / Planung vorliegend)

- **Kita Grashüpfer Kahren** → U3-Förderung, 15,7 T€ EM im Jahr 2016

- Anbau eines Gruppenraums zur Unterbringung von 5 zusätzlichen U3-Plätzen,*

- Gesamtinvestition 207,0 T€*

- Einnahme 10,3 T€ durch Ko-Finanzierung des Trägers Fröbel*



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

3. Geplante Bauprojekte für den GB IV (S. 8/9 im Investitionsplan)

1. Bereich Stadtentwicklung

Hochbauprojekte im Rahmen der Städtebauförderprogramme:
(Maßnahmekonzepte S. 30-35 der HH-Unterlage)

- Fortsetzung Chr.-Kolumbus-Grundschule (Soziale Stadt Sandow)
- Sanierung Theodor-Fontane-Gesamtschule (Soziale Stadt Sandow)
- 4. BA Ludwig-Leichhardt-Gymnasium (Aufwertung)
- Regine-Hildebrandt-Grundschule (RSI* und Aufwertung)
- Stadt- und Verwaltungsarchiv Bahnhofstraße 52 (Aufwertung)
- Wendische Museum (Modellstadt Innenstadt – Finanzierung aus Ausgleichsbeträgen)

* RSI = Förderprogramm Rückführung Soziale Infrastruktur



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Fortsetzungsmaßnahme Soziale Stadt Sandow: Christoph-Kolumbus-Grundschule

Inhalt: Die Sanierung erfolgt im Schulbetrieb ohne Ausweichen auf einen Ersatzstandort. **Die Arbeiten sind seit 2010 in Bauabschnitte gegliedert**, die wiederum in Teilabschnitte unterteilt sind. Im derzeit laufenden 2. BA sind die TA 1 und 2 bereits realisiert. Die Sanierung der restlichen Klassenräume folgt im 3. TA des 2. BA in 2016. Offene Bauabschnitte sind die Schaffung der Barrierefreiheit sowie die Gestaltung der Außenanlagen.

Kosten: **2. BA, 3. TA: 186,0 T€ in 2016 (davon 66,6 % FM B/L)**
3. BA Barrierefreiheit: 1.036,0 T€ in 2017/2018 (66,6 % FM)
Außenanlagen: 446,0 T€ in 2017 (66,6 % FM)

Zeitablauf: für 2. BA gesamt:

1. Projektvorbereitung	Mai 13 - Okt.13
2. Planung (analog HOAI - LP1-4):	Nov. 13 - März 14
3. Ausführungsvorbereitung (LP5-7):	März 14 - Mai 16
4. Ausführung (LP 8 – 1.-2.TA):	Juni 15 - Sept. 15
5. Ausführung (LP 8 – 3.TA):	Juni 16 – Sept. 16
6. Projektabschluss (LP9):	bis 31.08.2020

Planung: nationale Planungsvergaben → erfolgt: 6 beauftragte Architektur- u. Ing.-büros

Realisierung: nationale, kleinteilige, gewerkweise Vergabe der Bauleistungen (VOB) in ca. 5 Baulosen (für 2.BA 3. TA)





STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Baubeginn Soziale Stadt Sandow: „Gesundes Essen - Aulaunterbau“ an der Th.-Fontane-Gesamtschule

Inhalt: Am Standort Theodor-Fontane-Gesamtschule erfolgte in der Vergangenheit die Hüllensanierung sowie die Sanierung der Turnhalle. Die Schulgebäude A + B, der Zwischenbau sowie die Außenanlagen sind unsaniert, die Essensversorg. im KG für 800 Schüler ist unzureichend!

geplante Bauabschnitte in Abhängigkeit der Finanzierung über STEP Sandow:

1. BA	Aulaunterbau „Gesundes Essen“ zzgl. Aula OG	2016/2017
2. BA	Zwischenbau	2018
3. BA	Haus A	2018/2019
4. BA	Haus B	2018-2020
5. BA	Außenanlagen	2017-2019

Kosten: 1. BA: 1.150.000 €, gesamt davon HH-Plan 2016-2019:

Gesamtfinanzierung über STEP Sandow, davon:

613.333 € (53,3%) Bund / Land Brandenburg

536.667 € (46,7%) Eigenmittel / Bauherrenanteil

Zeitablauf:	1. Projektvorbereitung	→ Okt. 15 - Dez. 15
	2. Planung (analog HOAI - LP1-4):	Jan. 16 - Feb. 16
	3. Ausführungsvorbereitung (LP5-7):	März 16 - Juni 16
	4. Ausführung (LP8):	Juli 16 – Okt. 17
	5. Projektabschluss (LP9):	Okt. 2027

Planung: nationale Planungsvergaben → erfolgt noch an ca. 10 zu Architektur- und Ingenieurbüros

Realisierung: nationale, kleinteilige, gewerkweise Vergabe der Bauleistungen (VOB) in ca. 25 Baulosen





STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Baubeginn Stadtumbau / Aufwertung: Stadt- und Verwaltungsarchiv

Inhalt: Weiterentwicklung des Stadtarchivs als zentrales Stadt- und Verwaltungsarchiv



Kosten: **2.778.000 €** (zzgl. baufachliche Prüfung), **davon im HH-Plan 2016-2019:**

2.478,0 T€ Städtebauförderung, davon 1.652,0 T€ (66,7%) Bund / Land + 826,0 T€ (33,3%) Eigenmittel
zzgl. weitere Eigenmittel – Ausstattung/ nff. Kosten **300.000 €** im Investitionshaushalt FB Immobilien

Zeitablauf:	1. Projektvorbereitung	→ Mai 13 - Dez.15
(Projektstufen)	2. Planung (analog HOAI - LP1-4):	Jan. 16 - Juni 16
	3. Ausführungsvorbereitung (LP 5-7):	Juli 16 - Dez. 16
	4. Ausführung (LP 8):	2017 / 2018
	5. Projektabschluss (LP 9):	2022

Planung: Planungsvergaben → erfolgt noch an ca. 10 zu beauftragende Architektur- und Ingenieurbüros

Realisierung: nationale, kleinteilige, gewerkweise Vergabe der Bauleistungen (VOB) in ca. 30 Baulosen



STADT COTTBUS
CHÓŚEBUZ

Baubeginn: Modellstadt - Wendisches Museum

Inhalt: Es ist vorgesehen, das Bestandsgebäude bezüglich Barrierefreiheit anzupassen sowie statisch relevante Anpassungsmaßnahmen durchzuführen.

Kosten: **381.000 € gesamt**

Finanzierung erfolgt aus der Städtebauförderung (Modellstadt)

Zeitablauf:	1. Projektvorbereitung	Jan 15 - Sept.15
	2. Planung (analog HOAI - LP1-4):	Okt. 15 – Nov. 15
	3. Ausführungsvorbereitung (LP5-7):	Nov. 15 – Feb.16
	4. Ausführung (LP8):	März 16 – Sept. 16
	5. Projektabschluss (LP9):	2020

Planung: nationale Planungsvergaben → erfolgt:
2 beauftragte Architektur- und Ingenieurbüros

Realisierung: nationale, kleinteilige, gewerkeweise Vergabe der Bauleistungen (VOB)
in ca. 10 Baulosen





STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

3. Geplante Bauprojekte für den GB IV

(S. 8/9 im Investitionsplan)

2. Bereich Immobilien

- **Gemeindezentrum Willmersdorf (ILE/LEADER-Programm)** → separate Folie
- **Planungsleistungen Bau** → 2016-2019 = 34,6 T€ in 2016 und je 40,0 T€ in 2017-2019
Finanzierungsmittel zur Erstellung kurzfristiger, unvorhersehbarer Planungserfordernisse, Gutachten, Studien sowie zur Schaffung eines Planungsvorlaufes für Maßnahmen, die durch neue Förderprogramme finanziert werden könnten (meist mind. LP 3 erforderlich)
- **Bahnhofstraße 52** → 2017-2019 = 300 T€
erforderliche Finanzierungsmittel zur Finanzierung nichtförderfähiger Kosten sowie der baulichen Ausstattung
- **Grundstückskauf** → 2016-2019 = 1.175,0 T€, davon Cottbuser Ostsee 675,0 T€ (Marina, Strandbereiche, Flurbereinigungsverfahren, usw.)
- **Geräteausstattung Schulhausmeister** → 2016-2019 = 15,0 T€ je Jahresscheibe



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Baubeginn: ILE / LEADER-Programm Gemeindezentrum Willmersdorf

Inhalt: Sanierung/Modernisierung des Bestandsgebäude (Baracke) für die multifunktionelle Nutzung durch Ortsbeirat, Jugendclub, Volkssolidarität, Gymnastikgruppen und FFw. Gemäß den Förderbedingungen ist die Barrierefrei Bestandteil der Planung.



Kosten: **603.600 €** Finanzierung durch Förderung ILE / LEADER-Projekt Spreewald plus
davon: 431.103 € (71,4 %) Fördermittel + 172.500 € (28,6 %) Eigenmittel

Zeitablauf:

1. Projektvorbereitung	Juli 14 - Dez.14
2. Planung (analog HOAI - LP1-4):	Jan. 15 - Mai 15 (FM-Antrag eingereicht - weiterer Ablauf abhängig v. Bescheid)
3. Ausführungsvorbereitung (LP5-7):	Dez. 15 - März 16
4. Ausführung (LP8):	April 16 – Dez. 16
5. Projektabschluss (LP9):	Dez. 2020

Planung: nationale Planungsvergaben → teilweise erfolgt: 4 beauftragte Architektur- und Ingenieurbüros + 4 weitere Ing.-Büros geplant

Realisierung: nationale, kleinteilige, gewerkweise Vergabe der Bauleistungen (VOB) in ca. 20 Baulosen



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Infos zum Ergebnishaushalt

- Die Planansätze für 2016 aus dem HH 2015-2018 wurden fortgeführt oder zugunsten des HH am Rechenergebnis 2015 angepasst.
- **Die Bewirtschaftung der kommunalen Liegenschaften inkl. der Bauunterhaltung der kommunalen Kitas-Standorte, Schulen und sonstigen kommunalen Standorten können auf dem Niveau der Vorjahre stabil fortgeführt werden.**



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Infos zum Ergebnishaushalt

Beispiel Bauunterhaltung Kitas, Schulen, sonstige Objekte

Unterhaltung der Gebäude (Sachkonto 5211300) / Unterhaltung Betriebsvorrichtungen zum Gebäude (Sachkonto 5211400)							
		in T€					
Produkt	Produktbezeichnung	Jahr					
		Plan 2015	Ist 2015 (02.12.2015)	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
011 111 100	Grundstücks- und Gebäudemanagement SK 5211300 / SK 5211400	1.076,0	662,5	733,5	664,0	964,5	986,0
036 365 020	Kitas freie Träger und Dritte SK 5211300 / SK 5211400	1.705,0	1.590,5	1.645,0	1.405,0	1.080,0	2.275,0
021 211 010 bis 024 243 999	Cottbuser Schulen SK 5211300 / SK 5211400	1.566,0	1.623,7	1.592,8	1.749,4	2.210,9	2.168,4



STADT COTTBUS
CHÓŠEBUZ

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
