



Informationen zu dem Bauvorhaben Neubau Mischwassersammler Stadtpromenade

15.04.2015

Gesamtkosten Mischwassersammler

2.900 T€

Finanzierung:

Beiträge und Kredite, Förderprogramm öffentliche Abwasseranlagen


Antrag auf Förderung und Genehmigung eines vorzeitigen Baubeginns
wurde 12/2014 gestellt, vorzeitiger Baubeginn wurde vom
Zuwendungsgeber bestätigt, davon Fördermittel

ca. 500T€

Kosten / Finanzierung

Die Kosten für den Neubau des Mischwassersammlers Stadtpromenade leiten sich aus der notwendigen Technologie und der starken Belegung des Baufeldes mit Kollektoren und stadttechnischen Medienleitungen ab.

Neubau Mischwassersammler Stadtpromenade

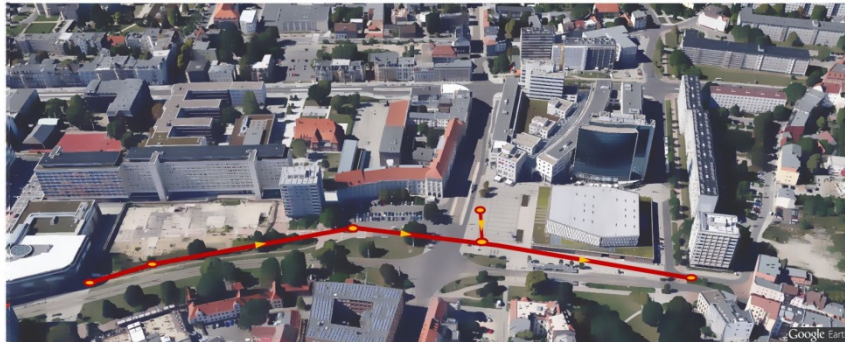

Aufgabenträger:

Stadt Cottbus
Neumarkt 5 03046 Cottbus
Tel. 0355 612 – 0



Bauherr:

LWG Lausitzer Wasser GmbH & Co. KG
Berliner Straße 20/21, 03046 Cottbus
Telefon : 0355-35 0 0



Bauzeit:

April - Dezember 2015

Planung

Bauüberleitung

Bauüberwachung:

DEGAT Planungsgesellschaft mbH
Neustädter Platz 10/11, 03046 Cottbus
Telefon: 0355 71 52 25



Sicherheit-und Gesundheitsschutz Koordination:

Bauregie Ingenieurbüro
Karlstraße 52, 03044 Cottbus
Telefon: 0355 79 82 76-0



Bauausführung: Arbeitsgemeinschaft:

STR GmbH & Co. KG Cottbus
Stadtring 3a, 03042 Cottbus
Telefon 0355 52 911 35



Braumann Tiefbau GmbH Spezialtiefbauarbeiten
Hauptstraße 10
01723 Wilsdruff OT Herzogswalde
Telefon: 035209 235-0



Auftragnehmer ist die
Cottbuser Firma

STR GmbH & Co.KG

in einer ARGE mit


Braumann Tiefbau GmbH
aus Wilsdruff



Finanzierung:

ILB Förderprogramm öffentliche
Abwasseranlagen,
Beiträge und Kredite



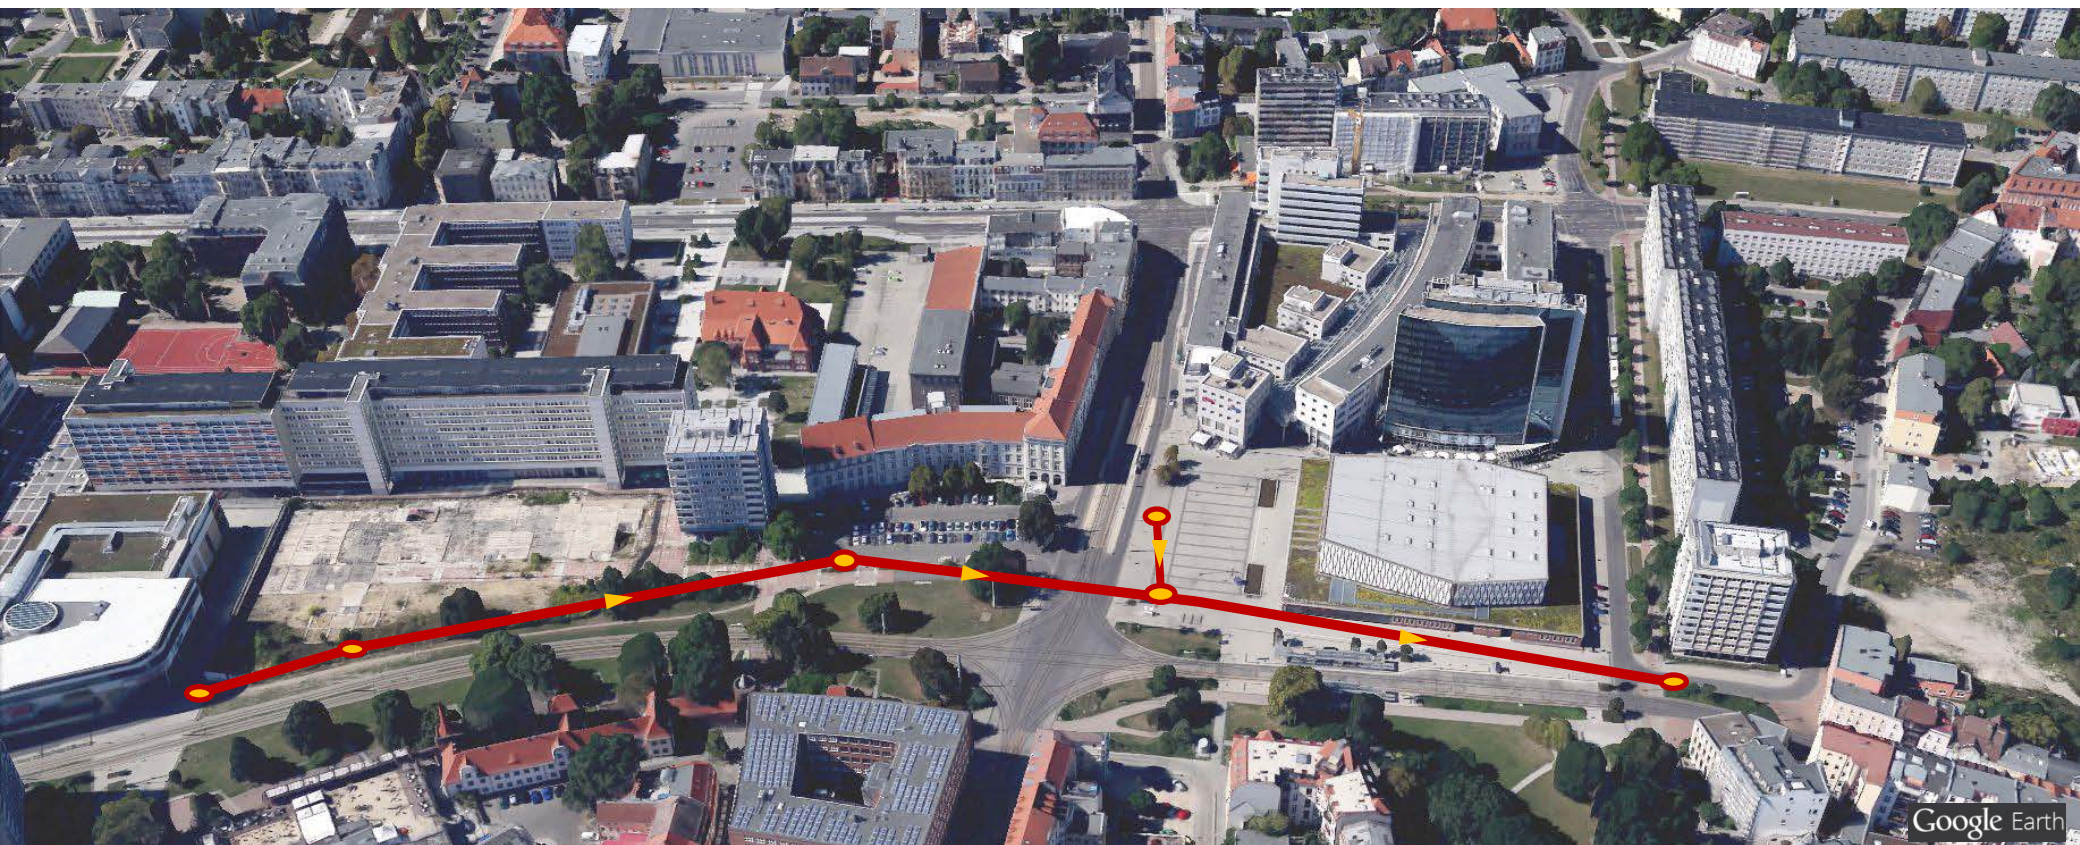

Auf Grund der Kollektoren sowie der notwendigen Unterquerung der Straßenbahn
entschied die Stadt Cottbus gemeinsam mit der LWG im Dezember 2014,
den Mischwassersammlers statt im offen Rohrgräben, unterirdisch in Vortriebsbauweise zu bauen!

Baubeginn/ Baustelleneinrichtung:	April 2015
Herstellung der Baugruben:	April – Mai 2015
Rohrvortrieb:	Juni – Juli 2015
Abschluss LWG-Maßnahme Postparkplatz:	August 2015
Fertigstellung Stadthallenvorplatz:	Oktober 2015
Verpressung Altkanal:	Oktober 2015
Maßnahmenende:	Dezember 2015

Grobbauablaufplan



**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit !**
